

**VINÇOTTE vzw**

Erkend Controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW: BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

- ☒ Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent
☐ Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde
☐ Noordersingel 23, 2140 Antwerpen
☐ Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux

Tel: +32 9 244 77 11
Tel: +32 2 674 57 11
Tel: +32 3 221 86 11
Tel: +32 81 432 611

gent@vincotte.be
brussels@vincotte.be
antwerpen@vincotte.be
gembloux@vincotte.be

Verslag nr.:

00366882/02



N 386224

Resi code 16

VERSLAG: ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN OP ZEER LAGE SPANNING (BOEK 1 – KB 8/09/2019) – ALG. DIRECTIE ENERGIE**Verantwoordelijke uitvoering van het werk:****Installatie:****Eigenaar / Uitbater / Beheerder:**

Naam, voornaam: <u>ELEKTRO</u>	Naam, voornaam: <u>MANA</u>	<u>ELEKTRO PR BV</u>
<u>PR BV</u>	Adres: <u>WORMHOUTPAD 56</u>	<u>TOCHENHOUT MOEN 119</u>
Ident. Kaart nr.:	Post nr. + Stad: <u>2480 BALEN</u>	<u>2400 MOL</u>
BTW nr.: BE <u>0730.838.085</u>	Tel.:	

Basis van het onderzoek: Boek 1 – KB 8/09/2019 (BS 28/10/2019) ("AREI")

☐ Gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname – nieuwe installatie (6.4.)	☐ Wooneenheid	☐ Vóór 1/10/1981
☒ Gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname – belangrijke wijziging/uitbreiding (6.4.)	☐ Werkeenheid	☒ Tussen 1/10/1981 & 1/06/2020
☒ Controlebezoek (6.5.)	☐ Werfinstallatie	☐ Vanaf 1/06/2020
☐ Controlebezoek verzwaren aansluiting oude installatie (8.4.1.)	☐ Gemeenschappelijke delen van residentieel geheel	
☐ Controlebezoek verkoop oude installatie (8.4.2.)	☐ Technische lokalen van een residentieel geheel	
☐ Vrij controlebezoek oude installatie (8.4.3. of 8.4.4.)	☐ Gedecentraliseerde productie-installatie	
Afwijkingen Deel 8: ☒ Toegepast ☐ Niet toegepast	☐ Andere installatie:	

Algemene gegevens elektrische installatie:☐ Document begin van de uitvoering 01/06/2020: nr. Datum

Gegevens verdelers Naam verd.:	EAN	☒ EAN niet meegedeeld	☐ kWh meter niet geplaatst
kWh meter nr.: <u>04402188</u>	meterstand dag: <u>82117</u>	☐ kWh excl. nacht meter:	
Bescherming aansluiting (A): ☒ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100	nr.: meterstand:		
Gegevens installatie	Ontworpen voor U _N : ☐ mono 230 V ☐ 3x230 V ☒ 3N400 V	Type aardelektrode: ☐	
	Maximale nominale stroom (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100	☒ aardingslus ☐ pen / baar	
	Voedingsleiding hoofdbord: X mm ² - Type:	Aardverbindingssyst.: ☒ TT ☐	
Beschrijving installatie ☒ Zie bijlage(n)	Algemene differentieelstroominrichting: <u>63 A / 300 mA</u>	Aantal borden: <u>1</u>	Aantal eindstroombanen: <u>1</u>

Metingen - testen - controles - verzegeling:

☒ Rechtstreekse aanraking	☒ Onrechtstreekse aanraking	☒ Montage	☐ Verplaatsb. materieel	☒ Vast materieel	☒ I-/doorsnede	☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand: <u>11,76</u> Ω	☒ Algemeen isolatieniveau: <u>0,5</u> MΩ	☒ Controle foutlus	☒ Continuïteit (equipot., PE)	☒ Test diff.		
Alg. diff.: ☐ was verzegeld ☒ werd verzegeld ☐ werd niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden				Schema's en plannen getekend: Ja / <u>Nee</u>		

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Vastgestelde inbreuken Nieuwe installatie ☒ Nihil	
Vastgestelde inbreuken Bestaande installatie ☒ Nihil	
Opmerkingen ☐ Nihil	<u>VERBODEN VAN VERHOOP, WOMB VERSLAG</u> <u>ACBG NR: 252415 VAN 10/01/2024</u>

Besluit:

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 (KB 8/09/2019).
☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van Boek 1 (KB 8/09/2019).

Een nieuwe controle moet worden uitgevoerd vóór

11/01/2024
☒ door hetzelfde erkend organisme (*).**Agent bezoeker:**Naam: HENS FRANCK Agent nr.: 2024 Datum: 11/01/2024

Voor de directeur generaal: Handtekening

Bijlage(n): ☒ Situatieplan(nen): 3 ☒ Eéndraadsschema(s): 5 ☐

- Dit verslag dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden.
- De Federale Overheidsdienst Economie dient onmiddellijk ingelicht te worden over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
- Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
- Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens onze controle. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten eerste uit om een bijkomende controle te laten uitvoeren.
- De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de inbreuk zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen en goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

[illegible]

Fluor 4 x 10 mm
 Differential 300mA
 23A Type 1

A $\begin{matrix} 2P \\ \times \\ 6A \\ C \end{matrix}$ Belttransfo

B $\begin{matrix} 2P \\ \times \\ 16A \\ C \end{matrix}$ III NOB 1,5 mm X Verlichting
 helder, living,
 keuken, wc,
 gang, spt 1

C $\begin{matrix} 2P \\ \times \\ 16A \\ C \end{matrix}$ III NOB 1,5 mm X Verlichting
 helder, hal
 boven

D $\begin{matrix} 2P \\ \times \\ 20A \\ C \end{matrix}$ III NOB 2,5 mm 1 2 3 4 5 Stopcontact
 garage, living
 keuken

E $\begin{matrix} 2P \\ \times \\ 20A \\ C \end{matrix}$ III NOB 2,5 mm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Stopcontact
 voorraai
 helder, living, h

F $\begin{matrix} \times \\ 20A \\ C \end{matrix}$ III NOB 2,5 mm 1 2 3 4 5 6 7 Stopcontact
 berging, s
 keuken



9-11-21

G $\begin{matrix} 2P \\ \times \\ 20A \\ C \end{matrix}$ * III NOB 2,5 mm 1 2 3 4 5 6 7 8 Stopcontacten
living, boven

H $\begin{matrix} 2P \\ \times \\ 16A \\ C \end{matrix}$ * III NOB 2,5 mm CV

Differentieel 30mA
40A Type 1

I $\begin{matrix} 2P \\ \times \\ 20A \\ C \end{matrix}$ * III NOB 2,5 mm 1 X Stopcontacten
en verlichting
badkamer

J $\begin{matrix} 2P \\ \times \\ 20A \\ C \end{matrix}$ * III NOB 2,5 mm D2000kast

K $\begin{matrix} 2P \\ \times \\ 20A \\ C \end{matrix}$ * III NOB 2,5 mm Wasmachine

L $\begin{matrix} 2P \\ \times \\ 20A \\ C \end{matrix}$ * III NOB 2,5 mm Stopcontact
garage

Jul 21 '24

M $\begin{matrix} 2P \\ \times \\ 20A \\ C \end{matrix}$ III NOB 2,5 mm $\overline{IL}$ poort

N $\begin{matrix} \times \\ 20A \\ C \end{matrix}$ III NOB 2,5 mm $\begin{matrix} 1 \\ \overline{IL}_{1/2} \end{matrix}$ Stopcontact
holder


O $\begin{matrix} 4P \\ \times \\ 20A \\ C \end{matrix}$ III NOB 4 mm $\overline{IL}$ Muur

P $\begin{matrix} 4P \\ \times \\ 20A \\ C \end{matrix}$ Reserve

Q $\begin{matrix} 2P \\ \times \\ 20A \\ C \end{matrix}$ III NOB 2,5 mm $\overline{IL}$ Oven


R $\begin{matrix} 2P \\ \times \\ 20A \\ C \end{matrix}$ III NOB 2,5 mm $\overline{IL}$ Afwasmachine

11/12/21

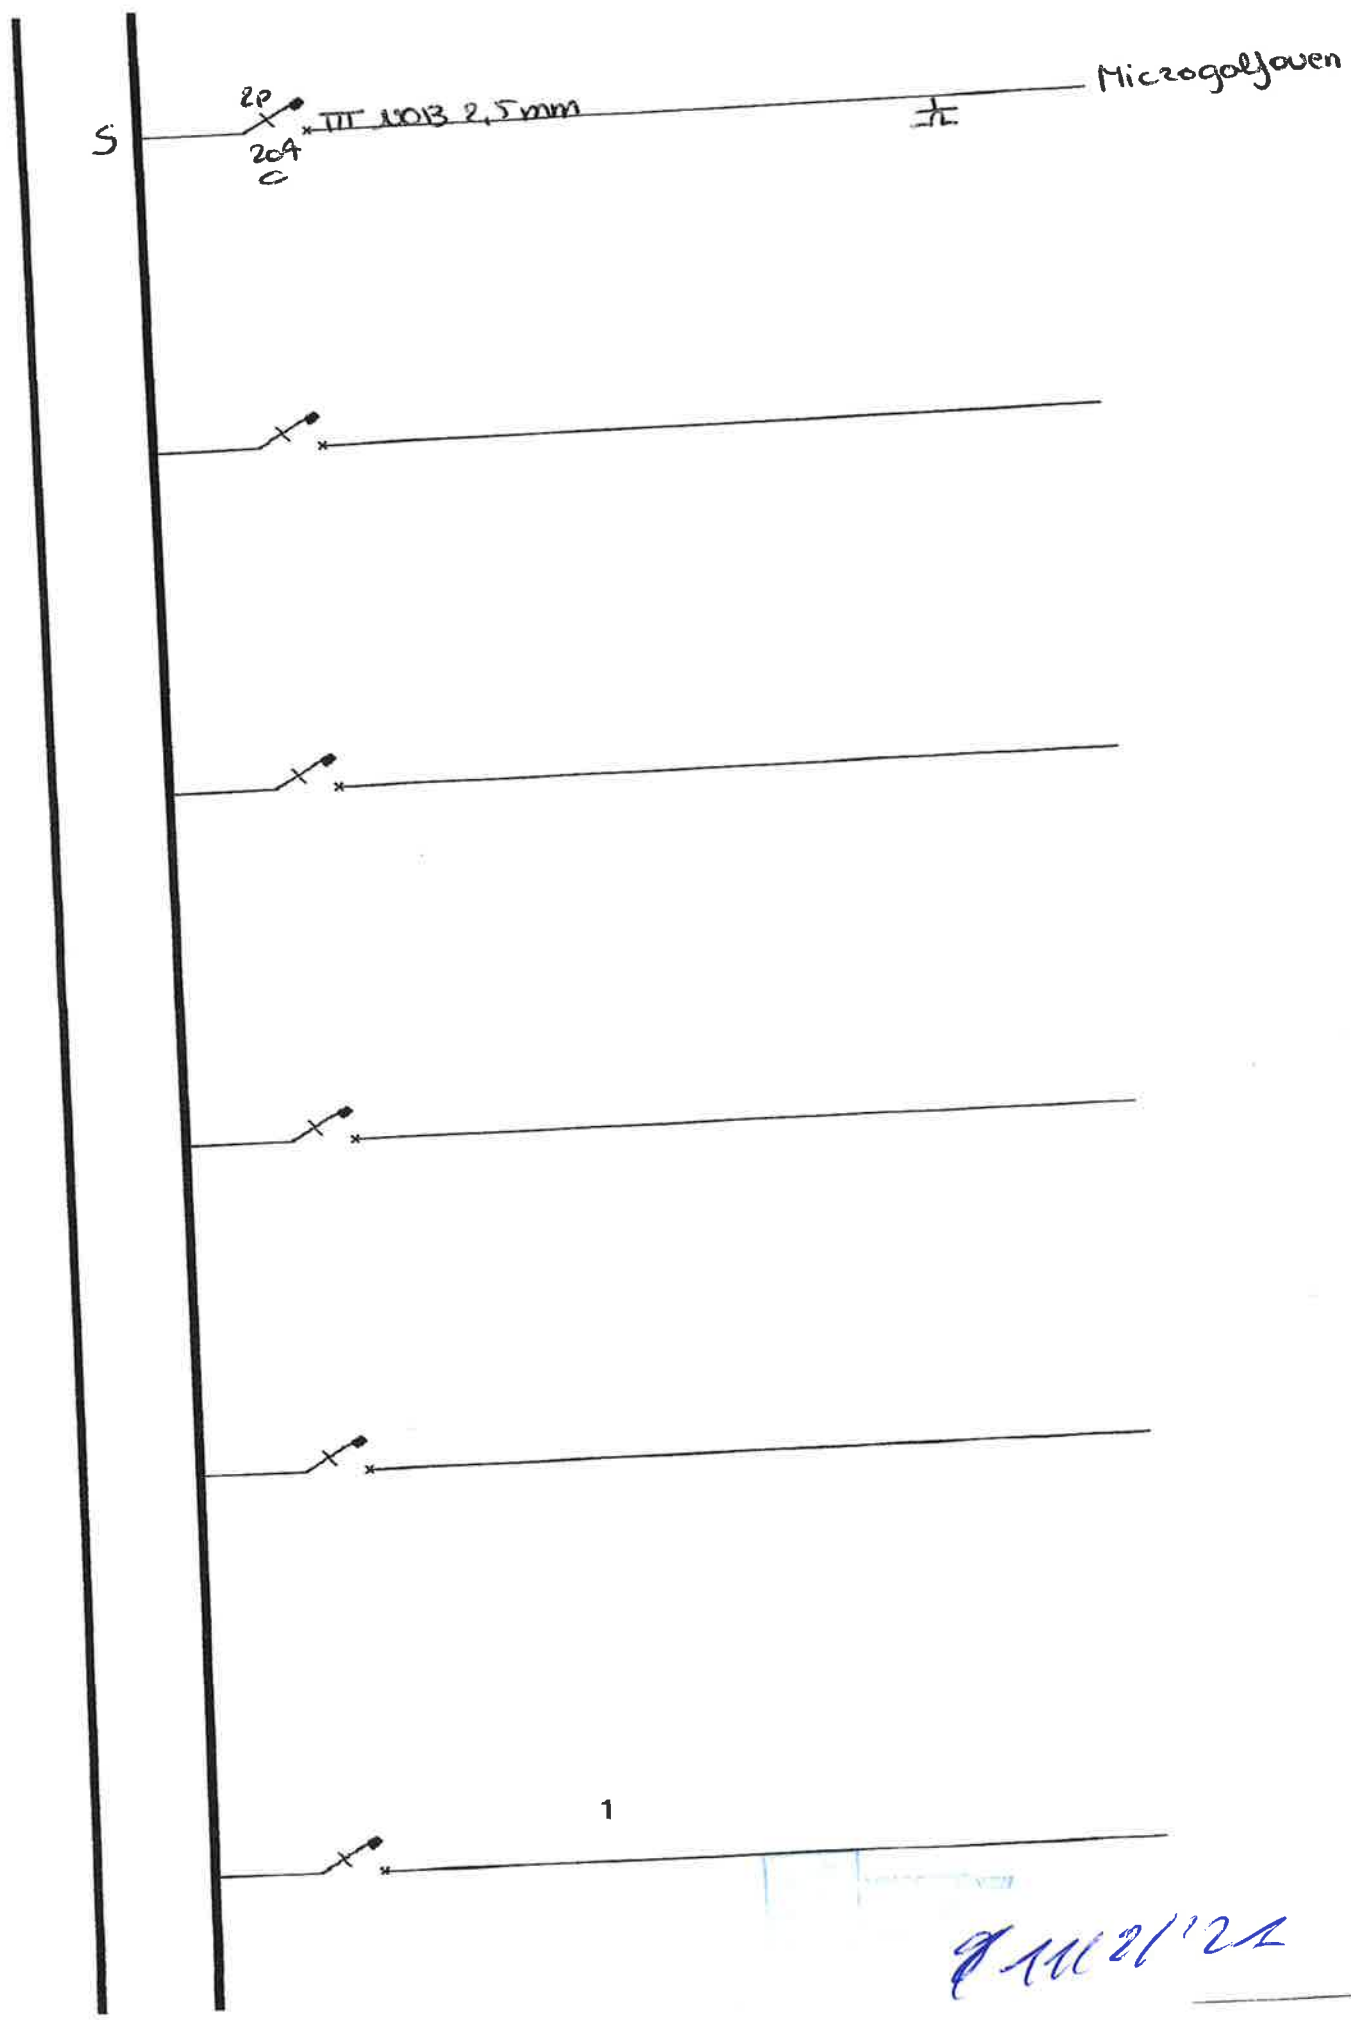


20/12/22


Stopcontacten gelijkvloers

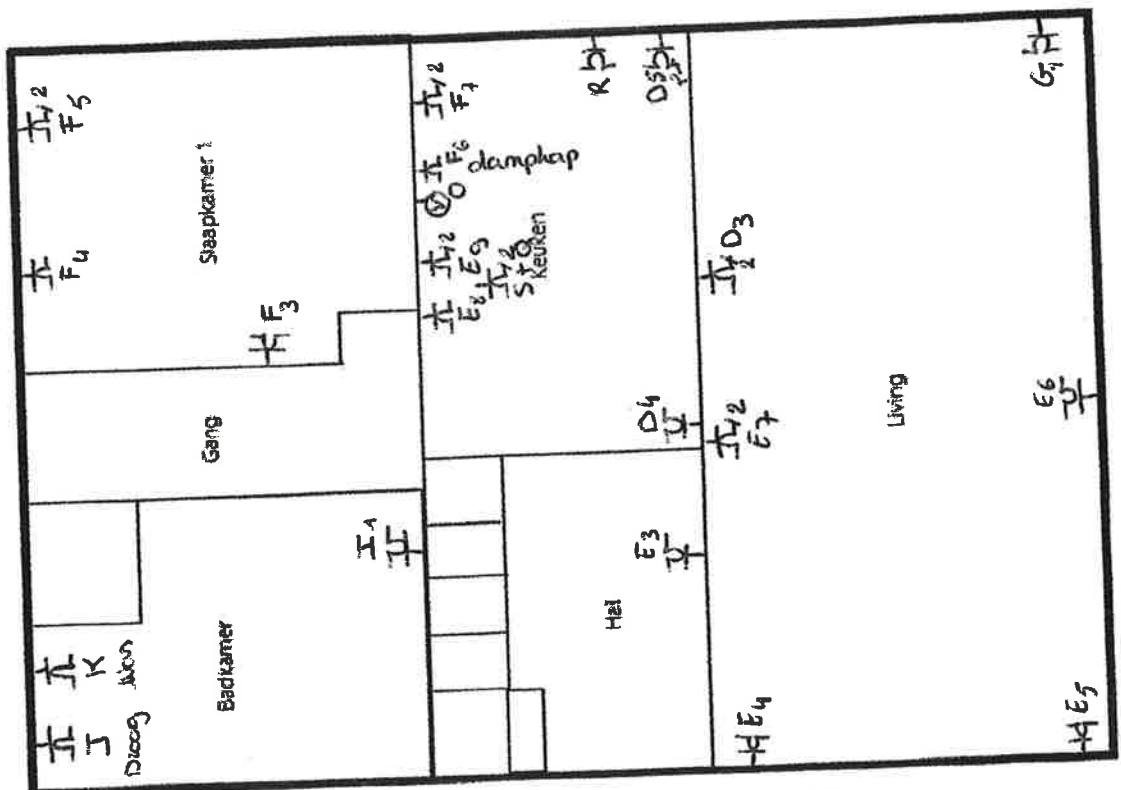


Verlichting gelijkvloers

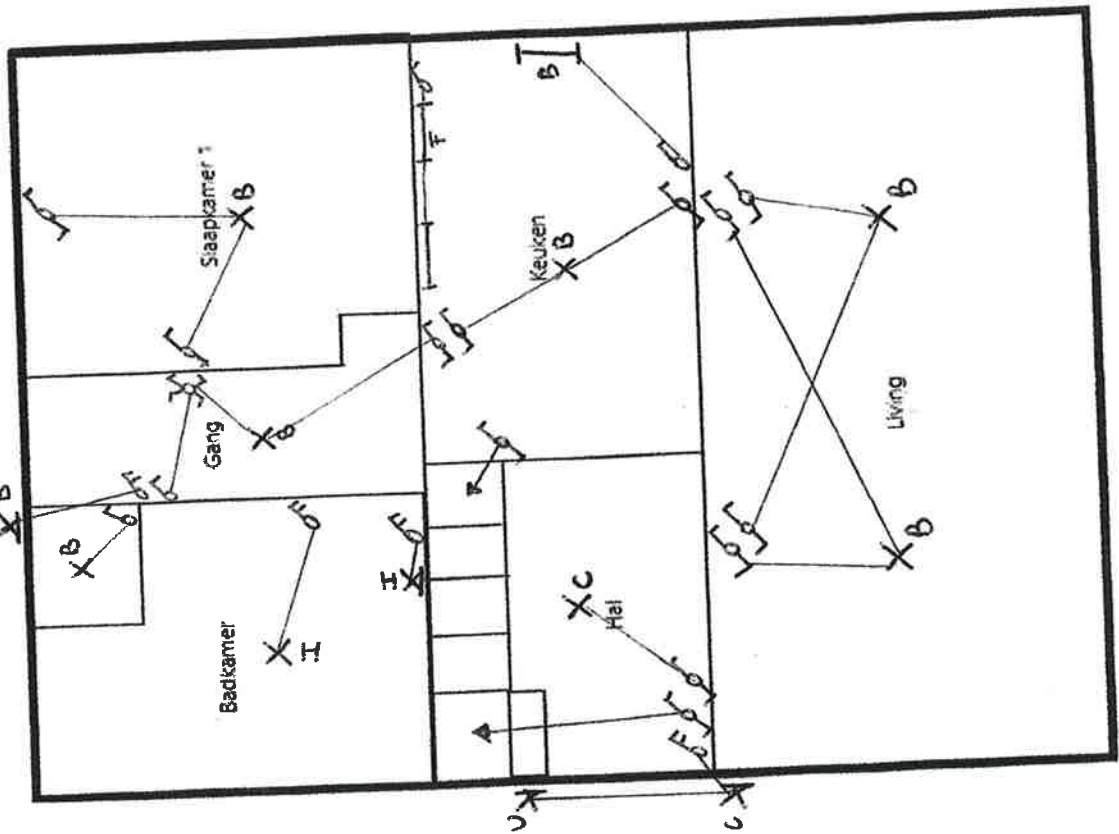

Stopcontacten boven

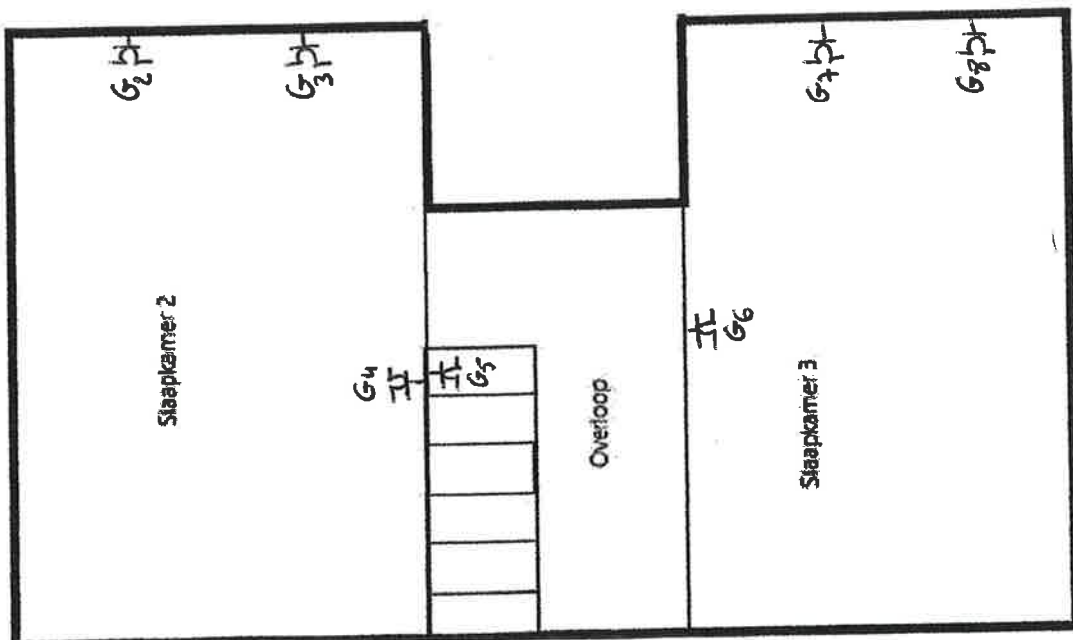


Verlichting boven

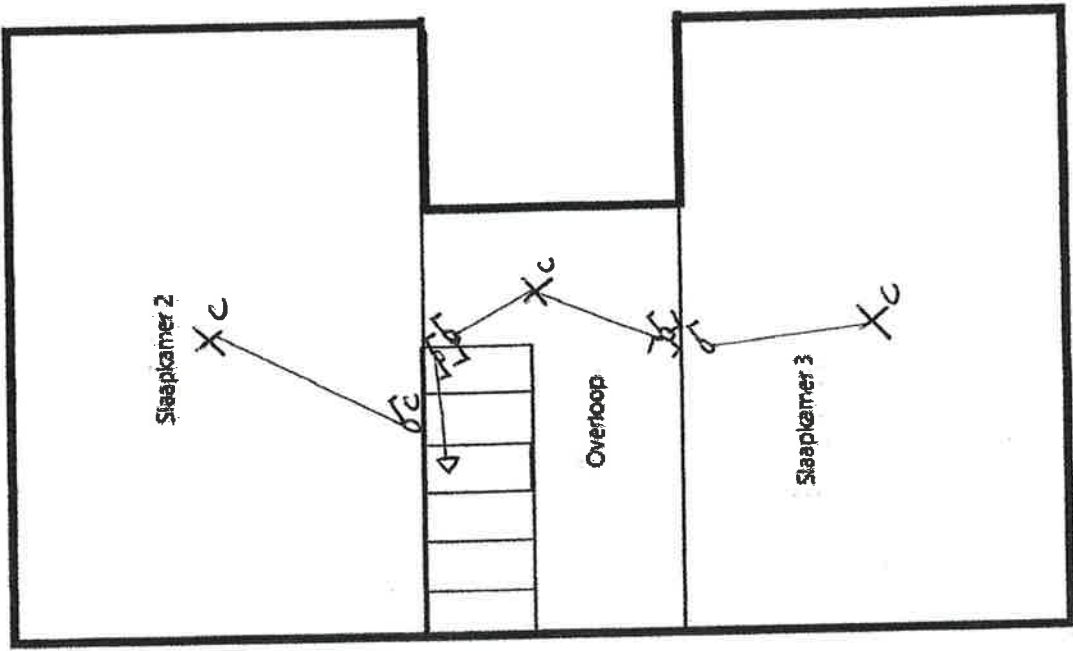


MEETPLAN

12/12/27

Stopcontacten kelder

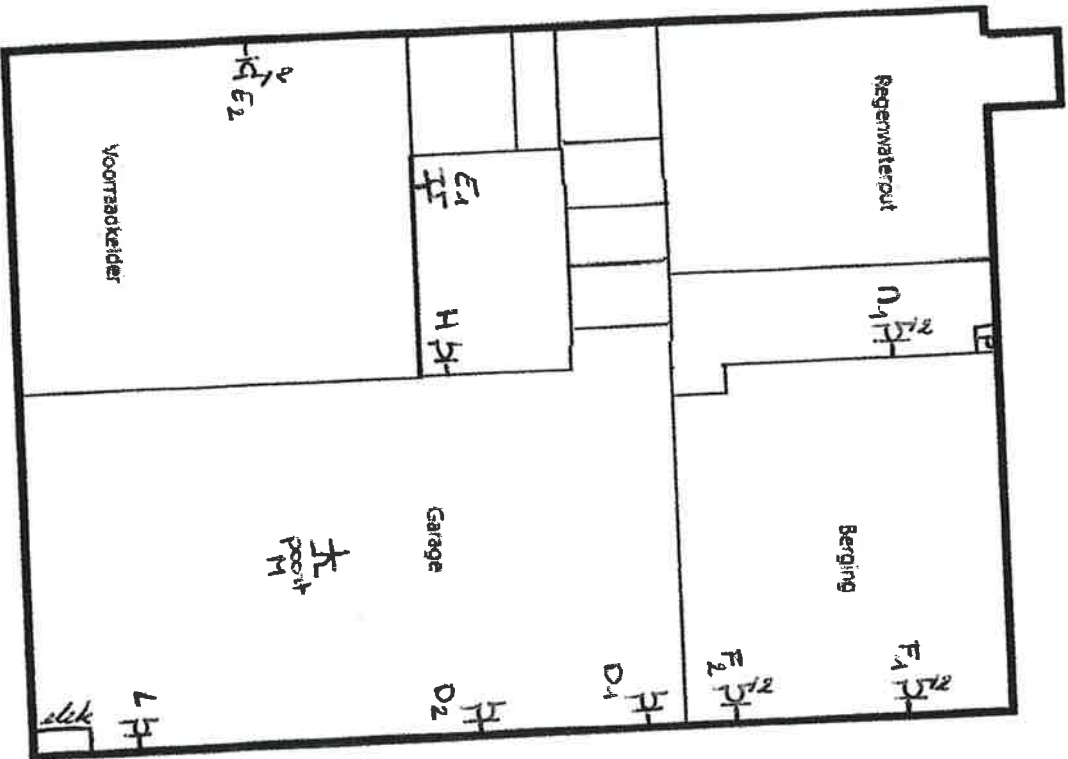

Verlichting kelder

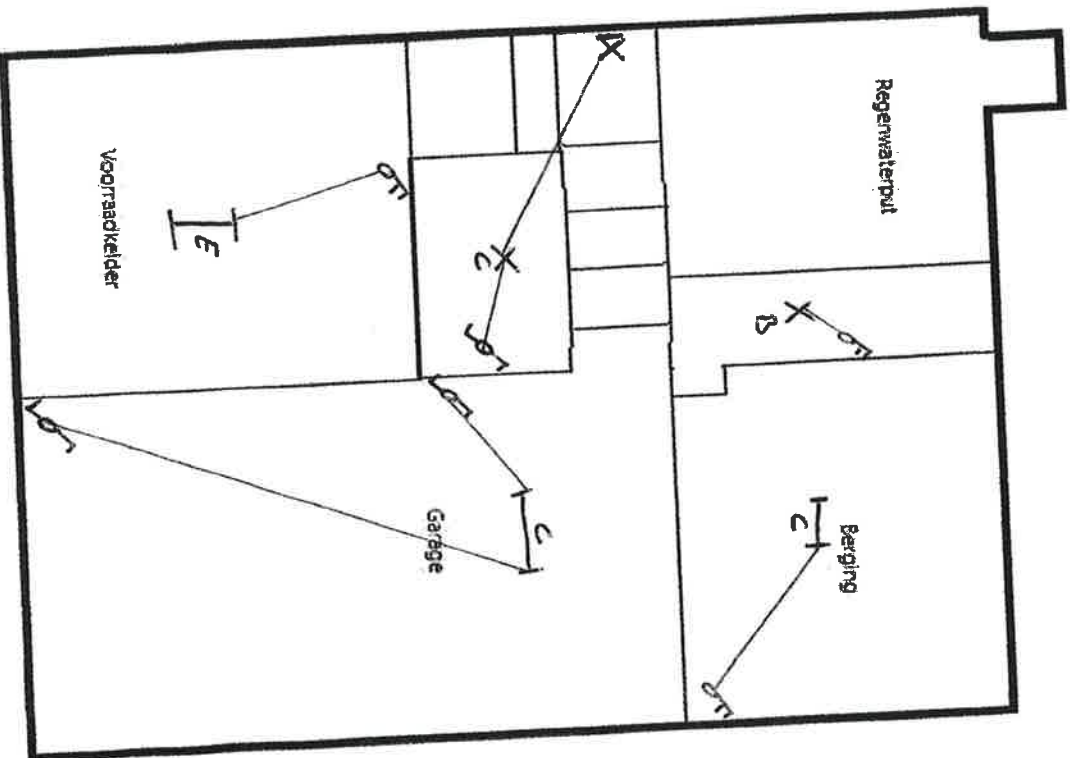

Handwritten signature: *Handwritten signature*

