

CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 04/2025/96256/C01:1

DATE DU CONTRÔLE 13/03/2025

AGENT VISITEUR

Mathieu Laixhay

ADRESSE DU CONTRÔLE

Avenue de Chèremont 11 - 1300 Wavre

AGRÈMENT RÉGION WALLONNE

AGRW. TUS-145/A/02 expire le 19/01/2023



COORDONNÉES DE L'EXPLOITANT DE LA CITERNE

Propriétaire

#TVA

non communiqué

Adresse

Avenue de Chèremont 11 - 1300 Wavre

SITUATION DU RÉSERVOIR ET DE SES ACCESSOIRES

Plan d'implantation

Non

Situation du réservoir

A gauche maison

Localisation du dépotage

Sur le réservoir

RÉSERVOIR

Autorisation d'exploitation	Oui	Date d'émission, échéance & numéro	Voir annexe
Capacité autorisée et/ou réelle (litres)	3100	Année d'installation	non communiqué
Origine du réservoir et n° de fabrication	non communiqué	Certificat d'étanchéité antérieur	Oui
Informations du certificat antérieur d'étanchéité	Voir annexe	Dimensions du réservoir	1,3
Hauteur de produit (cm)	37		
Type de réservoir	Cylindrique - Enterré - Simple paroi - Métallique		

CONTRÔLE

Système de chauffage	Chaudière	Fonctionnement du système de chauffage	Fonctionne
Type de raccordement au système de chauffage	Bi-tube	Contrôle des tuyauteries visibles du réservoir au système de chauffage	Conforme
Soutirage	Par le haut - Conforme	Conduite de remplissage	Conforme
Conduite de ventilation	Conforme	Système anti-débordement	sifflet 95% - test OK - hauteur de la tige OK
Système de mesure de niveau	pas présent	Pollution en dehors du réservoir	non vérifiable

TEST AUX ULTRASONS

Hauteur de produit avant le test (cm)	37	Hauteur d'eau avant le test (cm)	0
Test étanchéité chaîne de mesure	OK	Test de bon fonctionnement avant contrôle de la sonde N (gazeux)	Ok
Test de bon fonctionnement avant contrôle de la sonde R (liquide)	Ok	Valeur de référence valeur phase gazeuse :	-4,6
Valeur de référence phase liquide :	-3,3	Dépression atteinte (mbar) :	-250
Résultat de l'épreuve d'étanchéité - Valeur phase gazeuse :	-4,5	Résultat de l'épreuve d'étanchéité - Valeur en phase liquide :	-3,2
Hauteur de produit après le test (cm)	37	Hauteur d'eau après le test (cm)	0
Résultat du test accoustique	Conforme	Durée du test (minutes):	60

Appareil SDT 340 référencé «> et vérifié le 10/02/2023 selon nos procédures internes.

Conclusion : Le réservoir est étanche et peut rester en service. Une prochaine visite doit avoir lieu avant le 13/03/2028



Une plaquette verte a été fixée et scellée sur la conduite de remplissage du réservoir le jour même du contrôle.

Le réservoir a fait l'objet d'un contrôle conformément aux prescriptions de :

- 30 novembre 2000 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Titre III du règlement général pour la protection du travail en ce qui concerne les contrôles des dépôts de liquides inflammables et l'implantation et l'exploitation des stations - service (M.B. 17.01.2001)
- 8 mai 2003 - Arrêté ministériel dérogeant aux dispositions de l'article 590 du titre III du RGPT portant sur le contrôle d'étanchéité des dépôts de liquides inflammables en insérant une nouvelle technique de contrôle: le test en dépression (M.B. 19.03.2004)
- 17 juillet 2003 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations - service
- 24 juillet 2008 - Arrêté du Gouvernement wallon du modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations - service.

Fait à : Wavre

Signature du technicien

CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 04/2025/96256/C01:1

› ANNEXES

Système de chauffage



Listing test d'étanchéité de la chaîne de mesure avant contrôle



CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 04/2025/96256/C01:1

ANNEXES

Listing test d'étanchéité de la chaîne de mesure avant contrôle



Listing test d'étanchéité du réservoir



CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 04/2025/96256/C01:1

ANNEXES

Listing test d'étanchéité du réservoir



CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 04/2025/96256/C01:1

ANNEXES

Listing test d'étanchéité du réservoir



Enregistrement des capteurs avec la fuite calibrée



CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

EXEMPLAIRE ORIGINAL


RÉF. 04/2025/96256/C01:1

ANNEXES

Enregistrement des capteurs avec la fuite calibrée



Autorisation d'exploitation

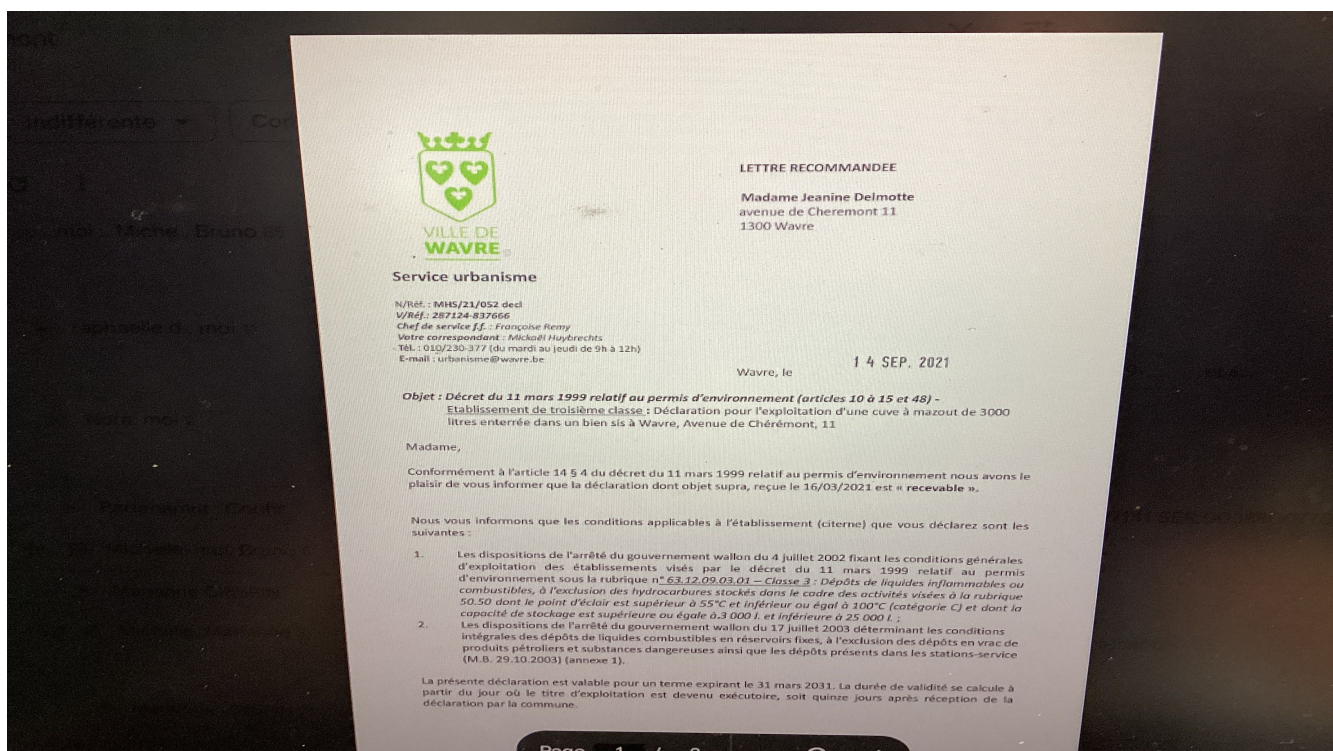

CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 04/2025/96256/C01:1

› ANNEXES

Certificat d'étanchéité antérieur

Belgique
P.P.
B.



CERTOTANK

Procès-verbal de contrôle N° 03/21/048/106

SOGHAM, DELMOTTE JEANINE
AVENUE DE CHEREMONT 11
1190 WIVRE
TVA:

Inspecteur : Satchewski Patricia
N° Agrement : Agre.TUS-000A/06
Date : 01/03/2021

Contrôle de citernes à hydrocarbures
Contrôle en installation (auk)

Mix et uniformité
Conformité (auk)

16.03.2021 14.00 - 16.03.2021 17.37
Assistance par : S.O. Boucra
Rue Lepoint 25 - 1300 Louvain-la-Neuve

Remplacement : - Heijon Walderne, Arrêté du Gouvernement Wallon du 17 juillet 2009, modèle n° 24, juillet 2009
- Région de Bruxelles-Capitale, Arrêté Royal du 13 MARS 1999 relatif au stockage de liquides extrêmement inflammables, incluant extrêmement inflammables, inflammables et combustibles

Description de l'installation :

Capacité 3000 Litres	Année d'installation 1997	Produit M2ZOLIF
Forme CYLINDRIQUE	Situation SOUTERRAIN	Permis d'exploitation 21/952
Type de paroi SIMPLE	Matériau METALLIQUE	Non N°

Matériel :

SOT 170	170600319	Calibré le 09/07/2020	Tout en état 46	46
Sonde rouge n° :	011100048	Calibré le 09/07/2020	Tout en état 46	46
Sonde noire n° :	011120024	Calibré le 09/07/2020	Tout en état 46	46

Travail : Epreuve d'étanchéité : (par ultrasons, à une dépression maximale de 250 mbars)

Résultat : La citerne est étanche.

Contrôles complémentaires :

Contrôle des documents précédents :	PRESENTS
Contrôle du système anti-débordement :	SIFFLET
Contrôle général de l'état de l'installation :	CONFORME
Contrôle de présence (eau et de boue (cm) :	0 cm
Contrôle du système de détection de fuites :	AUCUN
Contrôle du niveau de mazout dans la réserve :	23 cm
Position autour de la citerne et dans la chambre de visite :	PAS VISIBLE

Remarques et modifications à apporter :

Conclusion :

Le réservoir est étanche et peut rester en service.

Une prochaine visite doit avoir lieu dans les 3 ans et avant le 01/03/2024

Une planchette splanétique de couleur verte a été posée sur le tuyau de remplissage.

Le client

Chambre de visite et accessoires



CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 04/2025/96256/C01:1

› ANNEXES

Plaquette apposée sur le réservoir

