

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 07/02/2025

Inspecteur: Nigel Rodriguez Molina

Mentor: -

Installateur: Elektro Carl

ID-label: ZAAK

B.T.W. nr.: BE 0634 702 771

Klantreferentie: -

Merk en type meettoestel: metrel Eurotest ET61557

Serienummer: 19481293

Datum verslag: 07/02/2025

Plaats van het onderzoek

Straatnaam: Antwerpsestraat
Huisnummer: 157
Busnummer: -
Postcode: 2845
Gemeente: NIEL
Land: België

Eigenaar

Naam: Pascal Wils
Straatnaam: Antwerpsestraat
Huisnummer: 157
Busnummer: -
Postcode: 2845
Gemeente: NIEL
Land: België

Installateur

Naam: Elektro Carl
BTW nr.: BE 0634 702 771
Telefoonnummer: +32 473 94 59 09
E-mail: info@elektrocarl.be

Type : niet huishoudelijke installatie (winkelpand, kantoor, restaurant) $\leq 63A$

EAN : 541449500000307336

Teller Nr.: : 1LGZ0570564662

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 3-230V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 1

Aantal kringen: 10

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Ri algemeen: 2,69 MΩ

RE: 16,83 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _{st}	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	10	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	10	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
Zie schema	-	-		-	-
Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	OK		
Uitwendige invloeden	OK				

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

nota/note 19 Alle differentieelstroombeschermingsinrichtingen werden getest en in orde bevonden.

nota/note 2 Geen inbreuken vastgesteld.

nota/note 44 De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 7/2/2030
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 09:08 tot 09:38

De inspecteur Nigel Rodriguez Molina



Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.


Kwaliteit
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 7/2/2030	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.



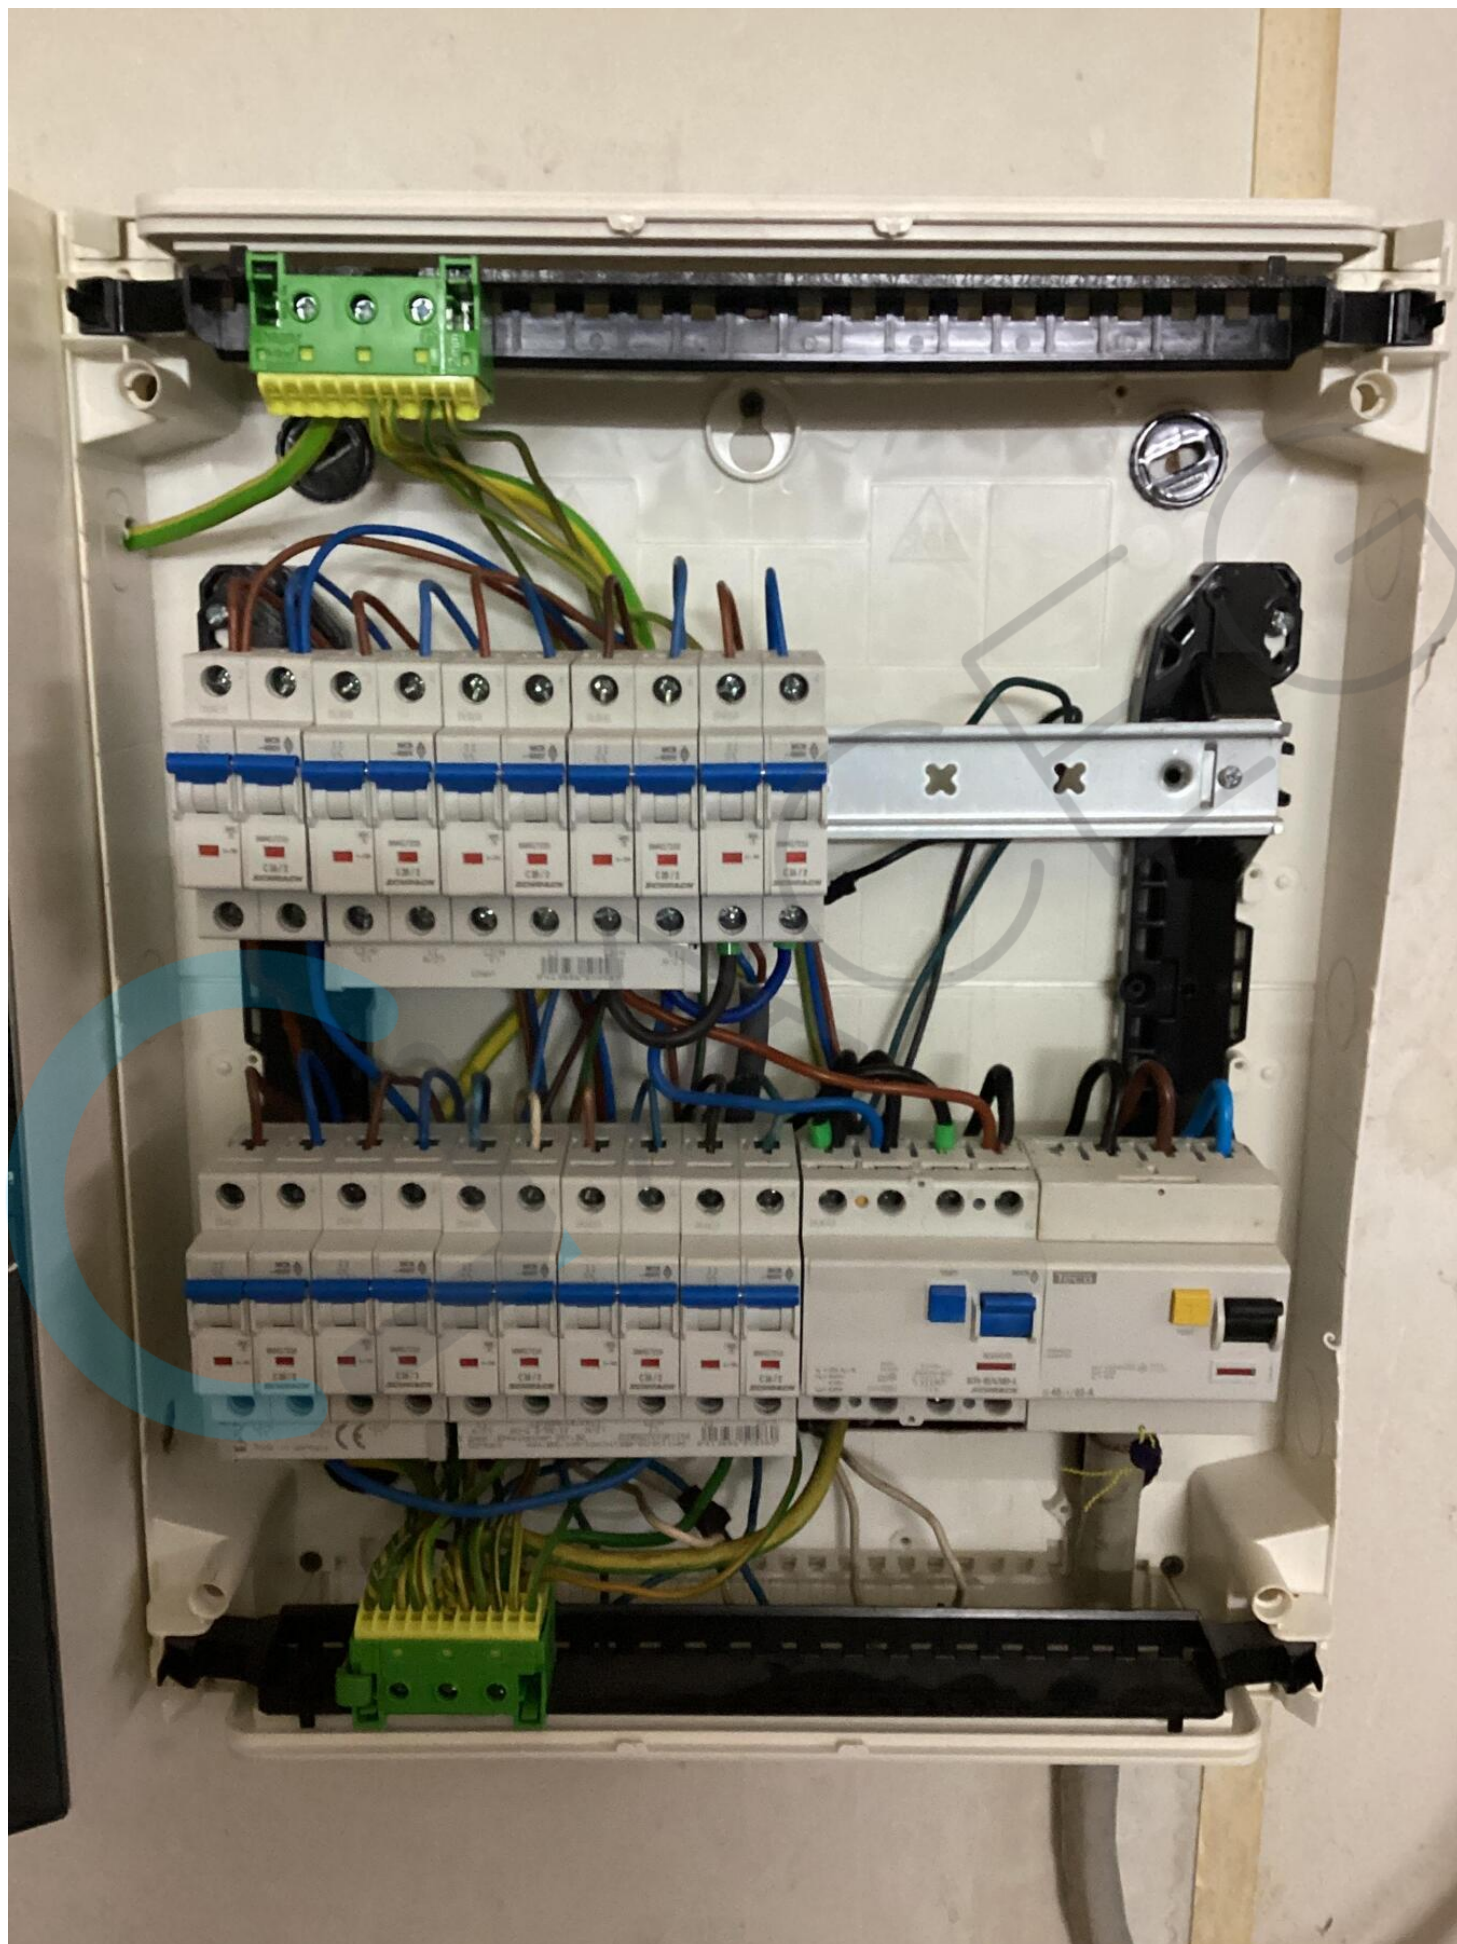














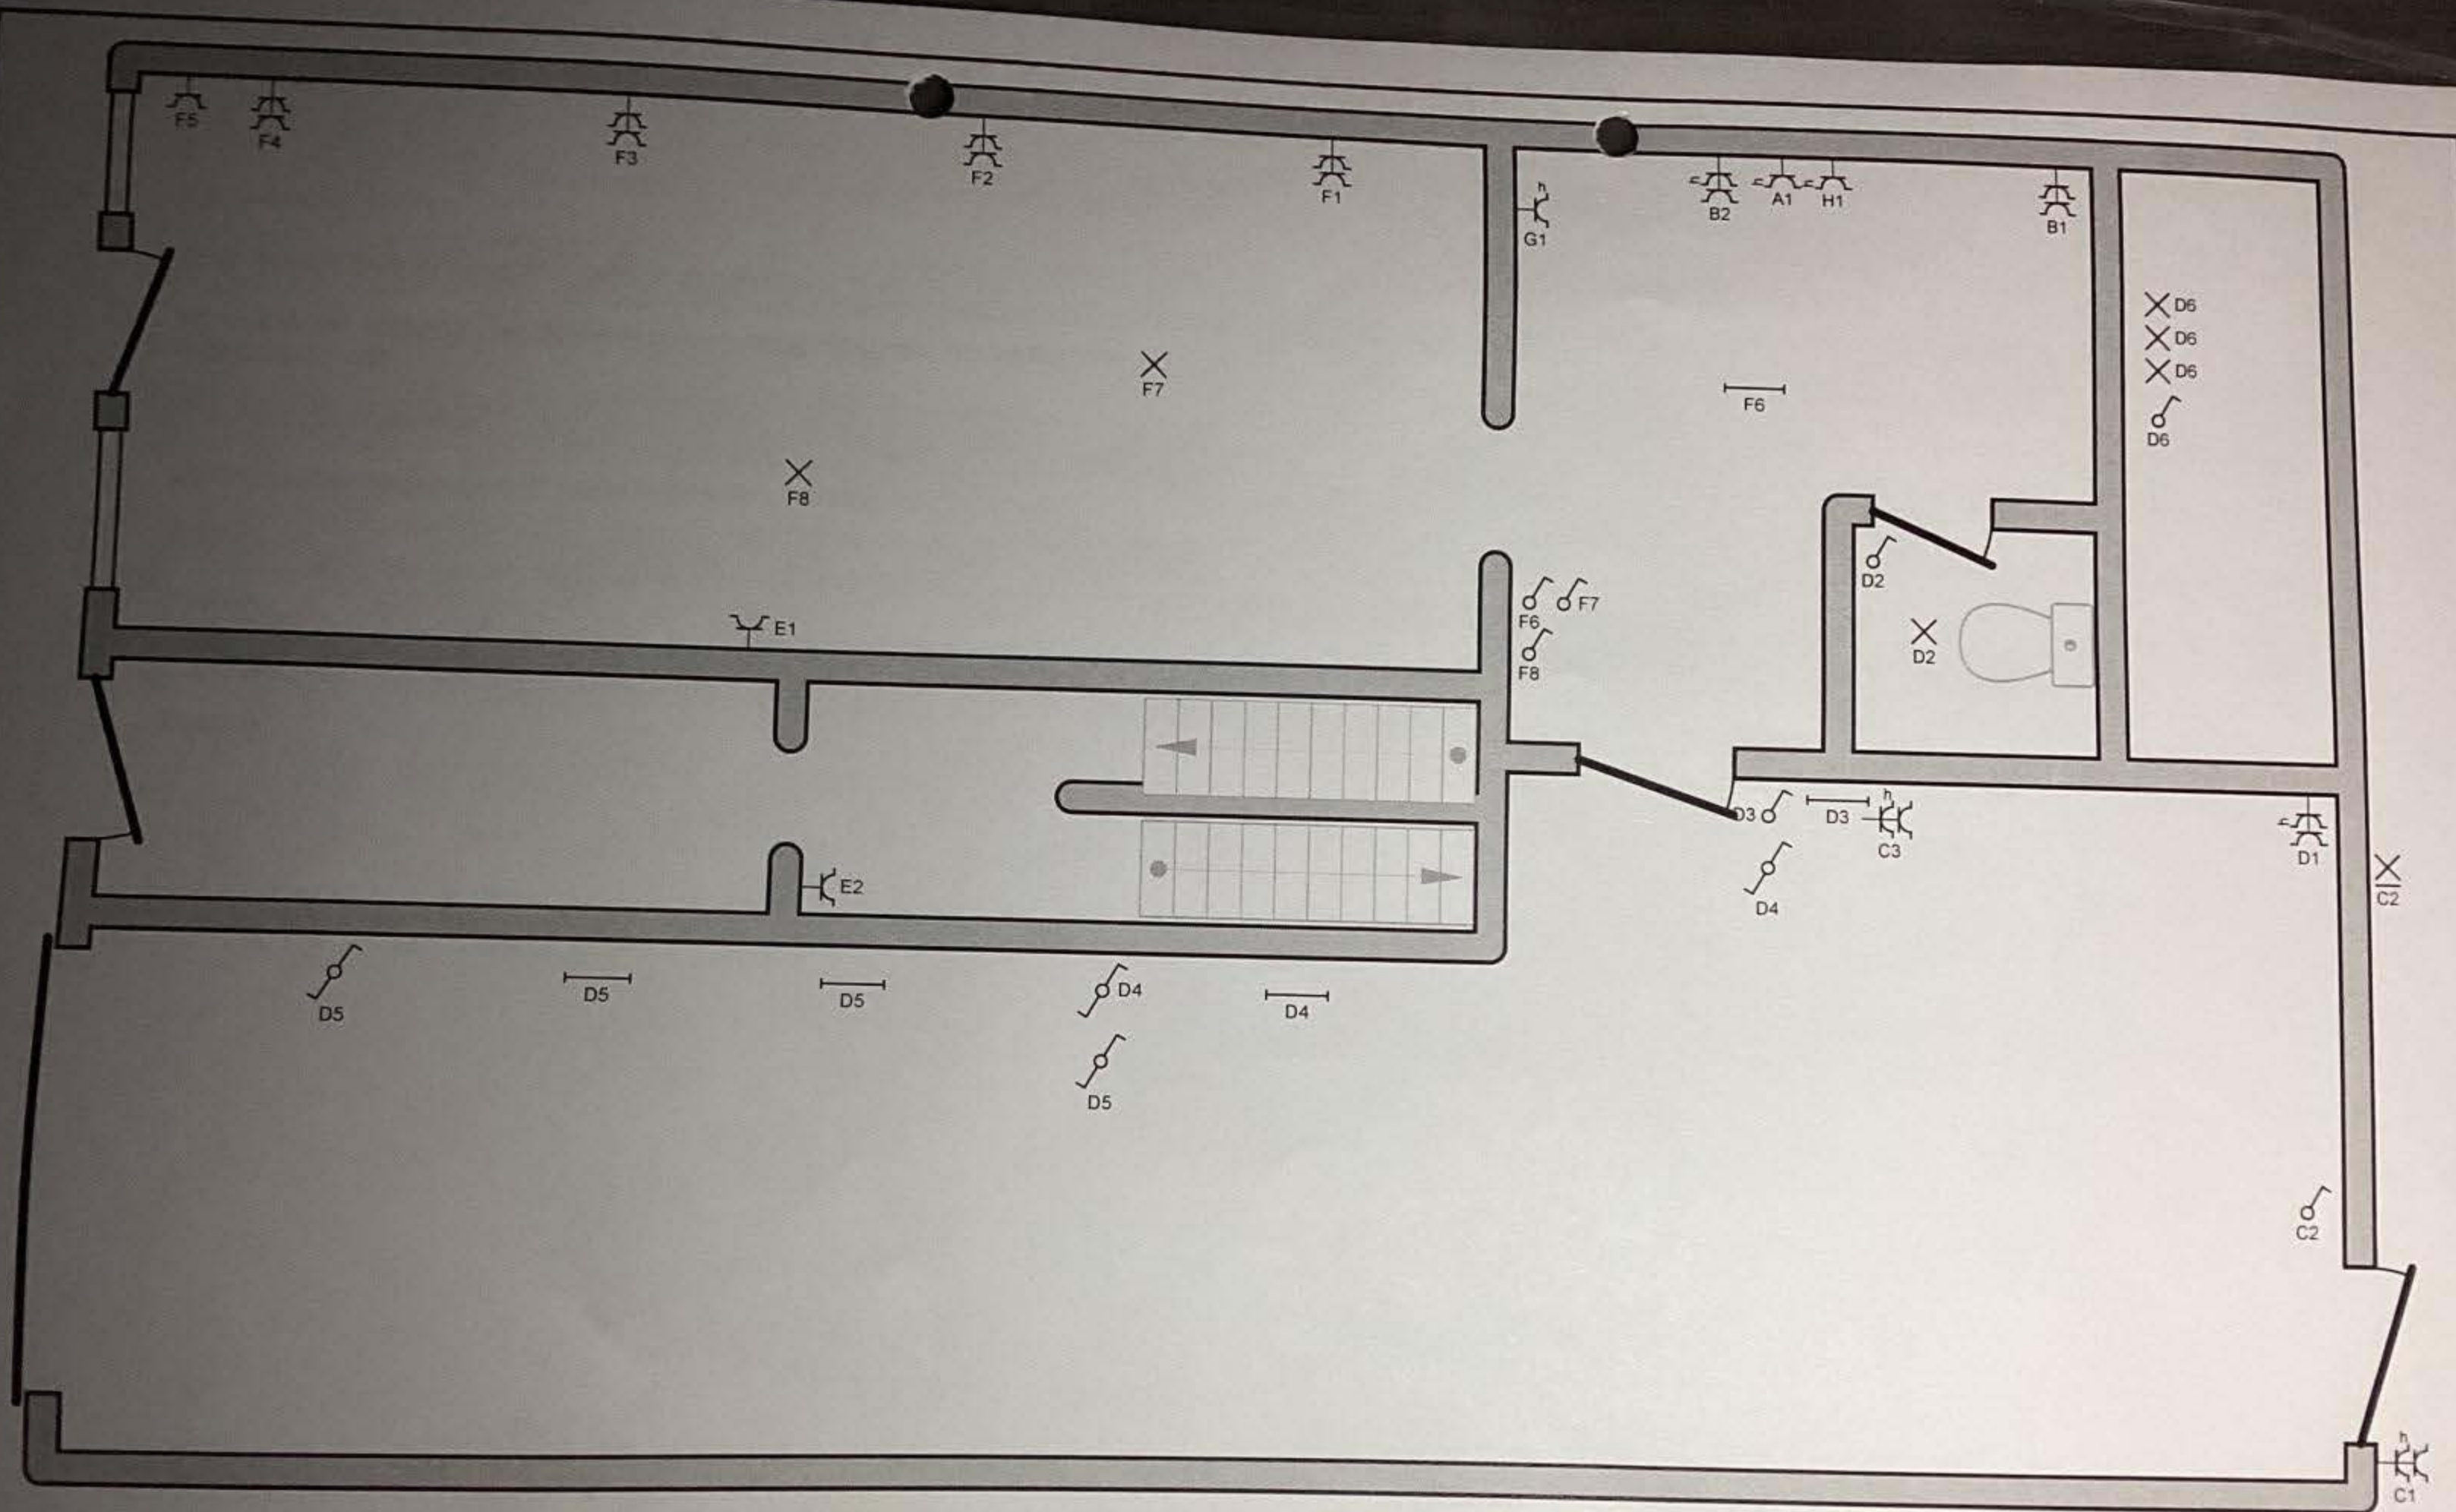

07/02/2025

GACEG
Miguel Ángel Molina


52

Plaats van de elektrische installatie
Pascale Wils
Antwerpsesteenweg 157
2845 Niel

Installateur
Elektro Carl
Pierstraat 400
2630 Aartselaar
GSM: 0473 94 59 09
e-mail: carl.blommaert@telenet.be
BTW BE 0634.702.771

p. 2/3
Situatieplan

2 x 230V ~ 50Hz

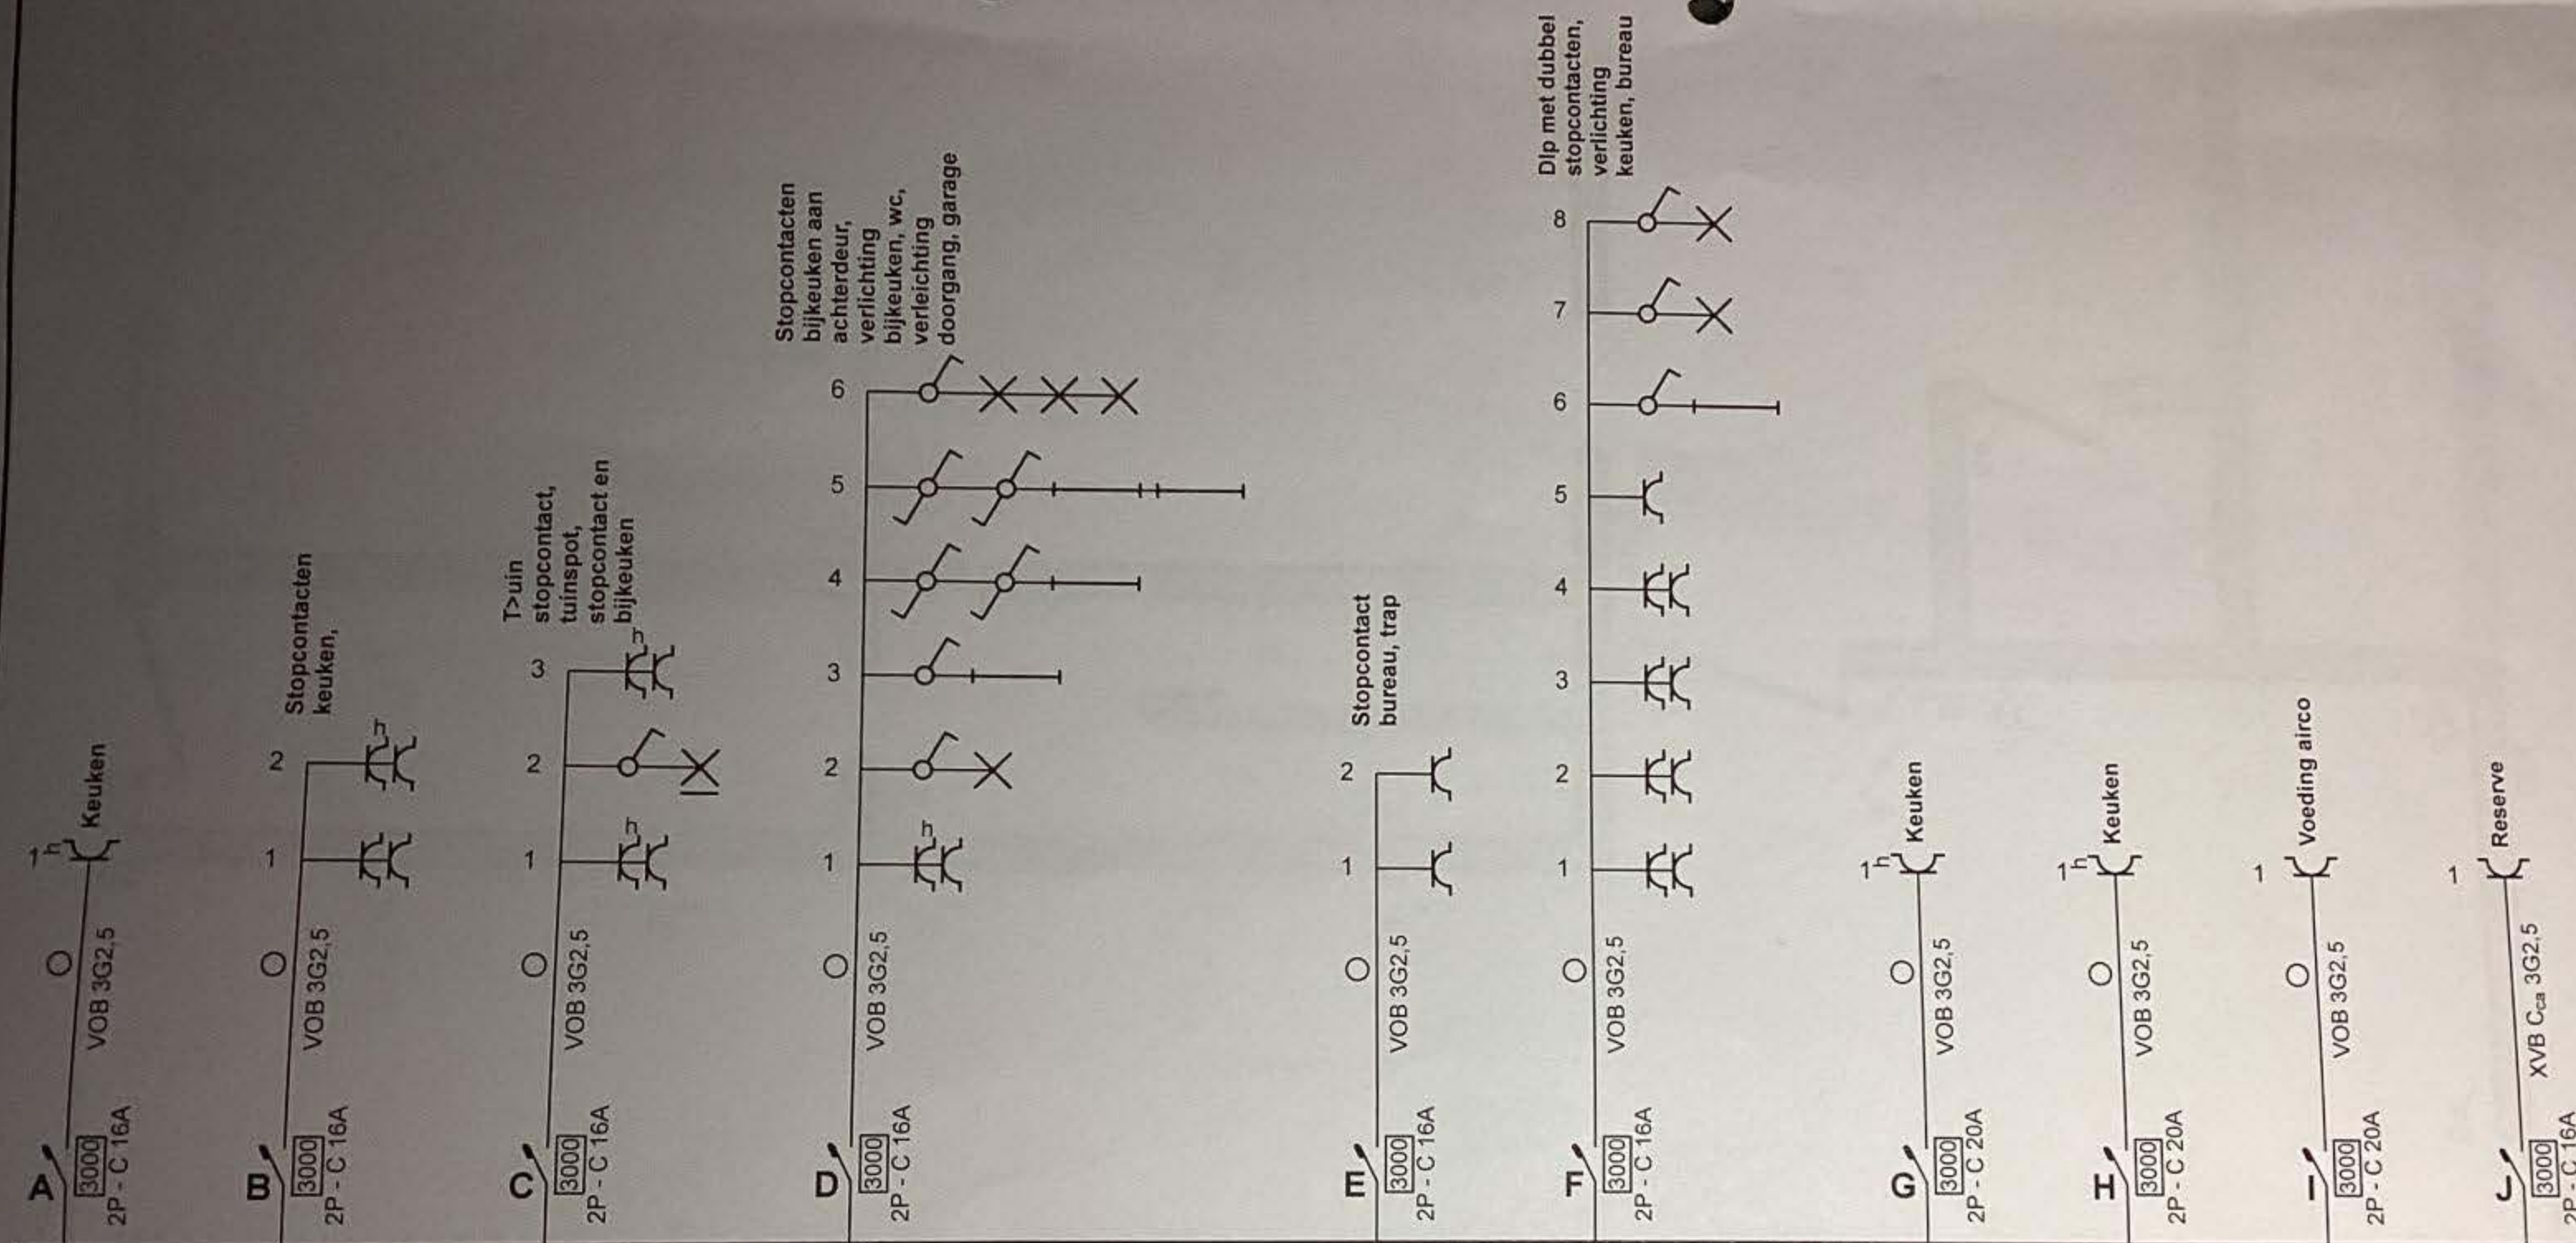

Verdeelbord gelijkvloers

XVB 4x10 Type A - $\Delta 300\text{mA}$ Type A - $\Delta 30\text{mA}$
 4P - 40A 4P - 40A

07/02/2025

GRACEO
 Masferrer y Molina

52

Plaats van de elektrische installatie
 Pascale Wils
 Antwerpsesteenweg 157
 2845 Niel

Installateur
 Elektro Carl
 Pierstraat 400
 2630 Aartselaar
 GSM: 0473 94 59 09
 e-mail: carl.blommaert@telenet.be
 BTW BE 0634.702.771

p. 1/3
 Eendraadschema
 2 x 230V ~ 50Hz

Inventaris uitwendige invloedsfactoren (AREI art. 19)

Adres van de installatie : Antwerpsestraat 157
2815 Niel

Opstellingsdatum : 07.02.2025

Behorend bij plannen en/of schema's met de nummers :

Behorend bij controleverslag met nummer :

- () Er werden geen bijzondere invloedsfactoren gemeld.
 () De hierna vermelde, in tabelvorm, bijzondere invloedsfactoren zijn aanwezig

Plaats	AA	AD	AE	AF	AG	AH	AK	AL	BA	BB	BC	BD	BE	CA	CB
Gelykloos		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Vochtigheid		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2 Ziden		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Exploitant of zijn vertegenwoordiger		Vertegenwoordiger van het Erkend Organisme	
Datum	07.02.2025	Datum	
Naam	Elektrobaal	Naam	
Handtekening		Handtekening	
