



AUTONOME SECURITY CONTROLE
Erkend CONTROLEORGANISME



**VERSLAG VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK VAN EEN HUISHOUDELIJKE
ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE A.R.E.I. Art.270**
Onderzoek conform interne procedures 23 en werkvoorschrift E006

* Datum onderzoek	13/06/2019	Verslag N°	NB 2019-0703
* Adres installatie	Sint Jozefsplein 6, 3511 Kuringen		
* Eigenaar of DNG	Kerkraad Sint Jozef Tuilt		
* Opdrachtgever	VT-Systems bvba, Holrakkersstraat 38, 3510 Kermt	Contact	0473/33-58-15
* Installateur	VT-Systems bvba, Holrakkersstraat 38, 3510 Kermt	BTW	BE 0832.618.801
* DNB	Fluvius	EAN Ref.	
* Teller N°	58 401 293	Index dag	60162.4 KWh
		Index nacht	/ KWh
* ID meettoestel	METREL type 3102		

1.- KENMERKEN VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Nominale spanning in Volt	Verspreidingsweerstand v.d. aardinrichting in Ω	Algemeen isolatieniveau RI in M Ω	Type aardelektrode	
230/400 V	15.6 Ohm	38.4 MOhm	Pennen	
Automaat DNB	Nominale waarde in A – en type v. d. bescherming v. d. aansluiting	Voedingskabel : type en $\emptyset$	Borden	Eind - stroombanen
25A/TECO/4P	40A/300mA/4P	EXVB 4 x 10 mm ²	2	9 + 5

2.- BESCHRIJVING VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Begin der werken	Funderingen	Voor		01/10/1981
	Installatie	Voor	Na	01/10/1981
Voorschriften	Algemeen Reglement op de elektrische installaties (A.R.E.I.) - Art. 270 – art. 86 Voorschriften van de DNB			
Installatie - detail beschrijving	Huishoudelijke of gelijkgestelde huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie Zie schema's in bijlage			
Type van de lokalen	Wooneenheid (huis of appartement, andere) huishoudelijke werkeenheid, gemeenschappelijke delen van de residentiële eenheid.			
Uitwendige invloeden	Geen specifieke invloeden voorgelegd			

3.- VASTGESTELDE INBREUKEN OP DE ONDER PUNT 2 VERMELDE VOORSCHRIFTEN

	GEEN

4.- BESLUIT

1. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het Algemeen Reglement op de elektrische Installaties (A.R.E.I.).
De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementaire voorgeschreven termijn.
uiterlijk op 13/06/2044 alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding voor deze datum.
De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting geplaatst bij het begin van de installatie werden ontoegankelijk
gemaakt door verzegeling . Het (de) ééndraadschema (s) werd (en) geïnviseerd .

De inspecteur
NIKI BYNENS - NB

Vr. De directeur

5.-UITGEVOERDE CONTROLES

Onderzoek conform interne **procedures 23** en werkinstructie **E006** op basis van de onder punt 2 vermelde voorschriften bij het uitvoeren van het gelijkvormigheidsonderzoek van huishoudelijke elektrische installaties

5.- a	Controle op de conformiteit van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de voorgelegde schema's.
5.- b	Controle van de staat (vastleggingen, beschadigingen...) van het vast geïnstalleerd elektrisch materieel en in het bijzonder voor wat betreft de schakelaars, de stopcontacten, de aansluitingen in de verdeelkasten en verbindingsdozen
5.- c	Controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking
5.- d	Controle van de werking van differentieelstroominrichtingen via eigen testinrichting
5.- e	Controle van de foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom van minimaal 2,5 maal de gevoeligheid van het apparaat.
5.- f	De controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen hoofd – en bijkomende equipotentiale verbindingen en van de beschermingsgeleiders van de stopcontacten en van de vast opgestelde of verplaatsbare elektrische toestellen met vaste standplaats van klasse I
5.- g	Visuele controle van vast of vast opgesteld elektrisch materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen
5.- h	Visuele controle van verplaatsbaar elektrisch materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen
- Behoudens inbreuken, wordt de overeenstemming bevestigd tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsnede van de geplaatste geleiders in de respectievelijke eindstroombanen die ze beschermen.	

6.- PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS, HUURDERS

6.a.-	De eigenaar, beheerder of huurder is verplicht het verslag van het onderzoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie, samen met de ééndraadschema's en de situatieplannen.
6.b.-	De eigenaar, beheerder of huurder is verplicht in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden.
6.c.-	De eigenaar, beheerder of huurder is verplicht de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk van personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.
6.d.	Kopieën : Onderhavig verslag mag uitsluitend in zijn geheel gereproduceerd worden na toestemming van de opdrachtgever en A"S"C


7.- VERIFICATIE VAN HET VERSLAG DOOR DE DNB

Datum	De aangestelde van de netbeheerder : Naam	Handtekening

Nota : Onderhavig verslag mag uitsluitend gebruikt worden voor de doelstellingen waarvoor het werd opgemaakt d.w.z. gelijkvormigheidsonderzoek en voor geen enkel ander doel.

Nota : Dit betreft een keuring na renovatie.

Betekenis van de nota's : betreffen de gebreken die geen invloed hebben op de besluitvorming, vaststellingen die buiten het kader van het onderzoek vallen maar geen gevaar inhouden voor de veiligheid, of organisatorische gegevens.

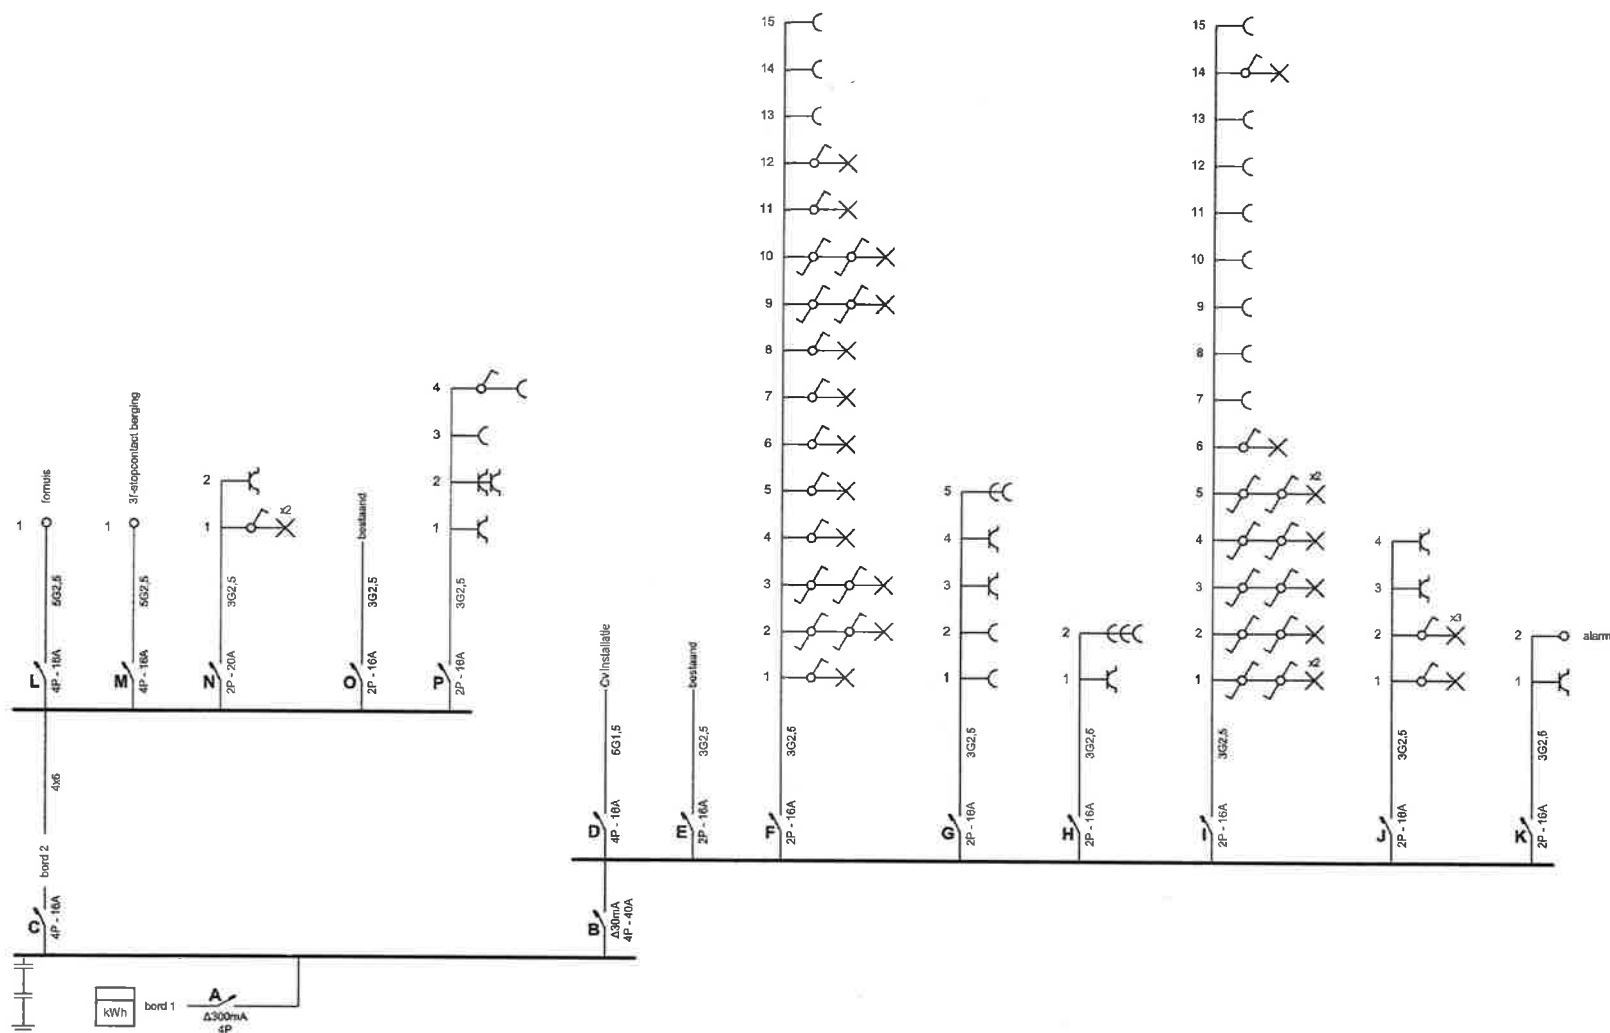

Erkend Organisme

A^oS^oC.
Singellaan 16A
3545 Halen
GSM: 0483 42 98 30
Fax: 011 58 29 61
e-mail: bureel@asc-controle.be

Plaats van de elektrische Installatie

kerkraad sint jozef tuil
sint jozefplein 6
3511 Kuringen


Installateur

VT-systems bvba
Holrakerstraat 38
3510 Kermt
GSM: 0473 33 58 15
e-mail: info@vt-systems.be
BTW BE 0832.618.801

p. 1/4

Eendraadschema

3 x 400V + N ~ 50Hz

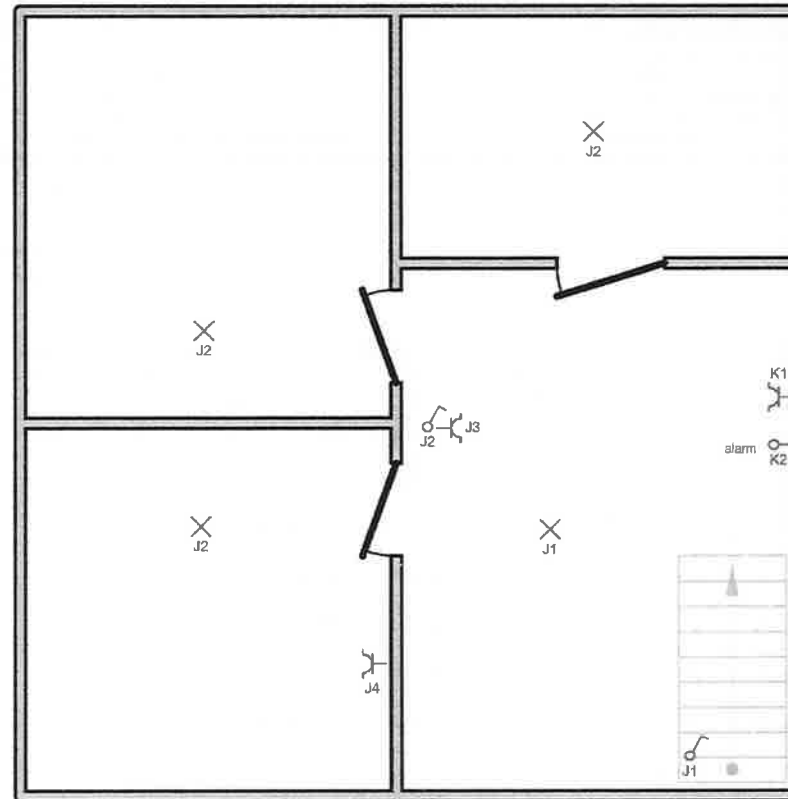


kelder

Erkend Organisme
A*S*C.
Singellaan 16A
3545 Halen
GSM: 0483 42 98 30
Fax: 011 58 29 61
e-mail: bureel@asc-controle.be

Plaats van de elektrische installatie
kerkraad sint jozef tuilt
sint jozefsplein 6
3511 Kuringen

Installateur
VT-systems bvba
Holrakerstraat 38
3510 Kermt
GSM: 0473 33 58 15
e-mail: info@vt-systems.be
BTW BE 0832.618.801

p. 2/4
Situatieschema
3 x 400V + N ~ 50Hz

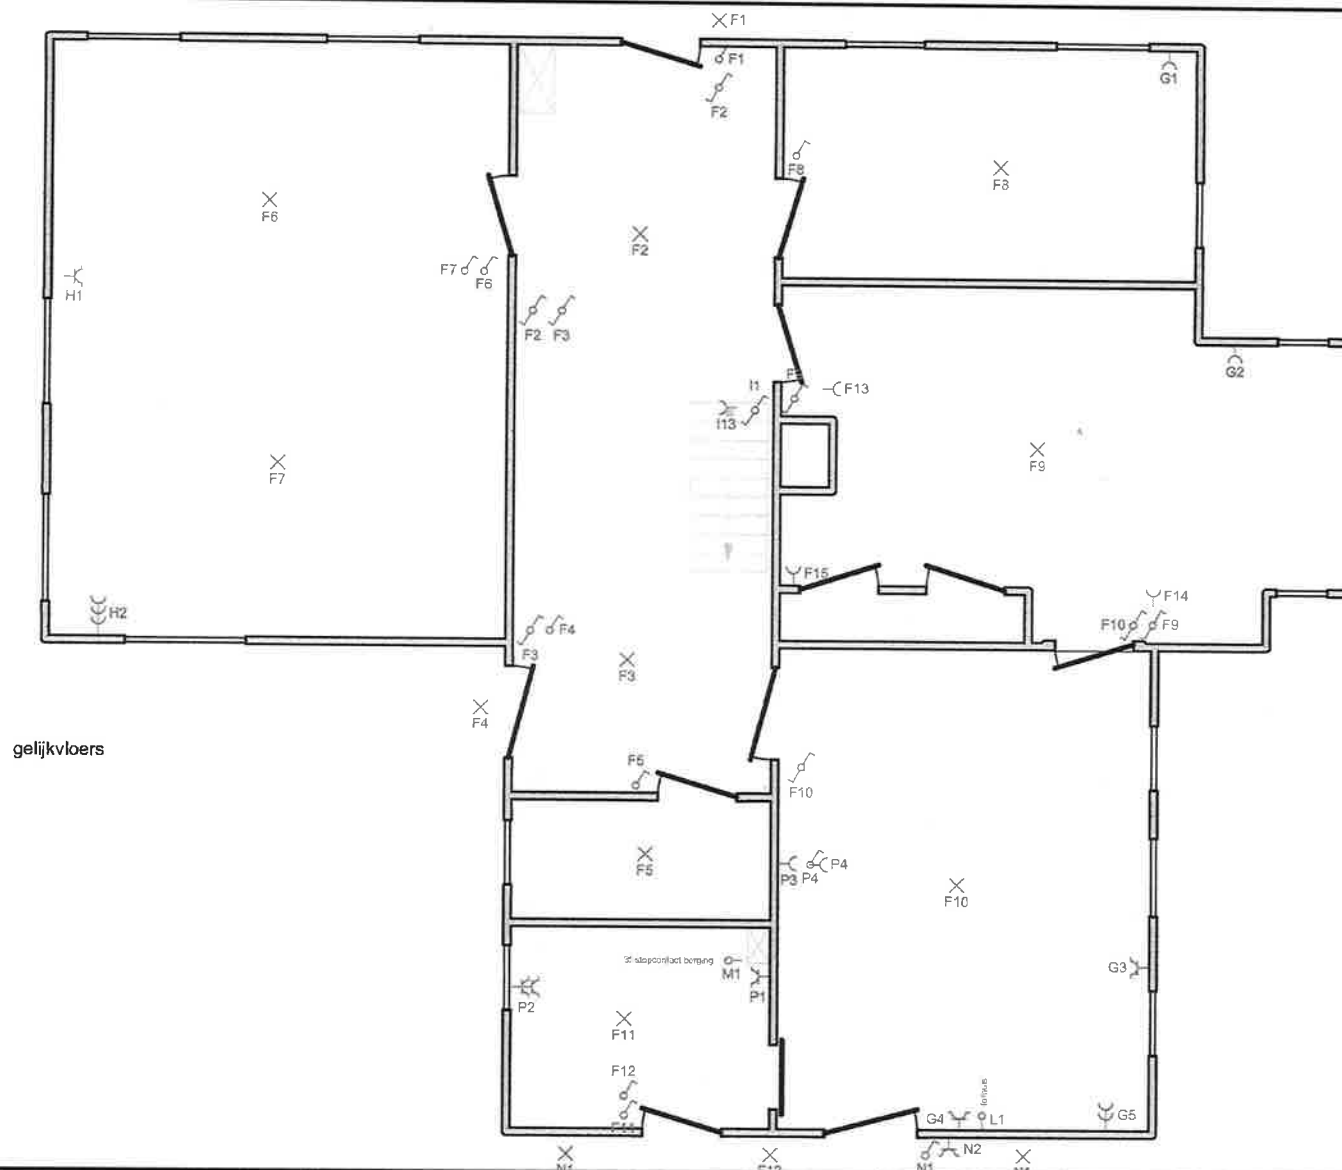

Erkend Organisme

A"S"C.
Singellaan 16A
3545 Halen
GSM: 0483 42 98 30
Fax: 011 58 29 61
e-mail: bureel@asc-controle.be

Plaats van de elektrische installatie

kerkraad sint jozef tuil
sint jozef plein 6
3511 Kuringen


Installateur

VT-systems bvba
Holrakerstraat 38
3510 Kermt
GSM: 0473 33 58 15
e-mail: info@vt-systems.be
BTW BE 0832.618.801

p. 3/4

Situatieschema

3 x 400V + N ~ 50Hz

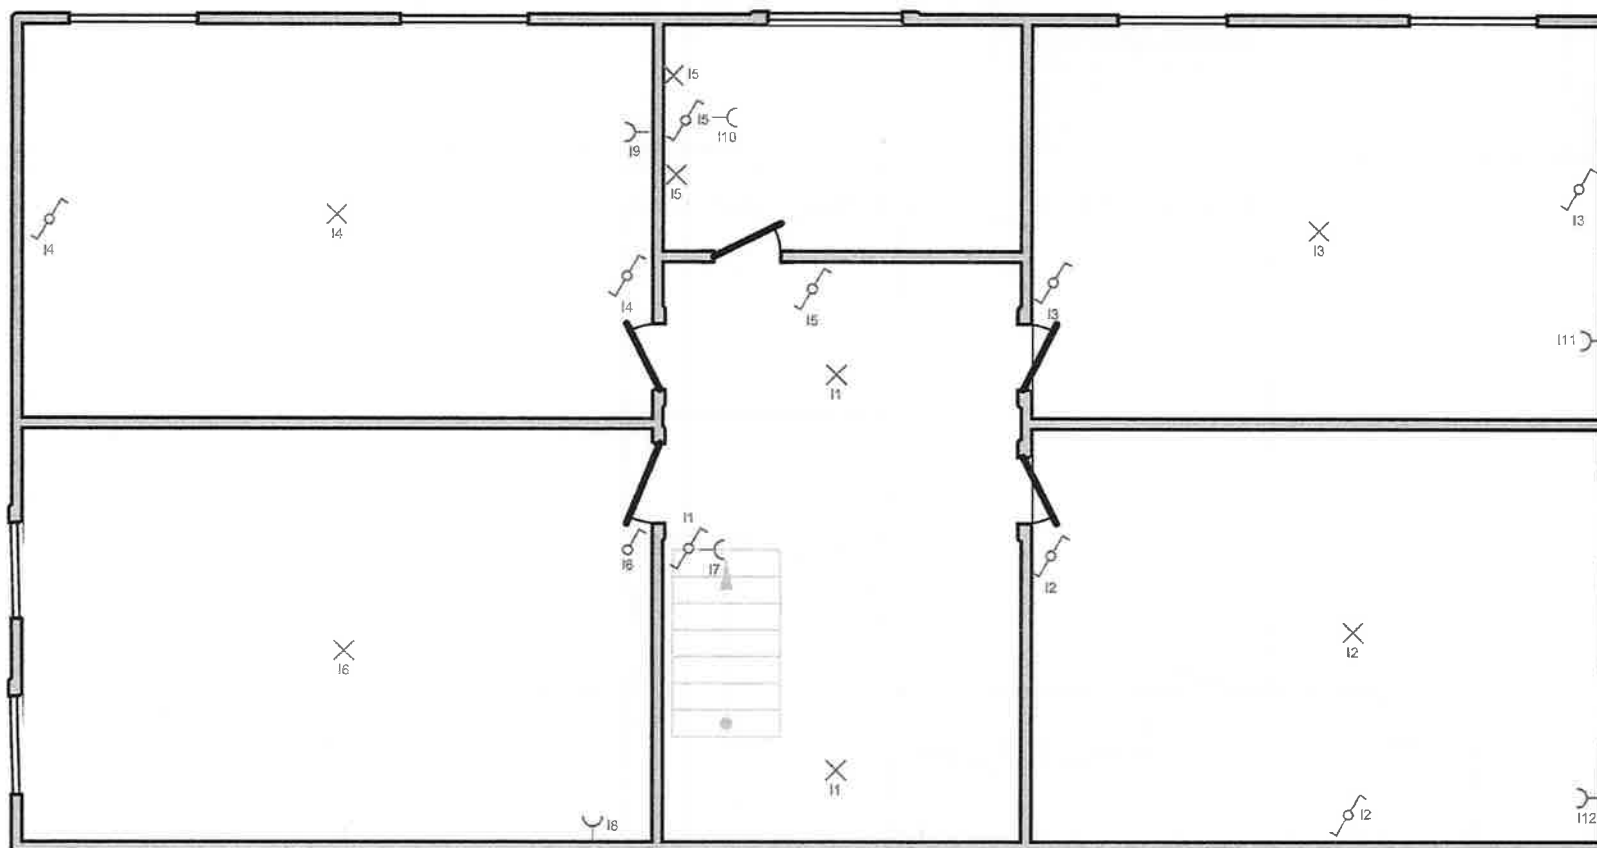

verdiep

zolder

Erkend Organisme
A*S*C.
Singellaan 16A
3545 Halen
GSM: 0483 42 98 30
Fax: 011 58 29 61
e-mail: bureel@asc-controle.be

Plaats van de elektrische installatie
kerkraad sint jozef tuilt
sint jozefplein 6
3511 Kuringen

Installateur
VT-systems bvba
Holrakkerstraat 38
3510 Kermt
GSM: 0473 33 58 15
e-mail: info@vt-systems.be
BTW BE 0832.618.801

p. 4/4
Situatieschema
3 x 400V + N ~ 50Hz
