



VINÇOTTE asbl

Organisme de contrôle agréé | Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail
Siège social: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • Belgique
TVA: BE 0402.726.875 • RPM Bruxelles • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Rapport n° : 30649830

- ☐ Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent
☐ Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde
☐ Noordersingel 23, 2140 Antwerpen
☒ Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux

Tel: +32 9 244 77 11
Tel: +32 2 674 57 11
Tel: +32 3 221 86 11
Tel: +32 81 432 611

gent@vincotte.be
brussels@vincotte.be
antwerpen@vincotte.be
gembloux@vincotte.be



F 130542

Rési code : 3

PROCÈS VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BASSE TENSION

Responsable des travaux :

Installation :

Propriétaire / gestionnaire :

Nom, Prénom :	Nom, Prénom :
Adresse : Rue du Ryment 28 boîte 5	Adresse :
N° carte d'identité :	N° carte d'identité :
N°TVA : BE	N°TVA : BE
CP + Commune : 6700 FREYLANGE	CP + Commune :
Tél. :	Tél. :

Bases de l'examen : Règlement Général sur les Installations Électriques (RGIE)

☐ Art 270	☐ mise en usage	☐ modification	☐ extension	☒ Art 86	☐ Art 271bis	☒ Unité d'habitation
☐ Art 271	☐ mobile	☐ temporaire	☐	☐ Art 87	☐ Art 278	☐ Unité de travail domestique
☒ Art 276 : renforcement	☐ périodique	☒ contrôle	☐	☐ Art 88	☐ Art	☐ Parties communes
☐ Art 276bis : vente d'une unité d'habitation	☐	☐	☐	☐ Art	☐ Art	☐ Unité de travail

Données générales de l'installation électrique :

Données distributeur	EAN :	☐ EAN non communiqué	☐ Compt. kWh non placé
Compt. kWh n° : 44793598	Index jour : 59143	Index nuit : 478036	☐ Compt. kWh exclusif nuit :
Protection branchement (A) : ☒ 20 ☒ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100	n° :		
Données installation	Conçue pour U _N : ☐ 230 V ☒ 3x230 V ☐ 3N400 V	Type de prise de terre : ☒ boucle de terre ☐ barres / piquets	
Courant nominal maximum (A) : ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100	Câble d'alimentation tableau principal : 4 X 10 mm ² - Type : EXLV7		☐
Description installation	Dispositif diff. gén. : 40 A / 30 mA	Nombre de tableaux : 1	Nombre de circuits terminaux : 11
☐ Voir annexe(s)	8 II 16A 2 II 20A 1 IV 25A		

Mesures - tests - contrôle visuel - scellés :

☒ Contacts dir.	☒ Contacts indir.	☒ Montage	☐ Appareils	☒ Matériel	☒ I>/section	☒ Schémas	☒ Contrôle bcl de défaut
Résistance de dispersion de la prise de terre : 18 Ω		Isolément général : 10 MΩ		Continuité de terre		Test dispositif diff.	
Le dispositif différentiel général : ☒ était plombé ☐ a été plombé ☐ n'a pas été plombé ☐ ne peut pas être plombé							

Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels : voir au verso)

Infractions Nouvelle installation	
☒ Néant	
Infractions Installation existante	
☒ Néant	
Remarques	
☐ Néant	

Conclusion(s) :

- ☐ La nouvelle installation est conforme n'est pas conforme au RGIE.
☒ L'installation existante est conforme n'est pas conforme au RGIE.

Agent visiteur :

Nom : PO STAL

Agent n° : 4546

Date : 19/03/2019

Annexe(s) : ☒ Schéma(s) de position : 1

☒ Schéma(s) unifilaire(s) : 1

L'installation électrique doit être recontrôlée avant

19/03/2019

☒ par le même organisme de contrôle (*)

Pour le Directeur Général : Signature



VINÇOTTE asbl
David Postal
4546

- Ce procès verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation.
- Le Service Public Fédéral Economie doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.
- Le contrôle n'a porté que sur les parties visibles et accessibles de l'installation.
- Les informations recueillies sur place ne nous permettent pas de déterminer la date de réalisation de l'installation électrique.
- Nous vous invitons à compléter le(s) schéma(s) pour les éléments qui n'étaient pas visibles lors de la visite de contrôle. En cas de doute portant sur la sécurité de ces éléments, nous vous invitons vivement à faire procéder à une visite de contrôle complémentaire.
(*) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite de contrôle doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de cette nouvelle visite de contrôle, après max. 1 an, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

TABLEAU DIVISIONNAIRE OU DE REPARTITION

20A	20A	16A	16A	16A	16A	DIFF 0,300 mA
K	J	I	H	G	F	40 A

16A	16A	16A	16A	TRIPH 25A	DIFF 0,030 mA
E	D	C	B	A	40 A

DIFF 0,300 mA.

A : CUISINE sous NEUBERG 1 Boîtier Conversion vers Triph. VTPO.

B : c/h/h (1-2) : 6 points prises + 2 points Lampes.

C : SALLON, SALL, CUISINE : 7 points Prises + 1 Point Lampe.

D : BALCON ENU-CHAUDE : 1 Point Prise.

E : S.B.H, CHAUFF : 5 points Prises + 3 points Lampes.

DIFF 0,030 mA :

F : SALLE DE BAIN + HALL : 3 points Prises + 1 Ventilation, 4 points Lampes.

G : CUISINE sous evier : 1 Point Prise LAVE-VAISSELLE.


H : S.D.B. : 1 Point Prise : LAVE - LINGE.

I : S.D.B. : 1 Point Prise : SECHE - LINGE.

J : CUISINE : 4 points Prises (Four, Hotte, Plaque, Denis) 1 Point Lampe + (Ch.)

K : CUISINE : 2 points Prises (sous meuble bas, sous evier), 1 Point Lampe

L : RESERVE.

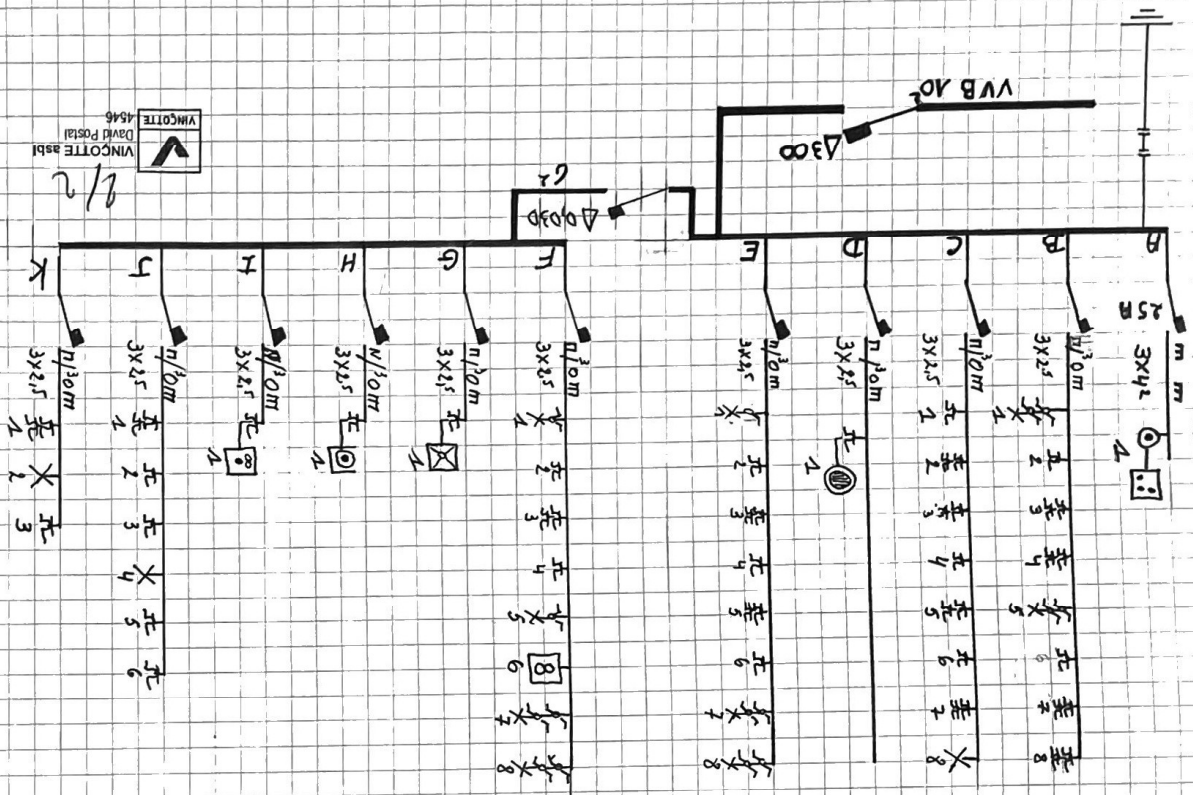

Sahera UNIFILAIR

Appartement 2^{ème} étage / gauche

Propriétaire [REDACTED]

Adresse : 18 Rue du Beynert, Freylouse
6700 Arlon.

Signature: *[Signature]*

Instaureur:

Signature

Organisme de Contrôle:

Technicien Nom: *[Signature]*

Signature: *[Signature]*

Alcave: Complexe No 44793598 - 1994

Trapp. - 25 A.

