

- | | | |
|--|----------------------|--|
| ☐ Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent | Tel: +32 9 244 77 11 | gent@vincotte.be |
| ☐ Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde | Tel: +32 2 674 57 11 | brussels@vincotte.be |
| ☐ Noordersingel 23, 2140 Antwerpen | Tel: +32 3 221 86 11 | antwerpen@vincotte.be |
| ☒ Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux | Tel: +32 81 432 611 | gemboux@vincotte.be |



F 164960

Rési code : 1

RAPPORT : INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES À BASSE TENSION ET À TRÈS BASSE TENSION (LIVRE 1 – AR 8/09/2019) – DIR. GÉN. DE L'ÉNERGIE

Responsable exécution des travaux :

Installation :

Propriétaire / Exploitant / Gestionnaire :

Nom, Prénom : <u>MARTIN</u>	Nom, Prénom : <u>[REDACTED]</u>
N° carte d'identité : <u></u>	Adresse : <u>Route de Bouillon 215A</u>
N°TVA : BE <u></u>	CP + Commune : <u>6700 ARLON</u>
Tél. : <u></u>	Tél. : <u></u>

Bases de l'examen : Livre 1 – AR 8/09/2019 (MB 28/10/2019) («RGIE»)

INSITUT DE BEAUTÉ

- | | | | |
|--|---|--|---|
| ☒ Contrôle de conformité avant mise en usage – nouvelle installation (6.4.)
☐ Contrôle de conformité avant mise en usage – modification/extension importante (6.4.)
☐ Visite de contrôle (6.5.)
☐ Visite de contrôle renforcement puissance ancienne installation (8.4.1.)
☐ Visite de contrôle vente ancienne installation (8.4.2.)
☐ Visite de contrôle libre ancienne installation (8.4.3. ou 8.4.4.) | | ☐ Unité d'habitation
☒ Unité de travail
☐ Installation de chantier

☐ Parties communes d'un ensemble résidentiel
☐ Locaux techniques d'un ensemble résidentiel
☐ Installation de production décentralisée
☐ Autre installation : | ☐ Avant le 1/10/1981
☒ Entre 1/10/1981 & 1/06/2020
☐ À partir du 1/06/2020 |
| Dérogations Partie 8 : | ☐ Appliquées
☒ Pas appliquées | | |

Données générales de l'installation électrique : ☐ Document début réalisation avant le 01/06/2020 : n° Date

[illegible]

Données installation	Conçue pour U_N : ☒ mono 230 V ☐ 3x230 V ☐ 3N400 V ☐	Type prise de terre : ☐
	Courant nominal maximum (A) : ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☒ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐	☐ boucle de terre ☐ barres / piquets
	Câble d'alimentation tableau principal : <u>4</u> X <u>70</u> mm ² - Type : <u>EKL3</u>	Schéma MLT : ☒ TT ☐

Description installation	Dispositif diff. gén. : ... <u>63</u> ... A / .. <u>300</u> ... mA	Nombre de tableaux : .. <u>1</u> ..	Nombre de circuits terminaux : .. <u>16</u> ...
<u>2</u> Voir annexe(s)			

Mesures - tests - contrôle visuel - scellés :

☒ Contacts dir.	☒ Contacts indir.	☒ Montage	☐ Matériel mobile	☒ Matériel fixe	☒ >/section	☒ Schémas	☐ Contrôle bcl de défaut
☒ Résistance de dispersion de la prise de terre : <u>3.44</u> Ω		☒ Isolement général : <u>1</u> ... M Ω		☐ Continuité (équipot., PE)		☒ Test dispositif diff.	
Le dispositif différentiel général : ☐ était scellé ☒ a été scellé ☐ n'a pas été scellé ☐ ne peut pas être scellé						Schémas et plans signés ☒ Oui / ☐ Non	

Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels : voir au verso)

Infractions constatées Nouvelle installation  Néant	
Infractions constatées Installation existante  Néant	
Remarques  Néant	

Conclusion :

🔧 L'installation électrique **est conforme** aux prescriptions du Livre 1 (AR 8/09/2019).

~~© L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du Livre 1 (AR 8/09/2019).~~

Agent visiteur :

Nom : Gaëlle Loïc Agent n° : 5817 Date 05.11.2020

Annexe(s) : ☒ Plan(s) de position : 1 ☒ Schéma(s) unifilaire(s) : 1

Un nouveau contrôle doit être effectué avant le

05/11/2045

○ par le même organisme agréé (*).

Pour le Directeur Général : Signature


Wilson lai
A-7811

- Ce rapport doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation.
- Le Service Public Fédéral Economie doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.
- Le contrôle n'a porté que sur les parties visibles et accessibles de l'installation.
- Les informations recueillies sur place ne nous permettent pas de déterminer la date de réalisation de l'installation électrique.
- Nous vous invitons à compléter le(s) schéma(s) pour les éléments qui n'étaient pas visibles lors du contrôle. En cas de doute portant sur la sécurité de ces éléments, nous vous invitons vivement à faire procéder à un contrôle complémentaire.
- (*) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de cette nouvelle visite de contrôle, après max. 1 an, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du rapport de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

СТОКЕН

===== govt

+ réception Vincelle

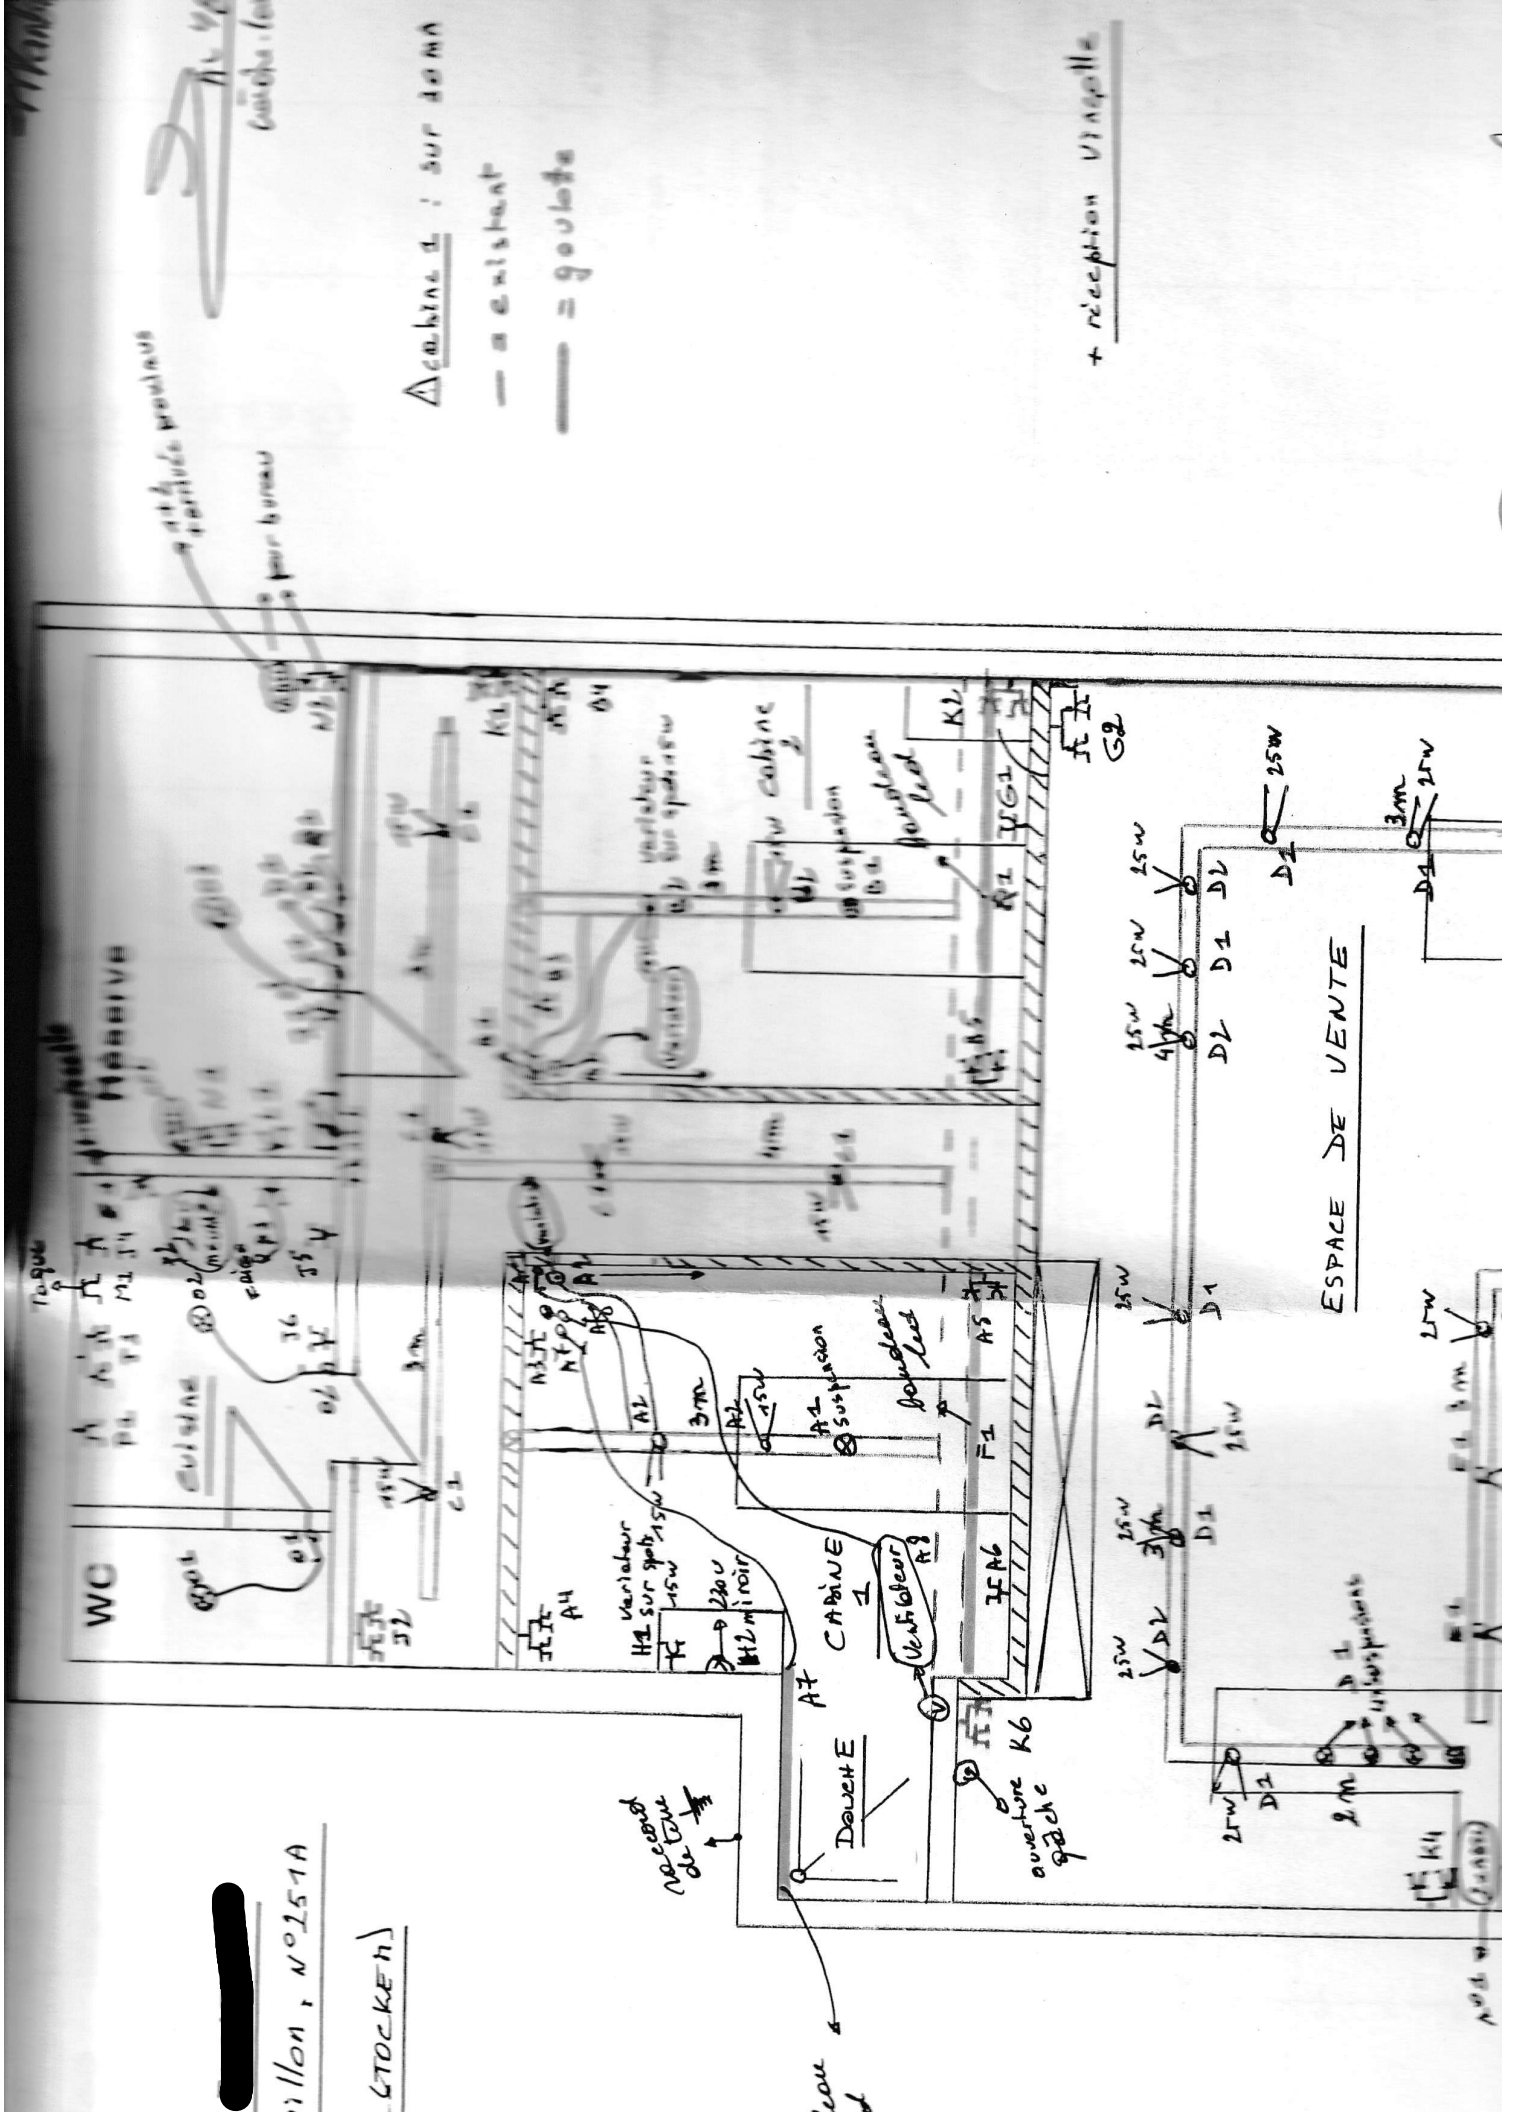

ension : 3 x 400V + Neutre

Réseau de terre : TT

Câblage installation : E = encastré (préflex+LSOH)
+ câble x 6 B

Disjoncteurs / différentiels : Hager

MWN210A : 10A (3000) type C




MWN216A : 16A (3000) type C

MWN220A : 20A (3000) type C

MWN620A : 20A (3000) type C

CDA440E : Δ300 40A type A

CFA440E : Δ30 40A type A

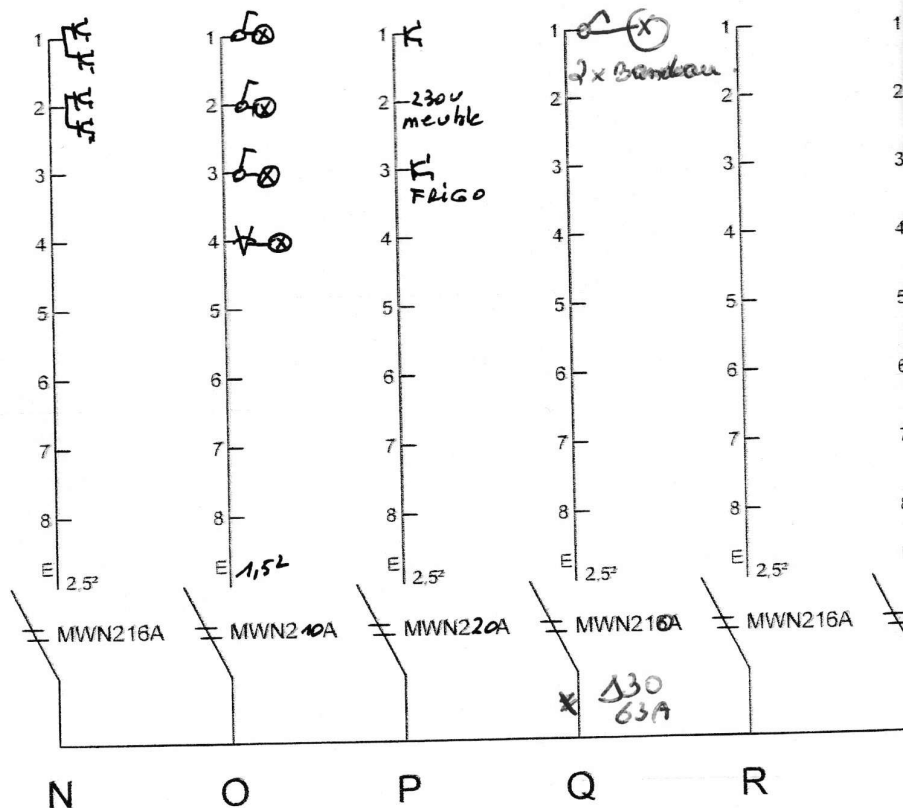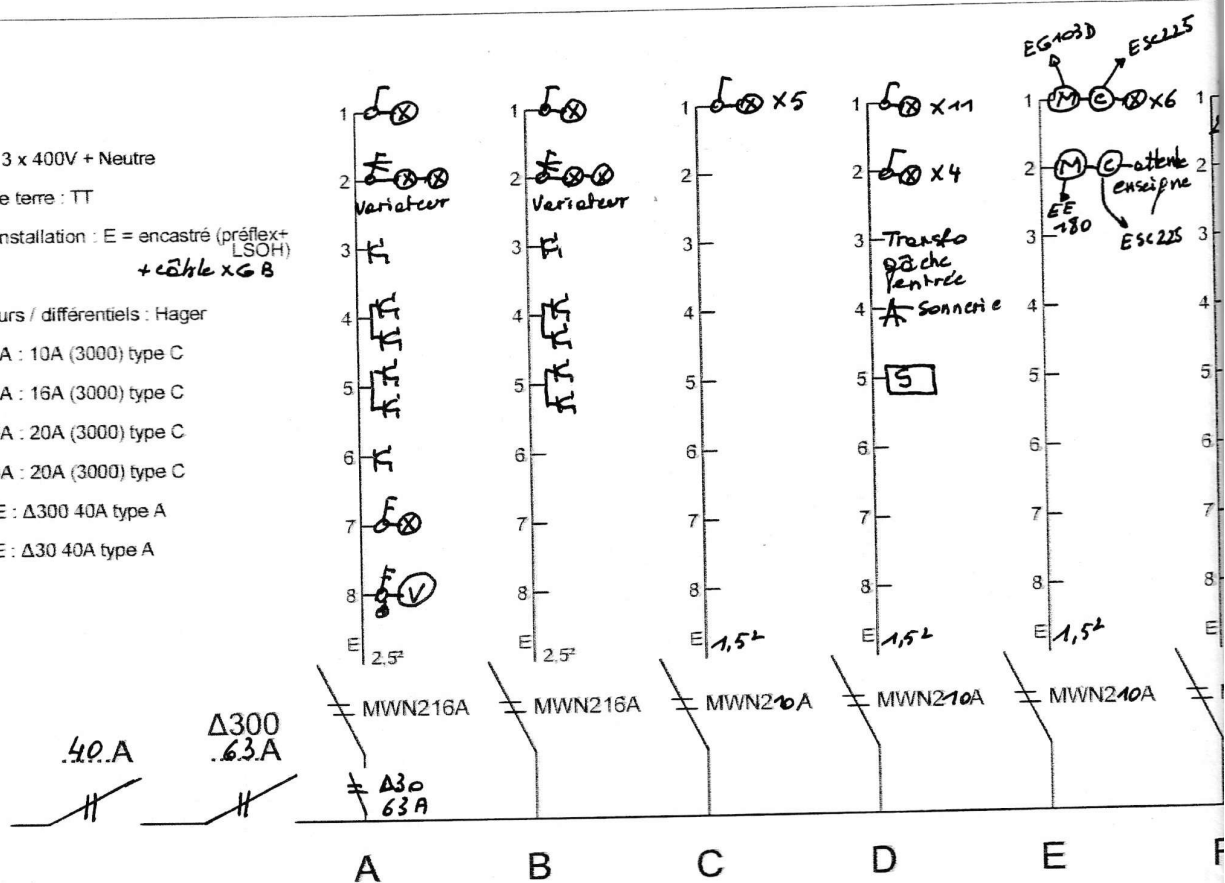

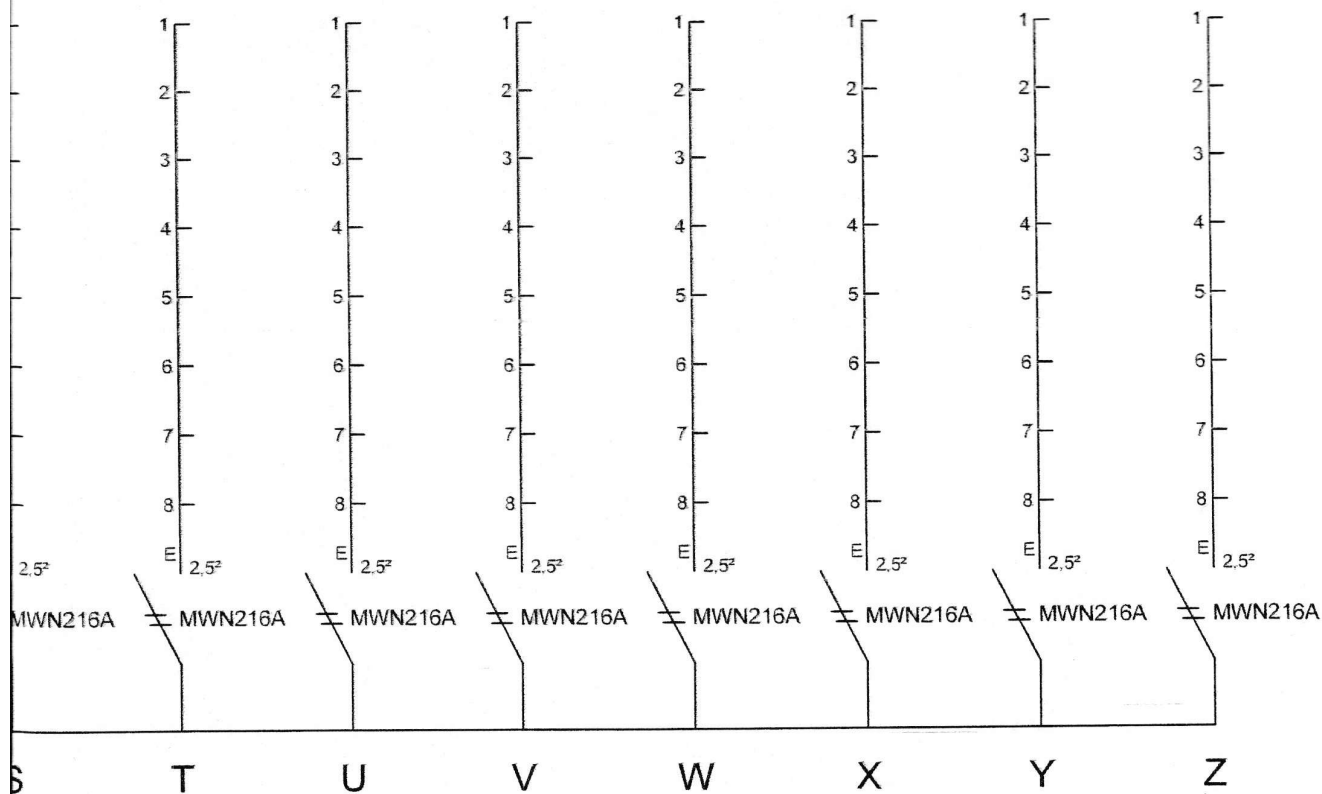
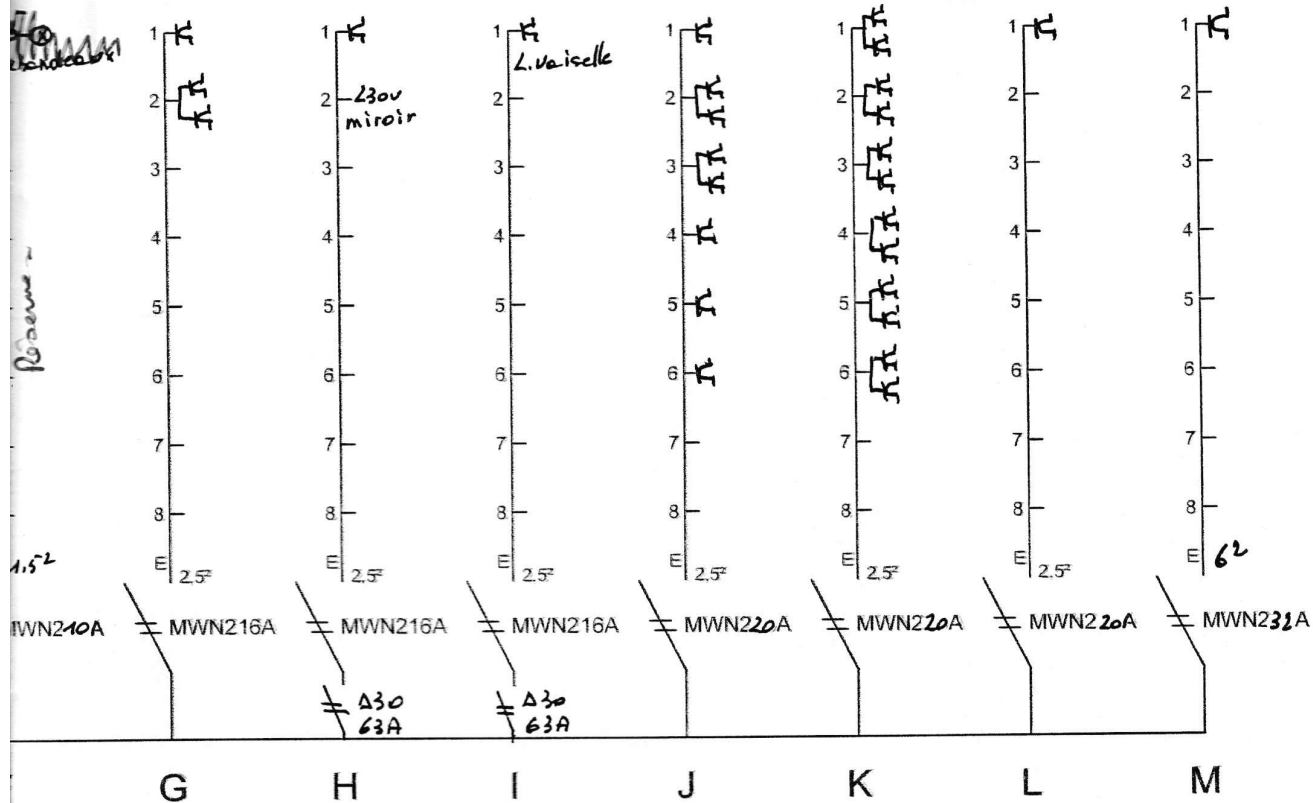
1.5^{-2} 

Tableau des facteurs d'influences externes (RGIE art. 19)

Le lieu d'installation: Route de Rouillon n° 215 A
 6700 ARON (STOCKEM).....

La date de conception: 10/09/2020.....

Appartenant aux plans et/ou schémas avec les numéros:

..... 1-3.....

Appartenant au procès-verbal de contrôle avec référence:

..... 60992239.....

- () Il n'a pas été mentionné de facteurs d'influences externes spécifiques.
 () Les facteurs d'influences externes spécifiques mentionnés ci-après sous forme de tableau sont présents:

Lieu/Local	AA	AD	AE	AF	AG	AH	AK	AL	BA	BB	BC	BD	BE	CA	CB
WC	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Cuisine	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Reserve	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Dégarage	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Cabine 1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Cabine 2	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Espace de vente	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Exploitant ou son représentant	
Date	29/10/2020
Nom	[REDACTED]
Signature	[REDACTED]

Responsable de l'organisme agréé	
Date	05/11/2020
Nom	05/11/2020 Cédric Léc
Signature	Pour M. AC 4011 Cédric Léc

SPRL Christian Martin
Rue des Cawettes (Champs) 29
6687 Bertogne
Belgique



Pour l'installation [REDACTED] route de Bouillon 215A 6600 Arlon

Liste des installations de sécurité :


Présence de 1 éclairage de sécurité par bloc autonome (Legrand 661602)

Il n'y pas de présence de circuits critiques dans l'installation.

Ch. Martin

Le 29/10/2020

Signature

 [REDACTED]
