



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Siège d'exploitation: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
Tél +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Siège social: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Bruxelles

Safety, quality and environmental services

Rapport n° :



F 109638

Rési code :

Antwerpen-Limburg tél : 03 221 86 11 Oost & West-Vlaanderen tél : 09 244 77 11
 Brabant tél : 02 674 57 11 Wallonie tél : 081 432 611

1

PROCÈS VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BASSE TENSION

Responsable des travaux :		Installation :		Propriétaire / gestionnaire :	
Nom, Prénom : <u>André VINCOTTE</u>	Nom, Prénom : <u>M. JACQUES PEREA</u>			
.....	Adresse : <u>Rue Hattier 48A</u>			
N° carte d'identité :	CP + Commune : <u>6790 HALANZÉE</u>	<u>Appart 2° ét</u>			
N° TVA : BE	Tél. :			

Bases de l'examen : Règlement Général sur les Installations Electriques (RGIE)

<input checked="" type="radio"/> Art 270 <input checked="" type="radio"/> mise en usage <input type="radio"/> modification <input type="radio"/> extension	<input checked="" type="radio"/> Art 86 <input type="radio"/> Art 271bis <input checked="" type="radio"/> Unité d'habitation
<input type="radio"/> mobile <input type="radio"/> temporaire	<input type="radio"/> Art 87 <input type="radio"/> Art 278 <input checked="" type="radio"/> Unité de travail domestique
<input type="radio"/> Art 271 <input type="radio"/> périodique <input type="radio"/> contrôle <input type="radio"/>	<input type="radio"/> Art 88 <input type="radio"/> Art <input checked="" type="radio"/> Parties communes
<input type="radio"/> Art 276 : renforcement <input type="radio"/> Art 276bis : vente d'une unité d'habitation	<input type="radio"/> Art <input type="radio"/> Art <input checked="" type="radio"/> Unité de travail

Données générales de l'installation électrique :

Données distributeur	EAN	<input type="radio"/> EAN non communiqué	<input checked="" type="radio"/> Compt. kWh non placé
	Compt. kWh n° :	Index jour :	nuit :
Données installation	Conçue pour U _n : <input checked="" type="radio"/> 230 V <input type="radio"/> 3x230 V <input type="radio"/> 3N400 V		Type de prise de terre :
	Courant nominal maximum (A) : <input type="radio"/> 020 <input type="radio"/> 025 <input type="radio"/> 032 <input type="radio"/> 040 <input type="radio"/> 050 <input checked="" type="radio"/> 063 <input type="radio"/> 080 <input type="radio"/> 100		<input checked="" type="radio"/> boucle de terre <input type="radio"/> barres / piquets
	Câble d'alimentation tableau principal : <u>3</u> X <u>10</u> mm ² - Type : <u>X67</u>		<input type="radio"/>
Description installation	Dispositif diff. gén. : <u>63</u> A <u>10</u> mA		Nombre de tableaux :
	Nombre de circuits terminaux : <u>15</u>		
<input type="radio"/> Voir annexe(s)			

Mesures - tests - contrôle visuel - scellés :

<input checked="" type="radio"/> Contacts dir.	<input checked="" type="radio"/> Contacts indir.	<input checked="" type="radio"/> Montage	<input checked="" type="radio"/> Appareils	<input checked="" type="radio"/> Matériel	<input type="radio"/> I>/section	<input checked="" type="radio"/> Schémas	<input type="radio"/> Contrôle bcl de défaut
<input checked="" type="radio"/> Résistance de dispersion de la prise de terre : <u>348</u> Ω		<input type="radio"/> Isolation général : <u>2,6</u> MΩ		<input checked="" type="radio"/> Continuité de terre		<input type="radio"/> Test dispositif diff.	
Le dispositif différentiel général : <input type="radio"/> était plombé <input checked="" type="radio"/> a été plombé <input type="radio"/> n'a pas été plombé <input type="radio"/> ne peut pas être plombé							

Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels : voir au verso)

Infractions Nouvelle installation	/		Infractions Installation existante	/	
<input checked="" type="radio"/> Néant			<input checked="" type="radio"/> Néant		
Remarques	<u>luminaire non placé</u>				Visa GRD ou mandataire

Conclusion(s) :

La nouvelle installation est conforme ~~n'est pas conforme~~ au RGIE.
 L'installation existante est conforme ~~n'est pas conforme~~ au RGIE.

L'installation électrique doit être recontrôlée avant

02/12/15 (*)

par le même organisme de contrôle.

Agent visiteur :

Nom : POSTAL D

Agent n° : 4546

Date 02/12/2015

Pour le Directeur Général : Signature




David POSTAL
n° 4546

- Ce procès verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation.
- Le Service Public Fédéral Economie doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.
- Le contrôle n'a porté que sur les parties visibles et accessibles de l'installation.

Les informations recueillies sur place ne nous permettent pas de déterminer la date de réalisation de l'installation électrique.
 Nous vous invitons à compléter le(s) schéma(s) pour les éléments qui n'étaient pas visibles lors de la visite de contrôle. En cas de doute portant sur la sécurité de ces éléments, nous vous invitons vivement à faire procéder à une visite de contrôle complémentaire.

(*) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite de contrôle doivent être exécutées sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans

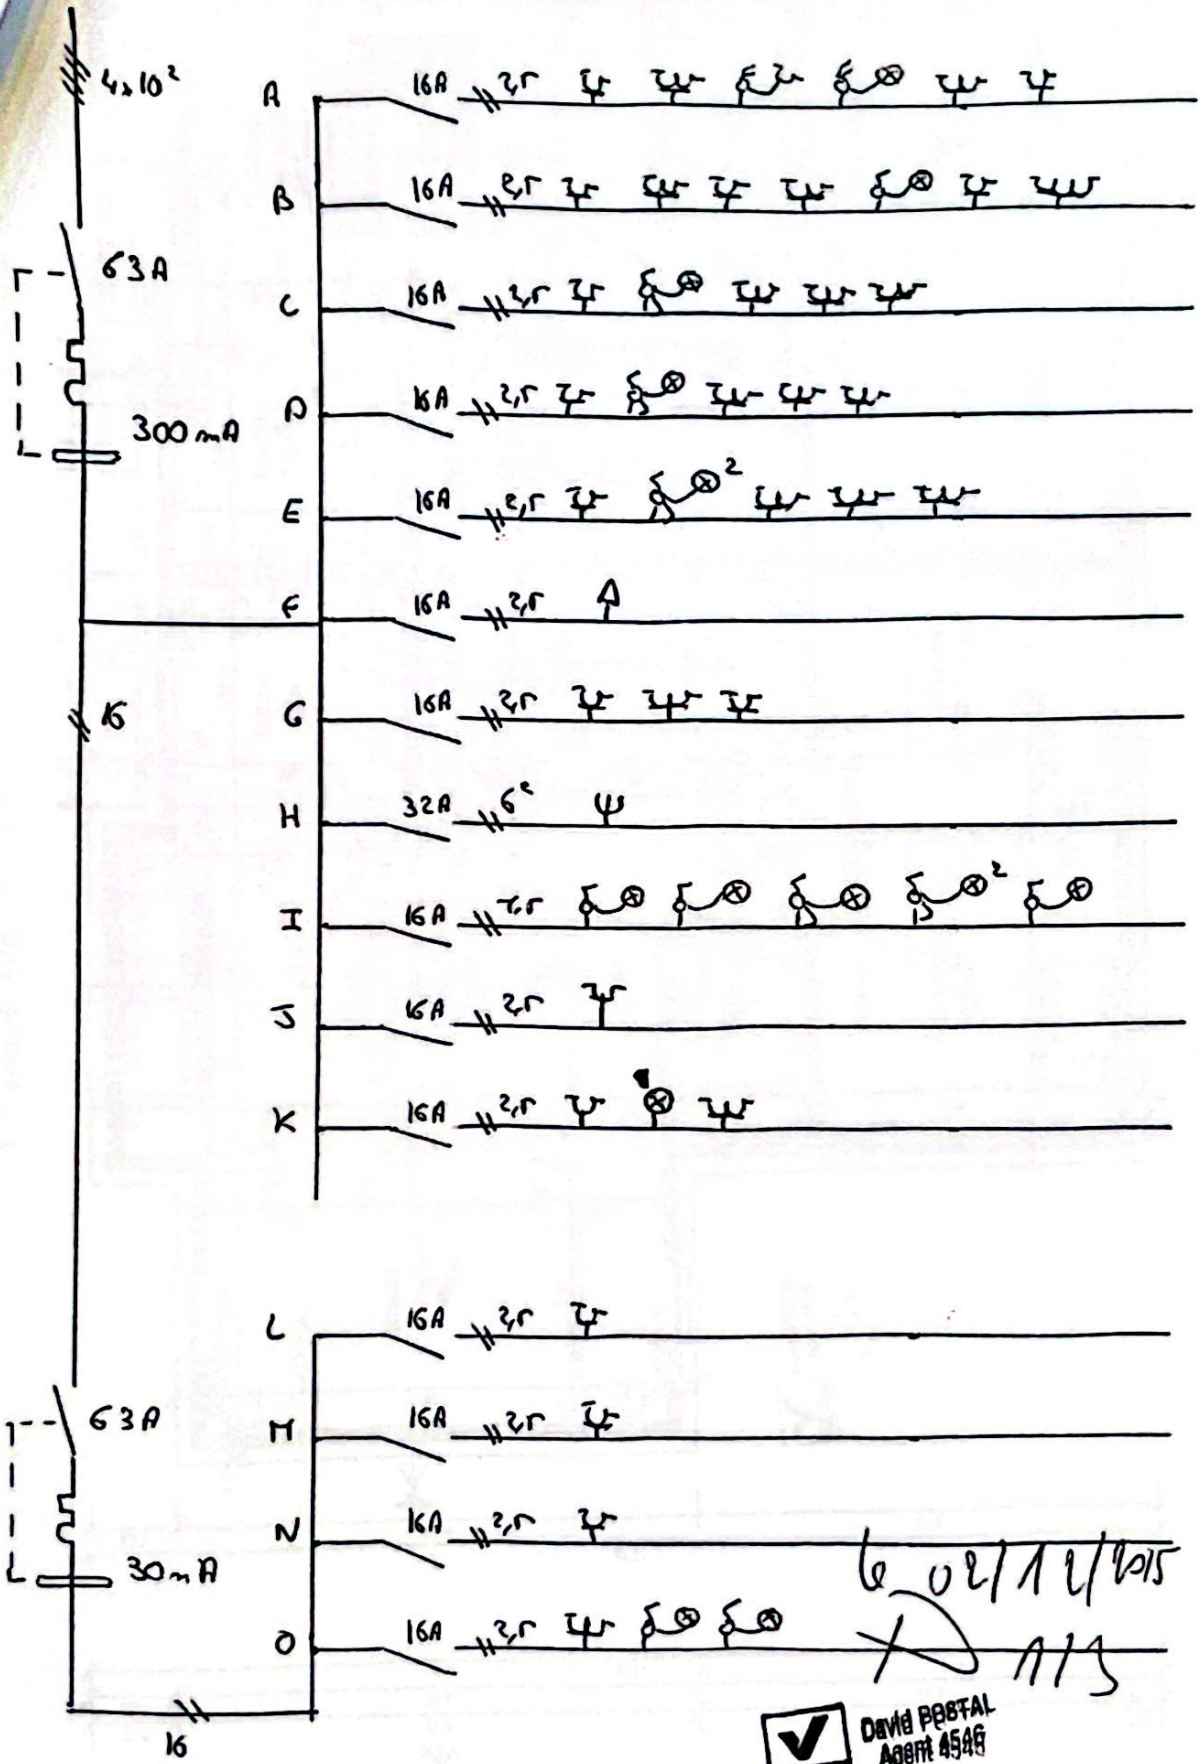

48B 2^e DROIT



David PESTAL
Agent 4546

48 B

COMBLES

48 B

