

l'installation électrique, 2) de noter dans le dossier toute modification apportée à
des personnes, à imputer directement ou indirectement à la présence d'électricité.

NOTE AUX ENTREPRISES : En vertu de l'art. 14 du CODEX, le présent document sera porté à la connaissance du comité.
NOTE AUX LOCATAIRES ET PROPRIETAIRES : Conformément au
Affaires Economiques, direction « énergie électrique » tout accident survenu à

NOTE AUX ENTREPRISES : En vertu de l'art. 14 du CODEX, le présent document sera porté à la connaissance du comité.
NOTE AUX LOCATAIRES ET PROPRIETAIRES : Conformément au
Affaires Economiques, direction « énergie électrique » tout accident survenu à

03/005F/05/13/10D

EAN n° : 339 12350
N° compteur : 001444,7
Index I : 3,3
Index II : 3,3

3490628

| DISTRIBUTEUR | PV vu |
|--------------|-------|
| Nom | |
| Date | |
| Signature | |



Organisme de contrôle a.s.b.l.

PROCES-VERBAL D'INSPECTION D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE - DE CHANTIER - D'UN RACCORDEMENT PROVISOIRE/DEFINITIF RESIDENTIEL

Type d'inspection : examen de conformité avant mise en service / visite de contrôle
suivant : RGIE art. 86 / RGIE art. 87 / RGIE art. 270 / RGIE art. 271 / RGIE art. 276 / RGIE art. 276bis /

Complément au rapport n°

Type d'installation : Nouvelle / Extension / Modification / Provisoire / Existante / Renforcement / Scission du Comptage /
Modification de tension d'alimentation / Vente unité habitation

Type de locaux : Avenue Huart Harmon 153 1030m

Lieu d'inspection :

Propriété de :

Mandant :

Installateur : CORPO SPRL

TVA : 16 Louvain Delivré à : 08.09.2014

Inspecteur : Date d'inspection :

DESCRIPTION

Tension de service : 1 x 230 V 3 x 230 V 3N 400V + N Protection max. : MAX 40A Commutateur; position :

Protection principale : Disj. : Interrupteur / sectionneur : 3

Liaison comptage - coffret de répartition : type de câble : 2x13 nombre de conducteurs : 3 diamètre : 10 mm²

Câble de raccordement au réseau : type de câble : nombre de conducteurs : diamètre : mm²

Réseau aérien / Raccordement souterrain au réseau aérien / Réseau souterrain - Fourreau: présent / absent - Plaque d'isolation: présente / absente

Electrode de terre : Type: boucle / barres / piquets / conducteurs horizontaux Section : mm² Résistance de dispersion : 22 Ω

Nombre de tableaux : 1 Nombre de circuits terminaux : 10 Résistance d'isolement général : 7.1 MΩ

Interrupteur différentiel : Général : 40A 10,3A mA Supplémentaire : mA

Fonctionnement bouton d'essai: en ordre - pas en ordre Contrôle boucle de défaut: en ordre - pas en ordre

L'interrupteur différentiel général a été plombé par des scellés au sigle d'OCB.

Installation exécutée conformément aux schémas: oui-non

Etat du matériel électrique: en ordre - pas en ordre

Protection contre les chocs électriques: contact direct: en ordre - pas en ordre

contact indirect: en ordre - pas en ordre

Continuité PE- et liaison équipotential: en ordre - pas en ordre

Matériel fixe et mobile: en ordre - pas en ordre

Description : voir les schémas en annexe - schéma unifilaire et schéma de position ont été signés pour approbation - appareils

Voir schémas

DETERMINATIONS - NOTE (N) - INFRACTION (I) - Les numéros réfèrent aux infractions standard au verso.

N La liaison équipotentielle principale et supplémentaire n'est / ne sont pas encore raccordées.

N La salle de bains - le(s) compteur(s) d'eau, - de gaz, - le chauffage central - n'est / ne sont pas encore placés.

CONCLUSION

L'installation est conforme / n'est pas conforme aux prescriptions du RGIE.

La visite de contrôle - par le même organisme de contrôle - prévue par l'article 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le 08.09.2014 ainsi qu'avant la mise en service d'une modification / extension importante réalisée avant cette date.

L'installation peut / ne peut pas être mise en service / ne peut rester en service qu'à condition de remédier sans délais aux infractions constatées et que toutes les mesures nécessaires soient prises pour assurer la sécurité des personnes et des biens.


organisme de contrôle
association sans but lucratif
siège régional: dans chaque province

siège social:
Kon. Astridlaan 60
2550 Kontich

Tél. 03 / 451 37 00
Fax 03 / 451 37 10

www.ocb.be
dep.ele@ocb.be

TVA BE 404.312.034
CCP 000-0162392-14
Banque 405-3020501-49

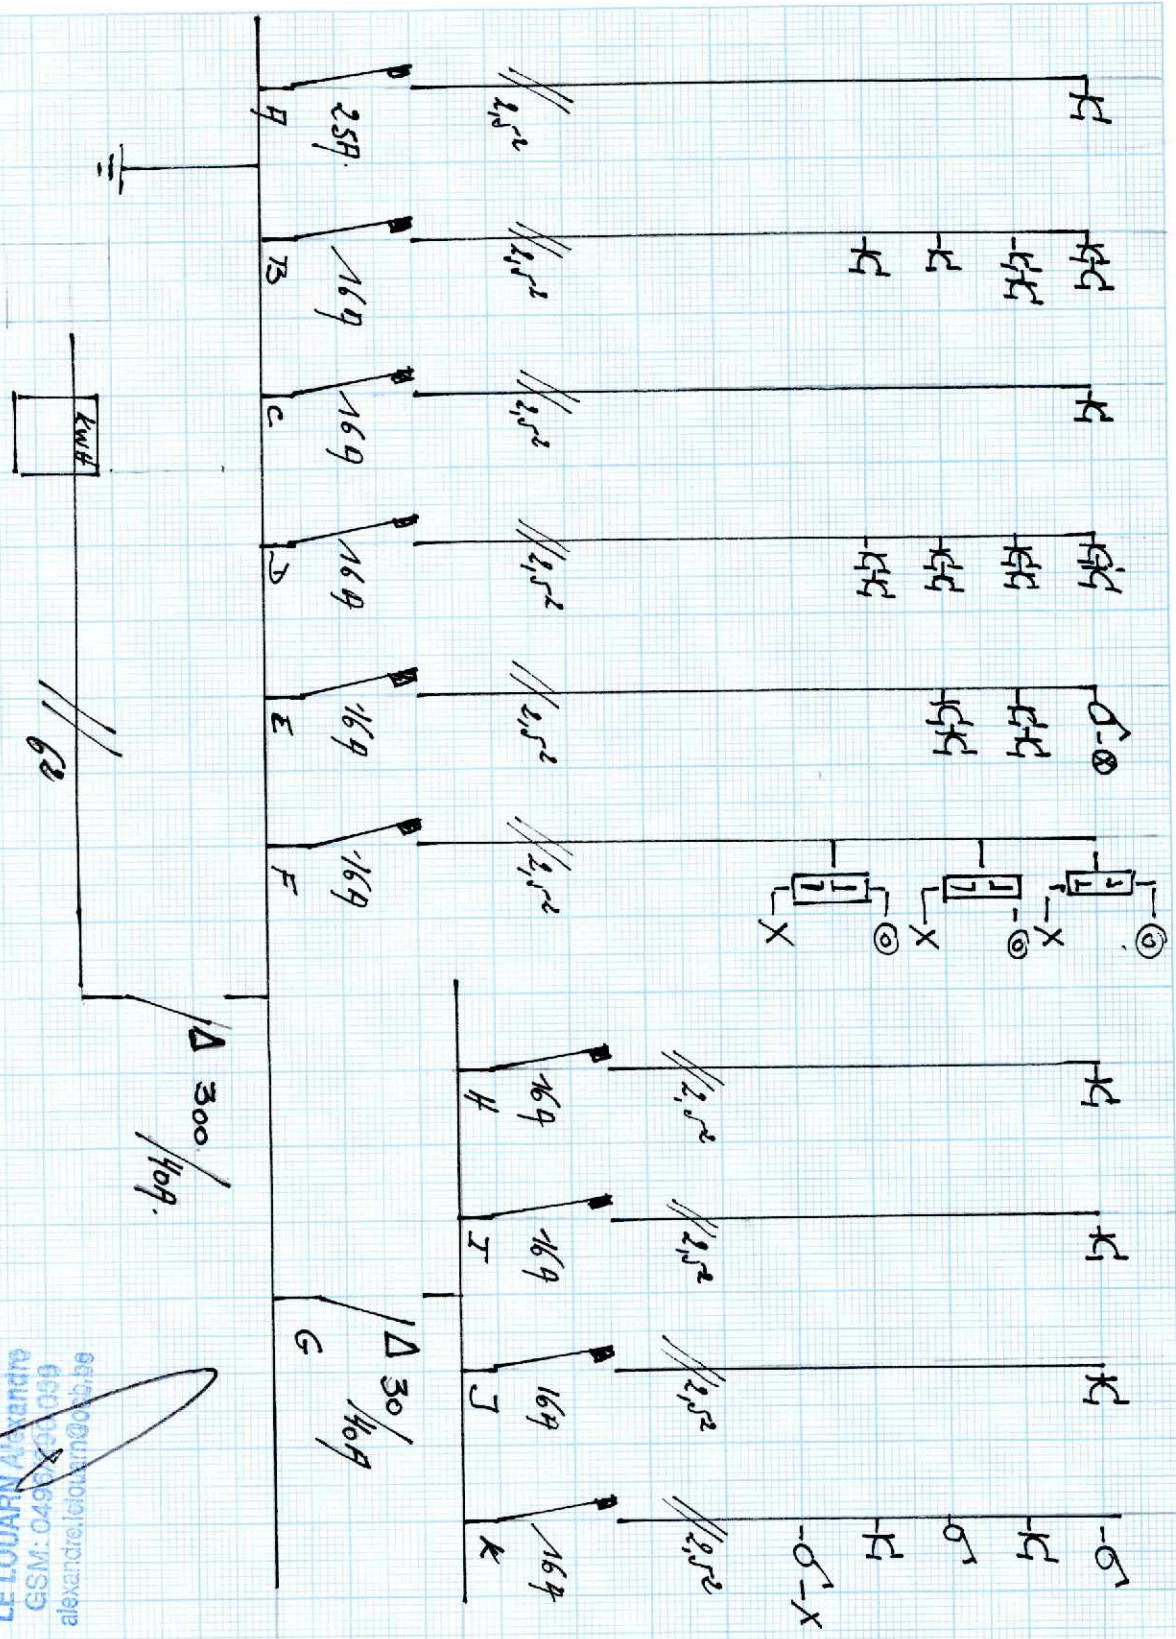

Avenue HUART HANCOIR 153
1030 Brussels

- Appartement 2^{em} Etage

LE LOUARN Alexandre
GSM: 0498 00 00 099
alexandre.lelouarn@bbs.be

