

Teller nr.:
Stand I: Stand II:

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN EEN DEFINITIEVE RESIDENTIELE AANSLUITING

Op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001

Aard van onderzoek	: indienststellingsonderzoek volgens AREI art. 86-270. Nieuwe installatie.	
Type der lokalen	: woning.	
Onderzoeker	: Jurgen Moens	Datum van onderzoek: 18.01.2008.
Plaats van onderzoek	: Florivalstraat 11 te 3040 Ottenburg.	
Eigendom van	: Dhr	
Opdrachtgever	: Dhr.	Lumbeekstraat 61 te 1700 Dilbeek.
Installateur	: Dhr.	, Lumbeekstraat 61 te 1700 Dilbeek.
BTW	: BE 0.748.200.491.	

BESCHRIJVING

Dienstspanning: 1 x 230 V.	Max. beveiliging: 2 x 40 A.
Meter-bordverbinding: VOB 2 x 10 mm ² .	Beveiliging maatschappij:
Aardelektrode: aardlus 10 mm ² Cu + Pb + VOB 16 mm ² .	
Spreadingsweerstand: 3 Ω.	
Aantal borden: 1.	
Aantal eindstroombanen: 21.	
Algemene isolatieweerstand: 0,80 MΩ.	
Beschrijving: zie schema in bijlage.	

Differentieelschakelaar: Alg.: 2p. 40 A 300 mA (type A).
Bijk.: 2p. 40 A 30 mA (type A) (kringen PQIRSTU).

NOTA'S:

De 25S60-tellerkast is gepmlaatst.
De hoofd- en bijkomende equipotentiale verbindingen zijn nog aan te sluiten.
Cv-, aardgas- en waterleidingen zijn nog te plaatsen. De badkamer is niet afgewerkt.


INBREUKEN:

Geen.

BESLUIT:


De installatie is conform met het AREI.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.
De eendraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 18.01.2033, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag in dienst gesteld worden.

Voor de directeur
de onderzoeker




Jurgen MOENS
Kruiskouterstraat 59
O.C.B. 1750 Lennik
☎ 02/269.07.07 ☎ 0475/45.23.82


CHEMIA'S WERF LEROIURE TE OTTENBORG.

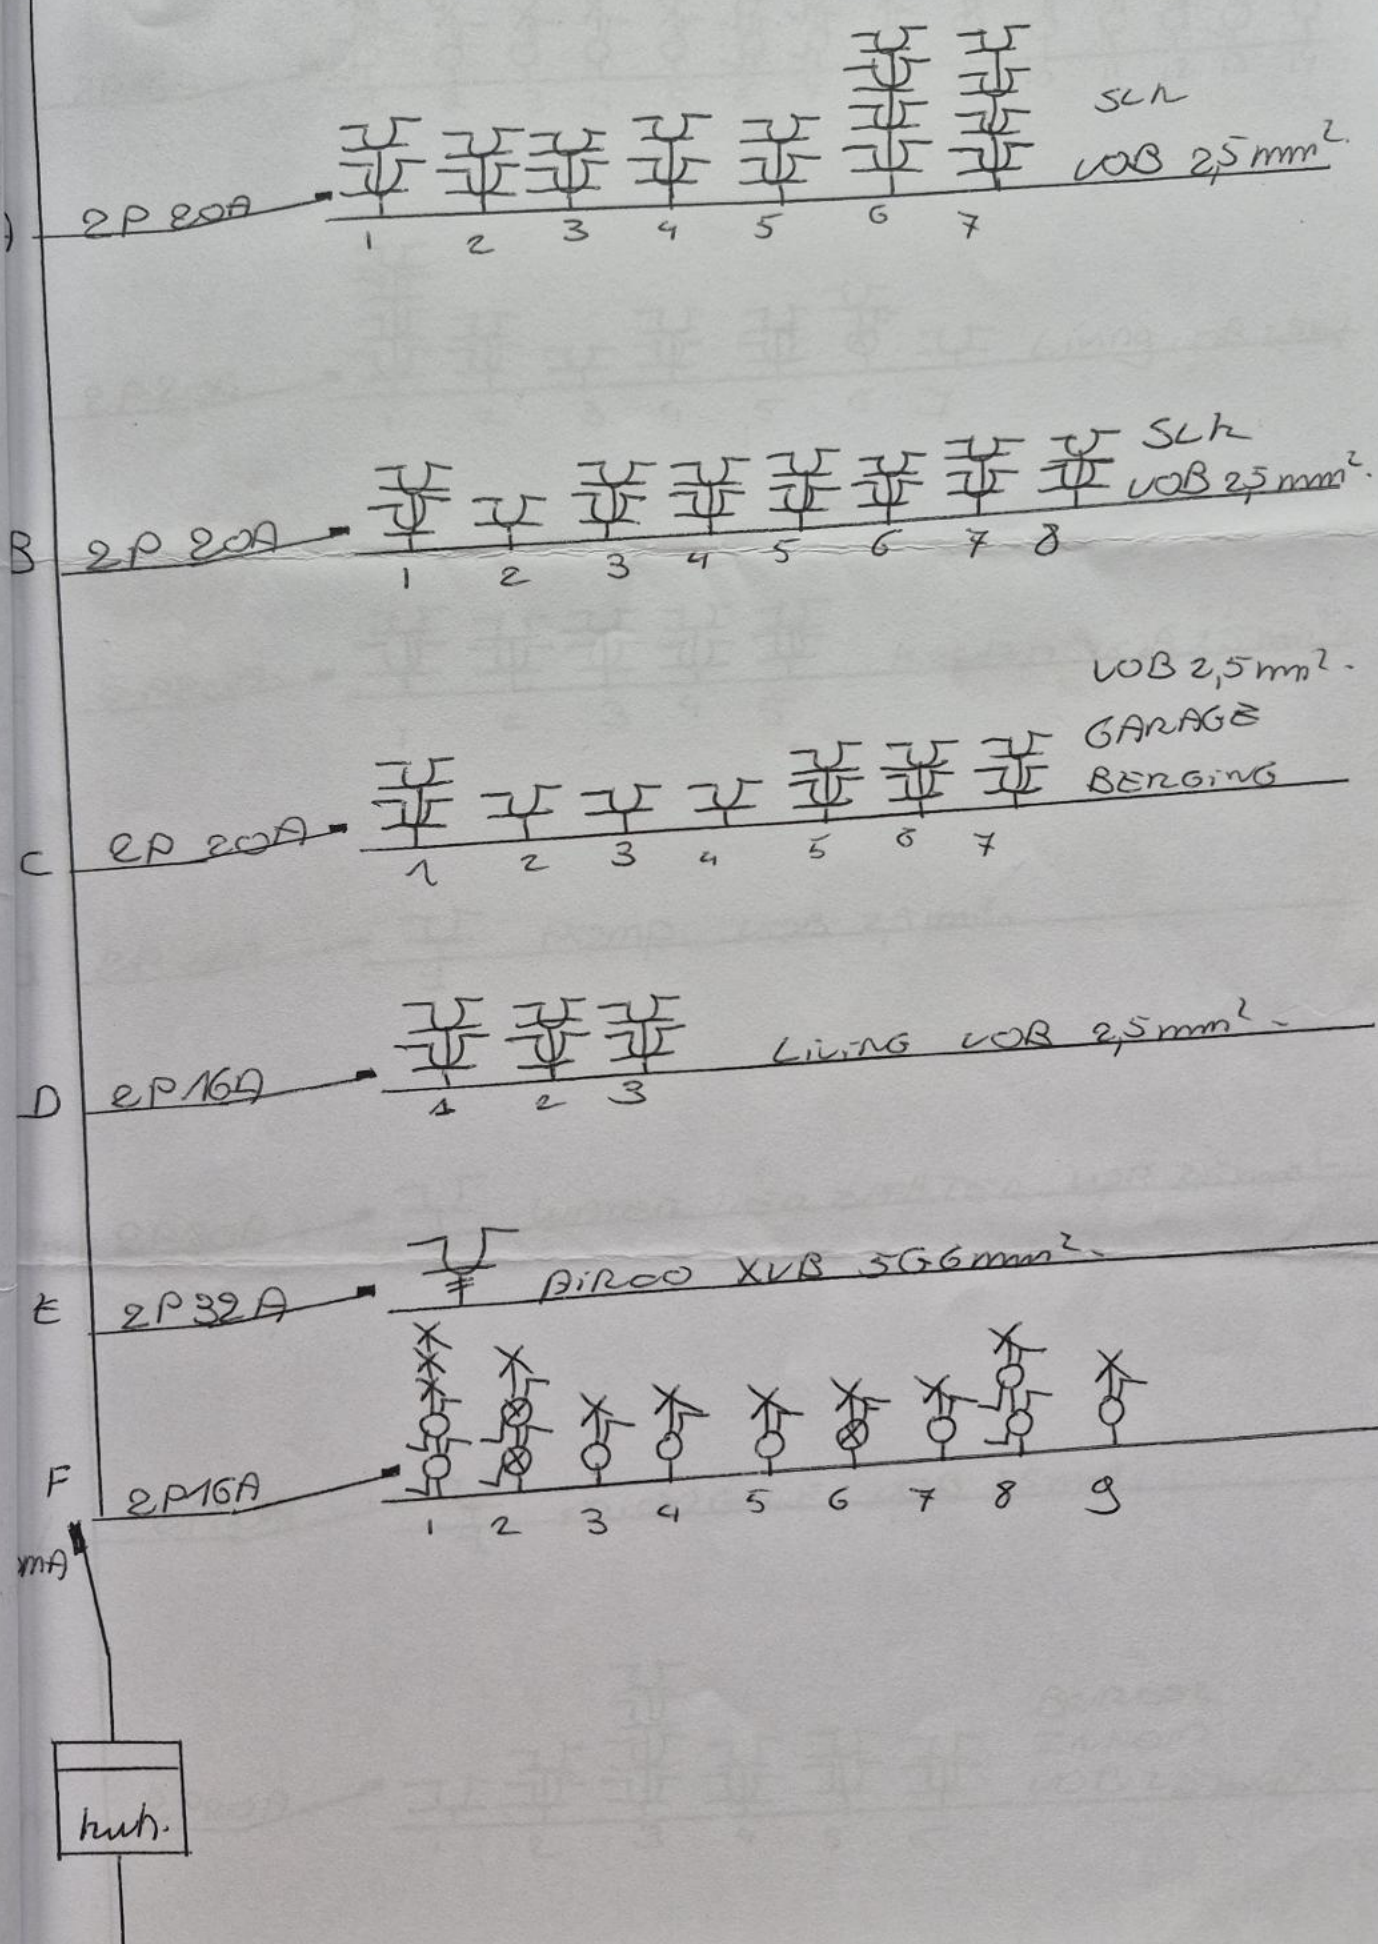


2P16A




2P20A




2P20A




2P16A




2P20A




2P20A





2P20A



M 2P20A  hecten WOB 2,5mm²

N 2P16A  CU WOB 2,5mm²

O 2P32A  KCOH-PLAAT XVB 5G6mm²

P 2P32A  STOOMOLEN XVB 5G6mm²


Q 2P20A $\frac{U}{1}$ LAB LOS 2.5mm²

R 2P20A $\frac{U}{1}$ DRUG LOS 2.5mm²


Δ30mA
63A 2P

S 2P20A $\frac{X}{0}$ $\frac{U}{1}$ $\frac{U}{2}$ $\frac{U}{3}$ BAD
1 2 3 - LOS 2.5mm²

T 2P20A $\frac{U}{1}$ LAS LOS 2.5mm²



**ALLE STOPKONTAKTEN NAAST ELKAAR
TE PLAATSEN (en niet onder elkaar!!)**

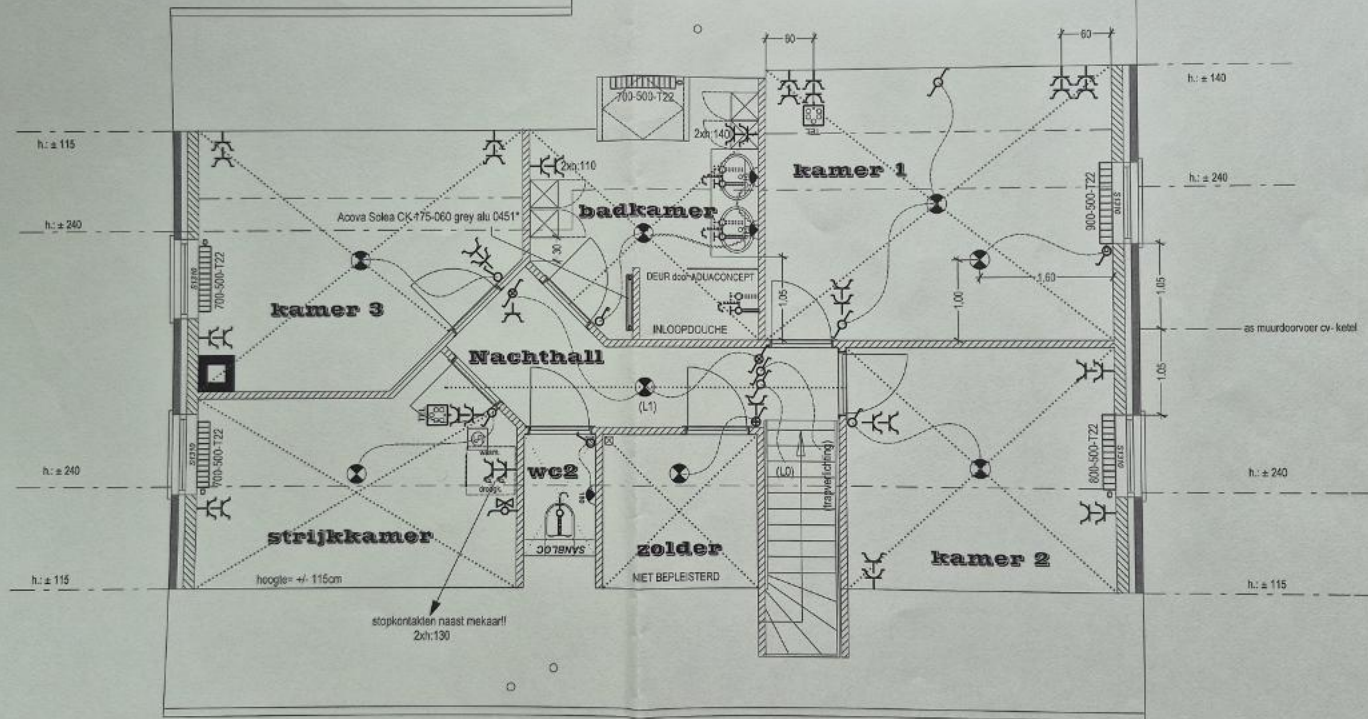



tuinverlichting h:-10
 tuinhuis h:-10 zonder schakelaar

Nota elektriciteit: de aansluiting van de woning op het elektrische netwerk, ondergronds langs de kant van de woning, is door BIK te voorzien.

regenwater

Opgelast: oven aan te sluiten op een 3N AC 400V volgens technische fiche daarvan.
 Aanvraag voor een 3-fasige aansluiting 400V+N is vertrokken naar de stroomleverancier.

Nota ijm slooterven:
 * water/water/koud water
 * met schroefdraad diameter 3/4"

waterschroefbus: diameter 2,1cm naar afvoer spoelbak
 Let op!
 * temperatuur van afgevoerd water= 80°C

get dempkip is door keukeninstallateur

ACV- gasketel met muurdoorvoer
 Delta Performance 35 SV
 Met geïntegreerd warmwaterproductiesysteem
 (29/1, 70/50°C) en 11044L per uur !!
 Geraapte boiler model !!
 Nota cv-installatie: verlengde doorvoer cv-ketel voorzien

+ 1 GESCHIEDEN REGENWATERNET
 (2x buitenkraan, uitgebak)

keuken

berging
 NIET BEPLEISTERO

garage
 NIET BEPLEISTERO

keels
 berg
 NIET BEPLEISTERO

hall

living

bureau

wel

Indien TV en telefoon door telerieken aan te sluiten zijn, worden de bevestigingen aan door telerieken-voorzien!!

Nota ijm keuken: het ons toegestuurde keukenplan dient volledig te zijn. Indien niet alle maten voor het plaatsen van de verschillende voedingen in de keukens zijn aangeduid, zullen de door BIK voorgestelde maten uitgevoerd worden, tenzij anders door de klant aangeduid.
 BIK is niet aansprakelijk bij foutieve plaatsingen. Alle kosten ten gevolge van het aanpassen van de geplaatste voedingen zijn ten laste van de klant.

Opgelast trapverlichting: orientatieverlichting (LED's, kleur: blauw).
 Daar de trap na plaatsing elektriciteit geplaatst wordt, dient de elektriker op de werf terug te komen om de LED's beter te positioneren+ te verdelen.
 Posities+ aantal zoals op dit plan tenzij anders door de klant aangeduid!
 LED's zijn door BIK te leveren en te plaatsen tenzij anders door de klant aangeduid!

Nota ijm installatie bewegingsmelder: indien een beweging gedetecteerd wordt en/of als de lichtsterkte onder de vooraf opgestelde drempel zakt, gaat de bewegingsmelder de daarop aangesloten lampen branden, die blijven branden tijdens een installatie vertragingstijd.

Algemene OPMERKING elektrische installatie:

ALLE STOPKONTAKTEN NAAST ELKAAR
 TE PLAATSEN (en niet onder elkaar!!)
