

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

NIET CONFORM

Datum keuring: 24/11/2025

Inspecteur: Thibault Vanhoutte

Mentor:

Installateur: -

ID-label:

Klantreferentie:

B.T.W. nr.:-

Merk en type meettoestel: Metrel
Eurotest ET61557

Serienummer: 19481279

Datum verslag: 24/11/2025

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Sint-Joannes Berchmansstraat
Huisnummer 48
Busnummer
Postcode 2170
Gemeente MERKSEM
Land België

Eigenaar

Naam Ponsaert Mellissa
Straatnaam Sint-Joannes Berchmansstraat
Huisnummer 48
Busnummer
Postcode 2170
Gemeente MERKSEM
Land België

Installateur

Naam -
BTW nr. -
Telefoonnummer -
E-mail -

Type : woning

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

EAN : 541448820046288866

Teller Nr.: 1SAG1200170779



Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS

Aantal borden: 1

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3.

Spanning: 1~230V

Aantal kringen: 15

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Ri algemeen: 5.25 MΩ

RE: 11.58 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

$I\Delta$ (mA)	I_n (A)	I_n - andere (A)	$I_{\Delta t}$	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	15	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	5	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
2	C	16		2	1,5
2	C	16		2	2,5
1	C	6		2	2,5
8	C	20		2	2,5
1	C	32		2	10
1	C	32	Intern	2	10

Visueel nazicht (algemeen)	NOK	Directe aanraking	NOK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	NOK	schema in bijlage door Aceg vzw	OK		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	NOK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	NVT		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

I1.02 Eëndraadschema van de installatie komt niet overeen met de werkelijkheid. (Boek 1 Afdeling 2.12 - 2.13 en 3.1.2)	Kring stopcontacten kelder
I1.04 Situatieschema van de installatie komt niet overeen met de werkelijkheid. (Boek 1 Afdeling 2.12 - 2.13 en 3.1.2)	Stopcontacten kelder
I1.06 De gebruikte symbolen op het eendraadsschema en/of situatieplan stemmen niet overeen met deze opgenomen in tabel 2.23. (Boek 1 onderafdeling 3.1.2.1.a)	Kinderveiligheden
I9.04 De verbindingen dienen verwezenlijkt te worden in borden, verbindings- of aftakdozen, aan de klemmen van schakelaars, contactdozen of verlichtingsarmaturen. (Boek 1 Onderafdeling 5.2.6.1.)	Boven badkamermeubel
N3 Het is niet uitgesloten dat bij een nacontrole bijkomende inbreuken worden vastgesteld bij voorleggen schema's.	
N37 Aanvang installatie dateert van voor 01/06/2020	

BESLUIT



De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór 24/11/2026. De werken, nodig om de tijdens het controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging worden uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen.

Voor huishoudelijke installaties wordt bovendien:

- het nazicht op de verdwijning van de inbreuken verricht door het erkend organisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd
- de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, binnen een termijn van één jaar door het erkend organisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd, ingelicht van het bestaan van inbreuken ingeval geen gevolg wordt gegeven aan het in orde brengen van de installatie.


Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 12:18 tot 13:19

De inspecteur Thibault Vanhoutte




Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtestreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.


Kwaliteit
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die niet conform is:		
Stap 1	Stap 2	Stap 3
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig zorg ervoor dat alle inbreuken worden opgelost en besteed voldoende aandacht aan de eventuele nota's.	Als alle inbreuken zijn verholpen neem terug contact op met ACEG of met uw keurder van ACEG en maak een nieuwe afspraak.	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen en staat u bij als er iets niet duidelijk is.

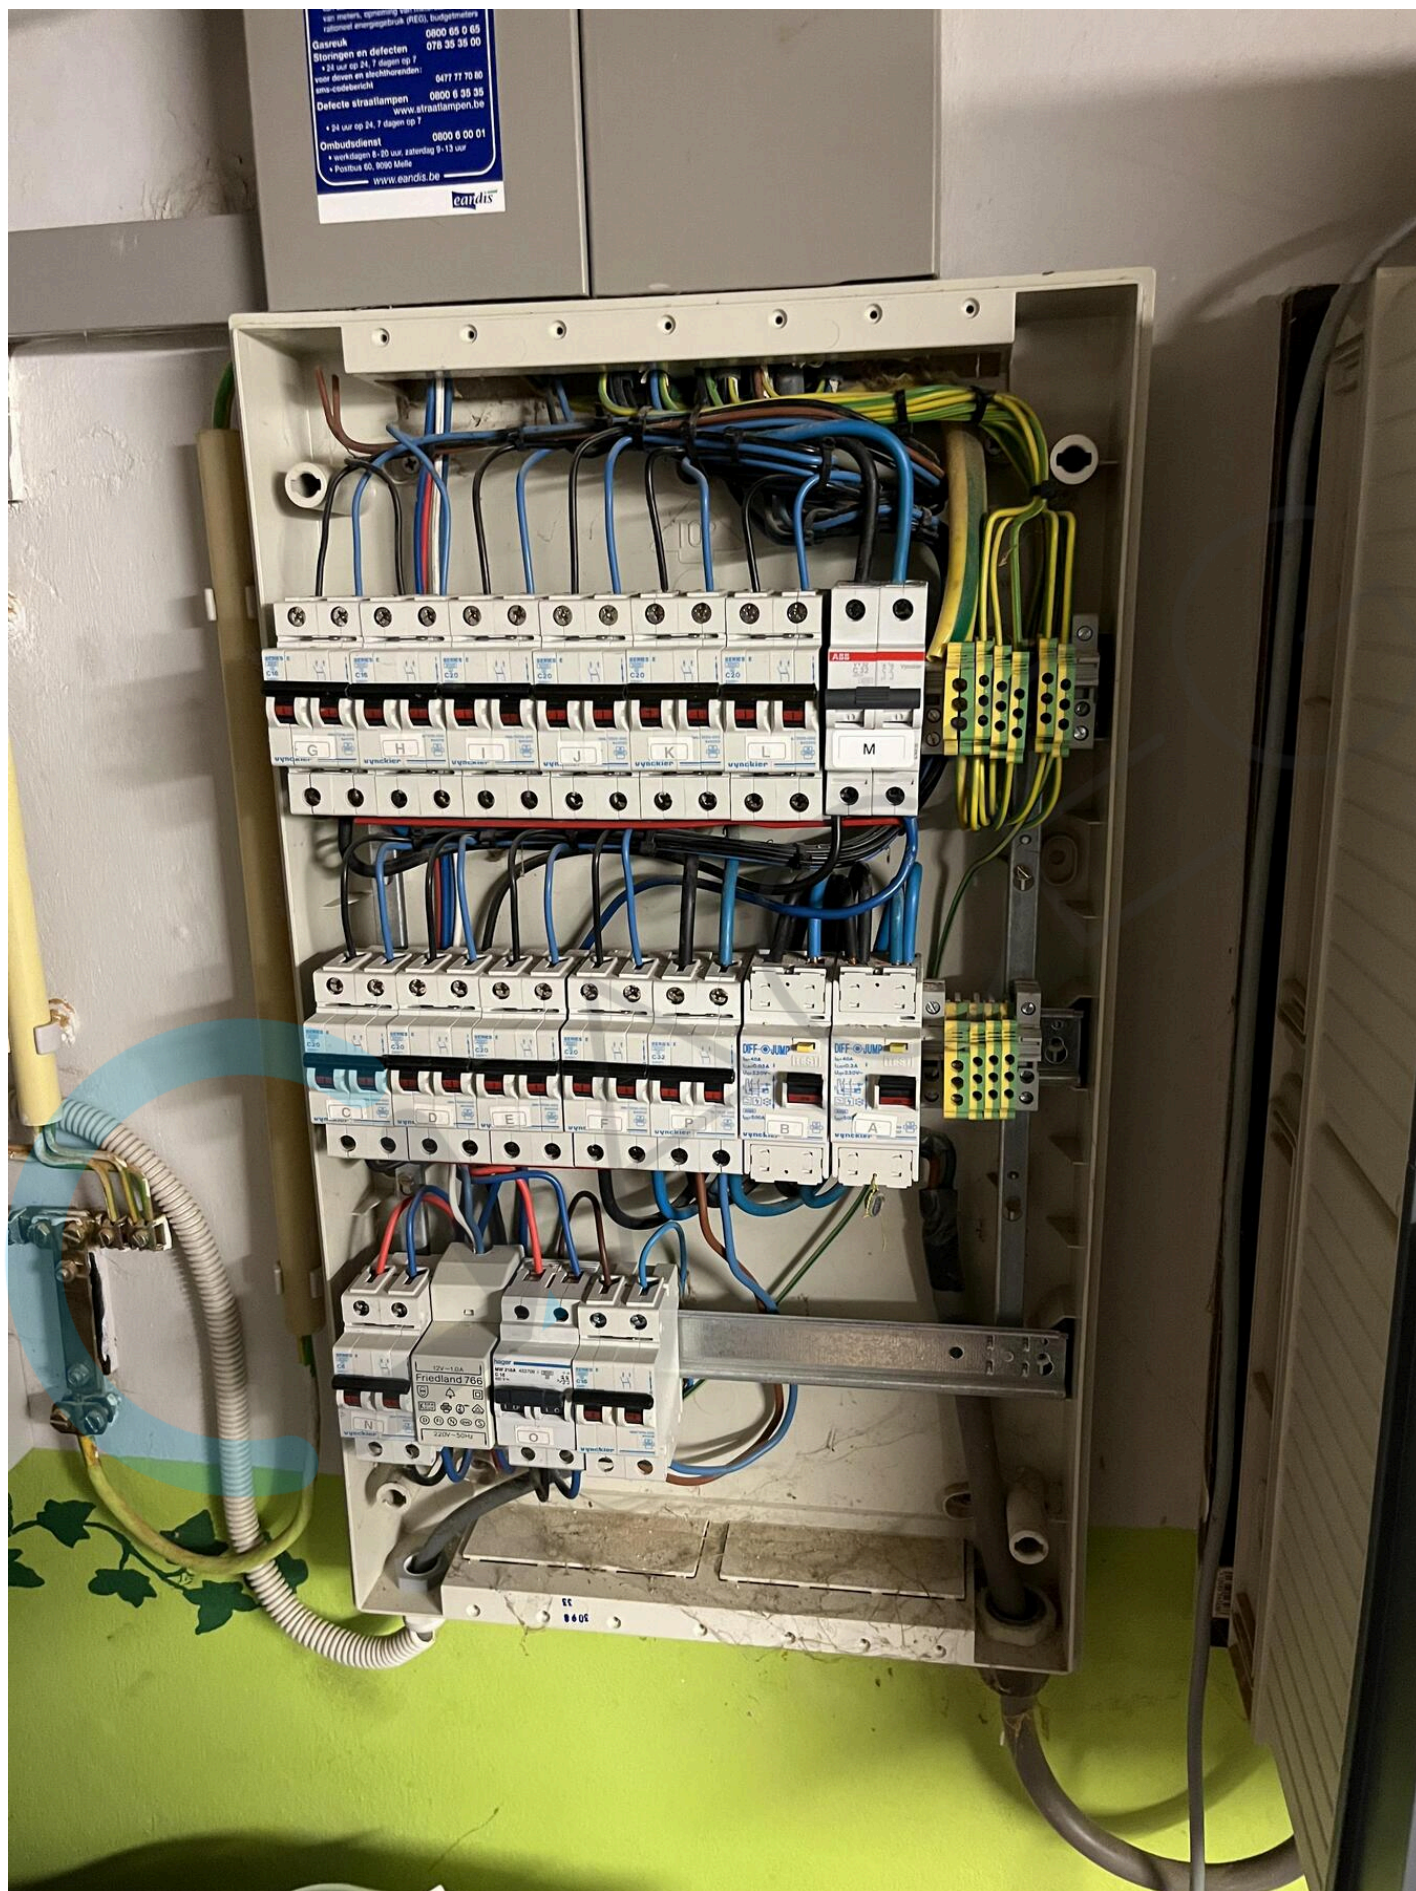


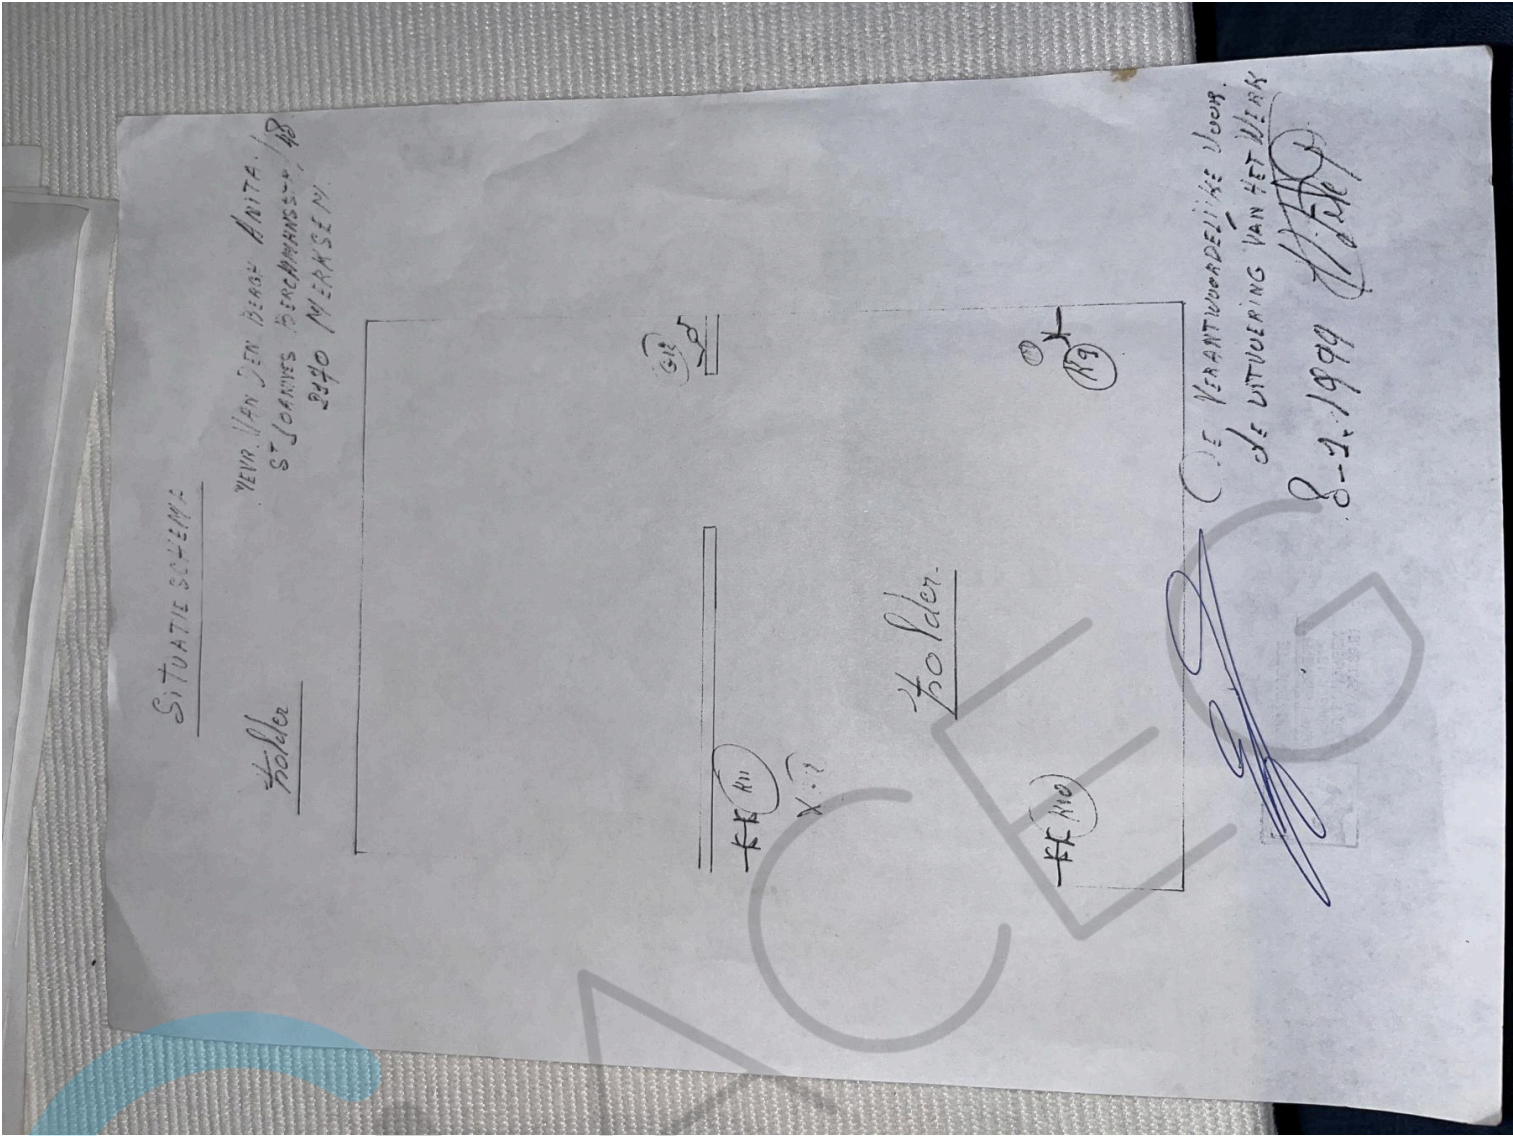

SITUATIE SCHEMA.

MEER VAN DEN BERGH HOUTA.
ST JOHANNES BAPTISTASSTR. 1138
2140 MIERHUSEN

BESTAANDE KEIDER.

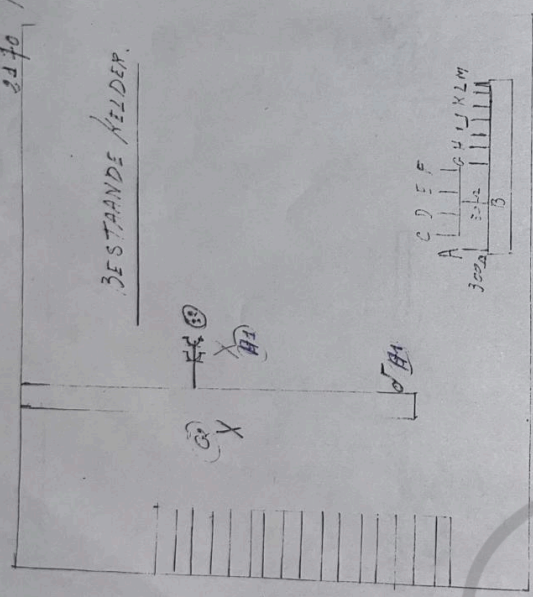

DE VERANTWOORDELIJKE VOOR
DE UITVOERING VAN HET WERK

[Handwritten signature]


8.1.1999
[Handwritten signature]

ABR. WILKOTTE
WILKOTTE CONSULTANTS
2107 BOERENWEG
TEL. 03 / 321 3261

SITUATIE SCHEMA

MEER VAN DEN BERGH ANITA
ST JOANNES BERCHMANSSTRAAT 108
8140 MIERHSEM.

2de VERDIEP.

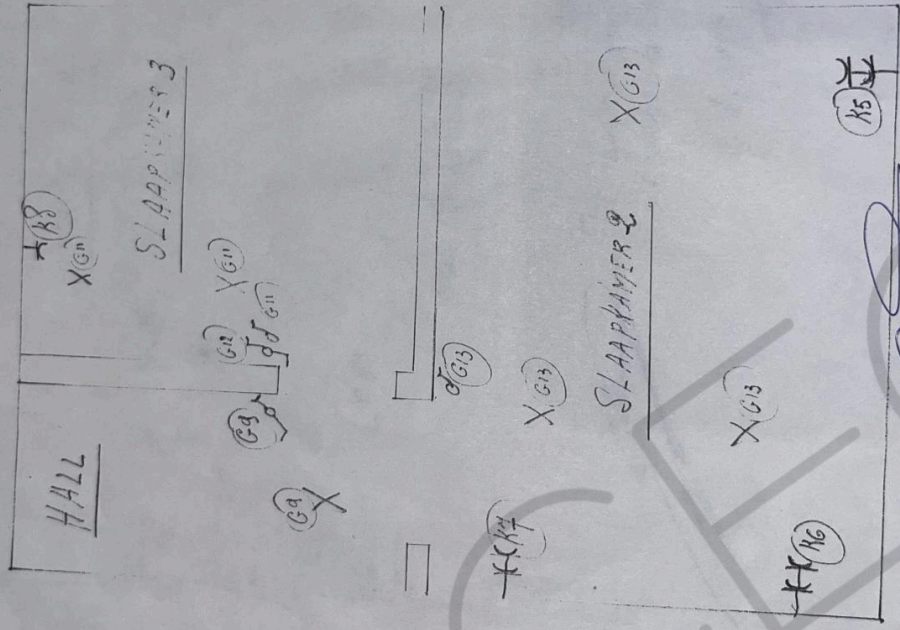


DE VERANTWOORDELIJKE VOOR
DE UITVOERING VAN HET VERK.
2-4-1999 J. J. J.

SITUATIE SCHEMA

1ste VERDIEP

MEUR VAN DEN BERGH AVITA
SILVANOES, BERTH VANSTRA, J.B.
2140 MENSSEM

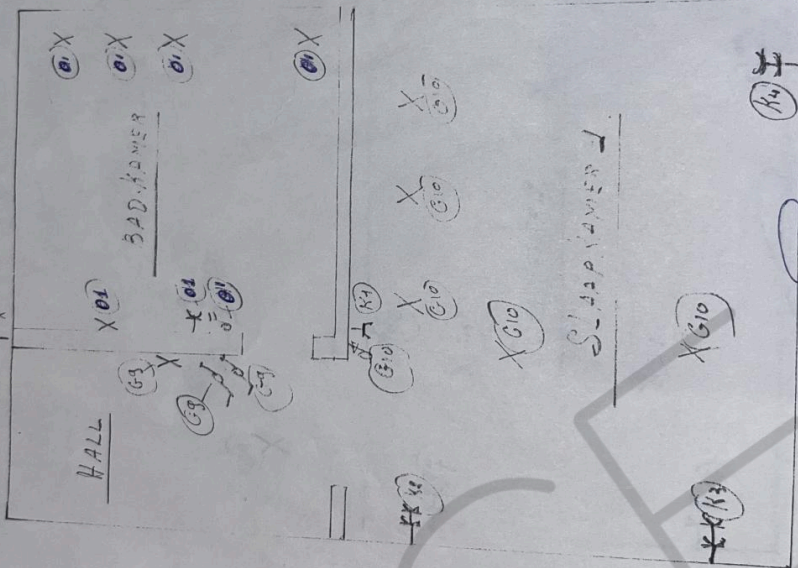


DE VERANTWOORDELIJKE VOOR
DE UITVOERING VAN HET WERK
D. J. 1999. J. J. J.

ARTSMA & CO
WATER EN VERBODEN
KUNSTEN 131
2140 MENSSEM
TEL. 020 21 21 21

SITUATIESCHEMEN

GELEI KVLOERS

MEER VAN DEN BEECH HOUT
ST JOHANNES BERGWERK 148
2400. MERKSEH

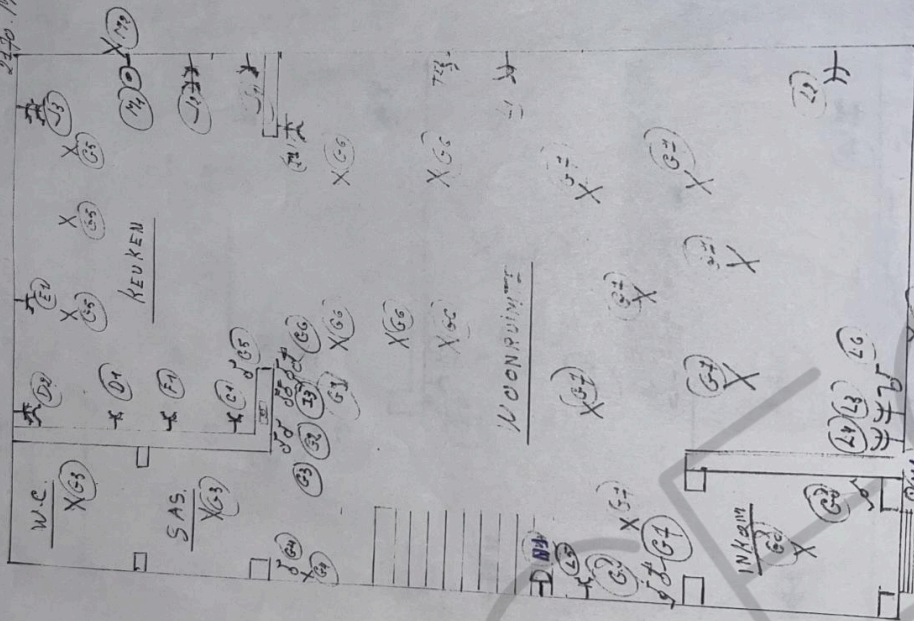

DE VERANTWOORDELIJKE
VOOR DE UITVOERING VAN
HET WERK

1-1-1994

