



J. VAN HEMELEN
KEURINGSORGANISME VZW

Externe Dienst voor Technische Controles

☑ Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG
tel 02/380.52.71 - fax 02/380.89.86

☐ Meensestraat 41 - 8500 KORTRIJK
tel 056/35.76.76 - fax 056/35.68.87

e-mail info@vanhemelen.org
BTW BE 0422.507.353

Aanvraagnr. 09A0014

Ref. verslag RAP EH/20090703-6D

Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

- ☑ Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (nieuw - wijziging - uitbreiding) (AREI art. 270)
- ☐ Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271)
- ☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwarende van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 275)
- ☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie bij de verkoop van een wooneenheid (AREI art. 276bis)

Eigenaar/beheerder/uitbater - Naam VERIM Voornaam Postnr 8370

Adres J. DE TROOZLAAN 83-87 Gemeente BLANKENBERGE

Installateur SMET BVBA Gemeente BEVEREN

BTW-nummer BE- 0473782642

of identiteitskaartnr. - Uitreikingsdatum - / - / Gemeente

Plaats van onderzoek RES. IRIS APP 5.1 Postnr. 8370

Adres J. DE TROOZLAAN 83 -87 Gemeente BLANKENBERGE

AN-code Elektriciteitsverdelers netmanagement

Type installatie ☐ tijdelijke installatie / voorlopige aansluiting voor werf / festiviteiten ☑ wooneenheid (huis, appartement, andere) ☐ huishoudelijke werkeenheden ☐ gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid

Algemene beschrijving van de aansluiting Algemene beschrijving van de stroombanen en hun beschermingen

U_{nom} (V ac/dc) 2X230V 2 x2P-AUTOM 16A - 1.5 mm²

Ø voedingskabel (mm²) 4x10 mm² 15 x2P-AUTOM 20A - 2.5 mm²

I_{nom} aansluiting (A) 63A 1 x2P-AUTOM 25A - 8 mm²

Type alg. schakelaar DIFF

Aantal borden 1

Aantal eindstroombanen 18

Type aardelektrode LUS

Algemene diff.stroom.inr. 63/0.3A

Bijkomende diff.stroom.inr. 63/0.03A

Vaste verwarmingstoestellen (aantal - kW) :

Metingen Meetapparaat : apparaat waarvan de inspecteur titulaires is Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig : procedure TD-E-01

Aardspreidingsweerstand : 1.56 Ω Isolatiweerstand (250/500/1000V) : 5 MΩ Werking differentieelstroominrichting : OK / NOK Continuïteit PE-geleiders & equipot. : OK / NOK

Opmerkingen (AREI - art.) / Bemerkingen (opm.)

GEEN

Opm. cv installatie is niet afgewerkt

Verlichtingstoestellen en badmeubels niet aanwezig

☐ Aanvullend bezoek bij onderzoek (ref.) : RAP - / -

Besluit

☑ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I.

De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) eendraads- en opstellingsschema(s) werden voor gezien getekend / werden opnieuw geïllustreerd.

De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. (art. 271)

☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het A.R.E.I.

De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.

Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór : - / -

Volgend controlebezoek uiterlijk op: 03/07/2034

Agent-onderzoeker (naam - nr - handtekening) HUS ERIC (24)


Datum onderzoek: 03/07/2009

Wettelijke verplichtingen, nota's en algemene voorwaarden op keerzijde.

5.1 duplex

Eendraadsschema/Schéma unifilaire

INSTALLATEUR		KEURING/CONTROLE		WERF/CHANTIER		1N, 1400V/230V~	
Naam/Voorn	Leon Smeit	Organs.	J. Van Hoorick	Naam/Voorn	Verlin		
BTW / TVA	BE 473.782.642	Naam/Voorn	Enli Huz	Straat/Rue	J. de Troostaan		
Datum/Dat	08-07-2009	Datum/Dat		Gemeent/Comm	Blinthange		
Handte/Sign		Handte/Sign		Handte/Sign			

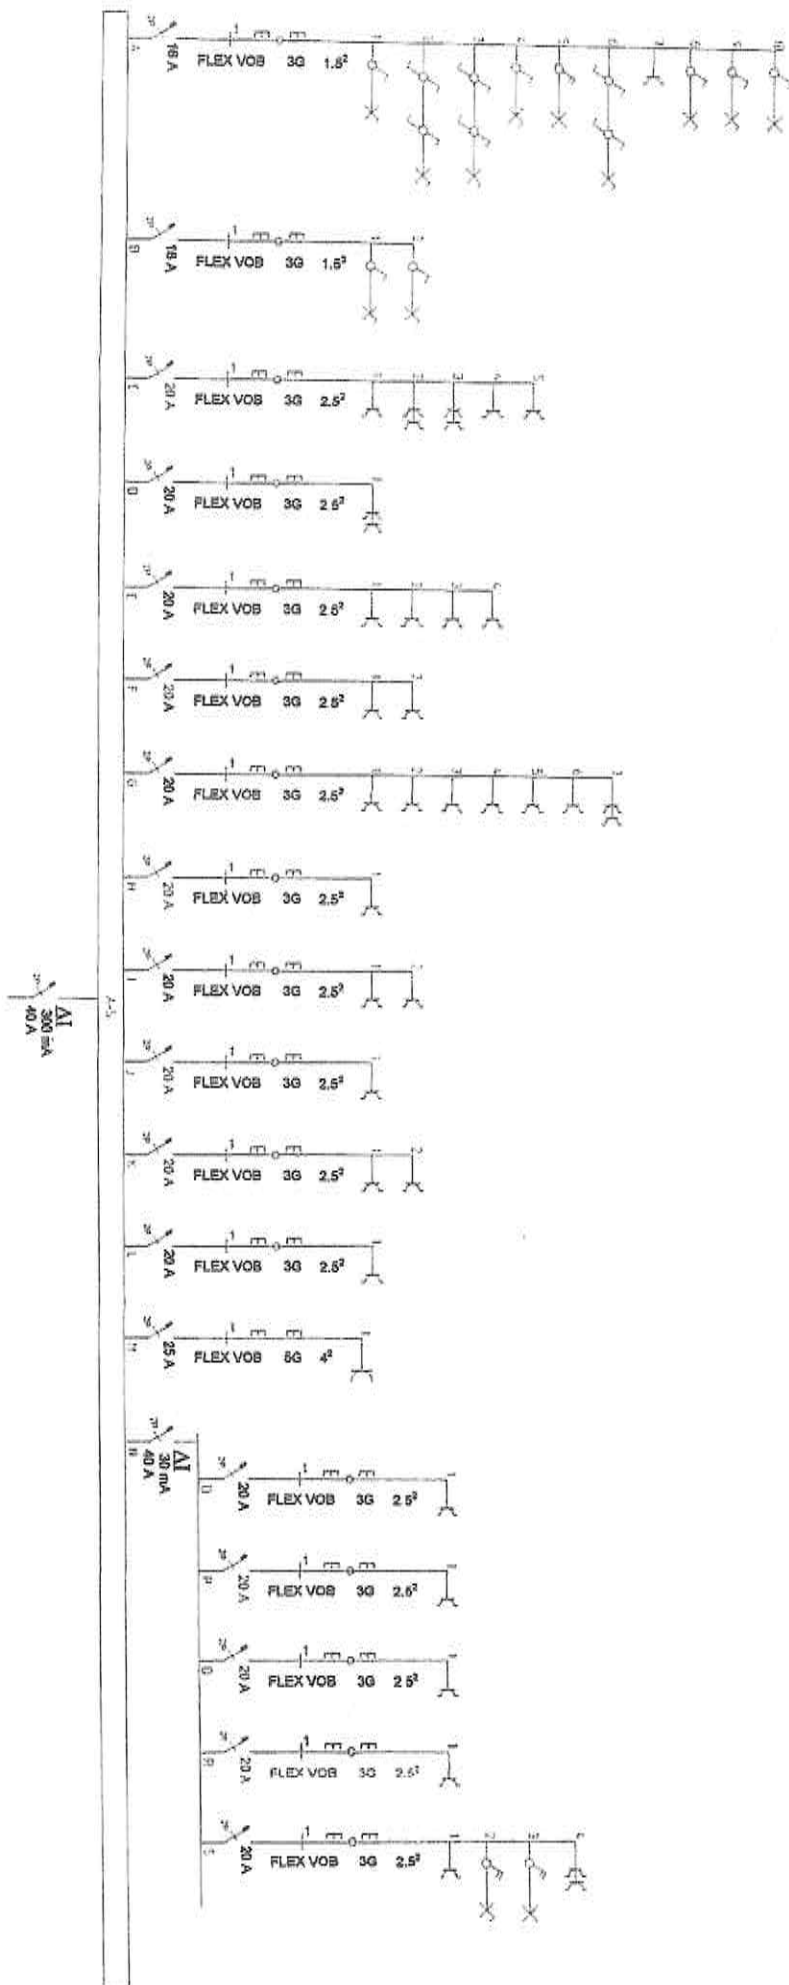

INSTALLATEUR		KEURING/CONTROLE		WERF/CHANTIER		1N, (400V)/230V~
Naam/Nom	Leon Smet	Organis.	J. Van Hemelen	Naam/Nom	Verm	FIX-O-CAD 
BTW / TVA	BE 473.782.642	Naam/Nom	Erik Hus	Straat/Rue	J. de Troozlaan	
Datum/Date	08-07-2009	Datum/Date		Gemeen/Comm	Blankert	
Handtek/Sign		Handtek/Sign		Handtek/Sign		

