

payé le 6/8/2011.
port 003-4858424-20
indivision

volable 25 ans.

D.V.S ELECT

BVBA/sprl

Madame Vanneste
Rue Basse Hollande 19

1460 ITTRE

1 page pte
indivision
en
ordre

Keerbergen, le 9 juin 2011


Madame,

En annexe vous trouverez le rapport de contrôle.

Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Nous vous prions de croire, Madame, à l'assurance de nos sentiments distingués.

Jean-Pierre DURIEUX



Bakestraat, 103
3140 KEERBERGEN
Tél.015/64.01.02
Fax015/64.01.03
Adresse E-mail DVS.ELECT@SKYNET.BE

T.V.A/B.T.W. BE 442.738.979
RCL/HRL 78889
Banque/Bank "DEXIA"
BE47 0682 4217 5580



Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller

N° comp

84258979

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 800745

EAAN
code :

Aard onderzoek : AREI	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	IT	Voorsch. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle : RGIE	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle :

RW8 CARDINAL LAVERGIER 4/100 BXL

Eigenaar

Propriétaire :

VANNESTE

Adres :

Adresse :

Installateur :

DVS ELECT

BTW / TVA :

0442 738 978

Datum van het onderzoek :

Date du contrôle :

17/4/11

Ik. / C.I. :

Provincie

Onderzoek / Contrôle : ☐ Woning / maison ☐ Appart.

Spanning : 230V	Meter / bord verbinding : 240	Max. beveiliging : 40A
Tension :	Liaison compteur-tableau :	Protection max. :

Aardelektrode : 3A1mm	Isolatie : 77	Mohm	Aantal verdeelborden : 2
Electrode de terre :	Ohm	Isolément :	Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : 6		TestΔIn		1.ΔIn		AREI / RGIE		
In (A)	Δ In (mA)	type	Nombre des circuits terminaux :		OK	NOK	OK	NOK	270	271bis	278
60	300	A	A - F		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
60	30	A	A - F		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK direkte aanraking : OK NOK
Contrôle visuel : générale : ☒ ☐ contact direct : ☒ ☐

Indirecte aanraking : OK NOK
Contact indirect : ☒ ☐

Aansluitingen : OK ☒ NOK ☐
Raccordements :

Potentiaalvereffeningen : OK ☒ NOK ☐
Liaisons equipotentielles :

Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen / Remarques :

16/11/11

VISUM :

Datum/date :

Besluit / Conclusion

De installatie is ~~niet~~ conform met het AREI
en mag ~~niet~~ ~~tijdelijk~~ in dienst gesteld worden — in dienst blijven.
L'installation est ~~niet~~ ~~temporaire~~ conforme au RGIE
et peut ~~ne pas~~ ~~temporairement~~ être mise en service — rester en service.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Het éénadraderschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en
stemmen overeen met de installatie.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont
conforme avec l'installation.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken
te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen
gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk 1 jaar na keuringsdatum.
Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être
exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne
constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouvelle visite au plus tard un an après la date de contrôle.

Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : 17/4/2016
La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :
Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.L. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.
La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.


voor de directeur, de Inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur :

Niet conform		Conform		N° vorig rapport
276bis AK	274 AK	276bis HK	274 HK	 /
☐	☐	☐	☐	 /
271 AK	☐	271 HK	☐	 /
276 AK	☐	271 HK	☐	 /

ELECTRO-TEST
DIA PROVINCIEEL
Inspecteur
Gen +32 47 289 04 88

NOTE : a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier de l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'Enquête dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et/ou, directement ou indirectement, à la présence d'électricité; d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

PLAN UNIFILAIRE appart.de M.Vanneste Caro

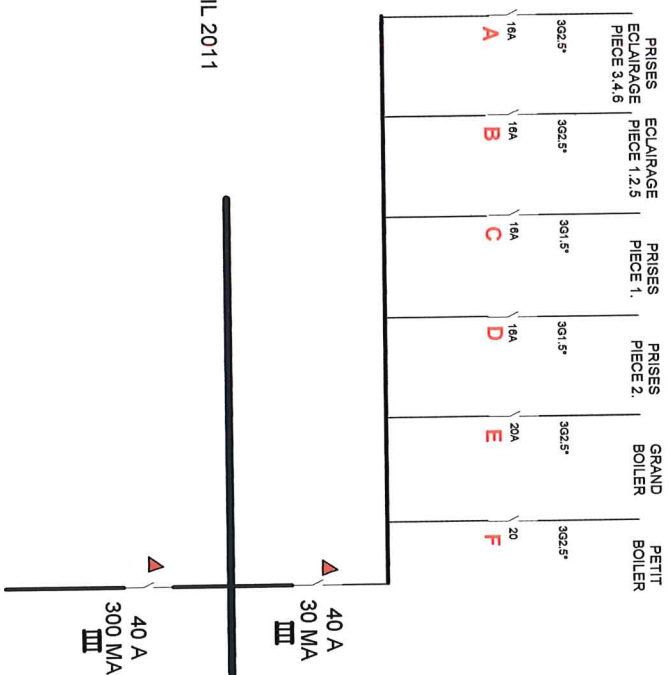


KEERBERGEN LE 22 AVRIL 2011



DVS.ELECT
 0475/659097
 dvs.elect@skynet.be

D.V.S. ELECT
 Bakestraat 103
 3140 Keerbergen
 TVA/BTW 0442.738.979

TABLEAU ELECTRIQUE APPARTEMENT 3° ETAGE RUE CARDINAL LAVIGERIE ,4

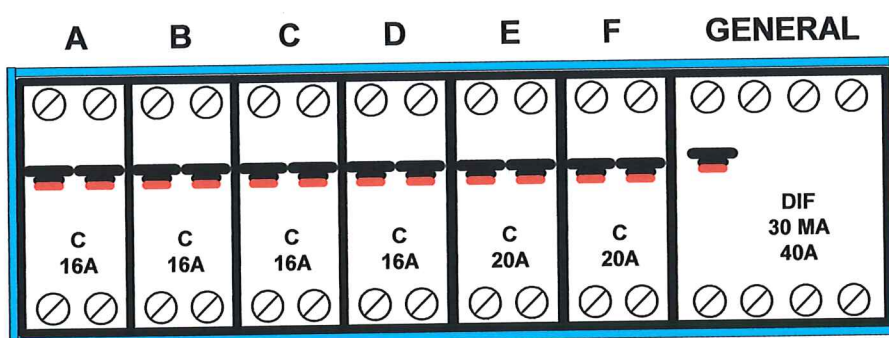

PRISES, ECLAIRAGE
PIECE 3.4.6

ECLAIRAGE
PIECE 1.2.5.

PRISE
PIECE 1.

PRISE
PIECE 2.

GRAND
BOILER

PETIT
BOILER

DVS.ELECT
0475/65 90 97
dvs.elect@skynet.be

ELECTRO-TEST
Dirk PROVINCIAEL
Inspecteur
Gsm +32 475 89 04 82

2X 220 V

D.V.S. ELECT
Bakestraat 103
3140 Keerbergen
TVA/BTW 0442.738.979

KEERBERGEN LE 22 ARIL 2011
