

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.:
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: jnys@netwalk.be

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 4400911
Voorl. verslagnr.:
Datum: 13/05/2014



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

Klant / Opdrachtgever:
EVERT HAMBLOK
JAN MOORKENSSTRAAT 16
2600 BERCHEN (ANTWERPEN)

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: Aard installatie: Bestaande/verzwaring Type lokalen: appartement
Plaats onderzoek: V2L JAN MOORKENSSTRAAT 16 BERCHEN (ANTWERPEN) 2600
Aard onderzoek: controlebezoek Volgens AREI Art.: 86/271/278/267
Datum onderzoek: 13/05/2014 Volgende binnen 0 maand of vóór 13/05/2039 Onderzoeker: POOTERS STEPHAN
Eigendom van: EVERT HAMBLOK JAN MOORKENSSTRAAT 16 2600 BERCHEN (ANTWERPEN)
Installateur: -
B.T.W.: - ID-kaart: - Uitgereikt te: - Datum: -

BESCHRIJVING

EAN nr.: - Teller nr.: - Stand I: - Stand II: -
Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: - Isolatieplaat: -
Dienstspanning: 3 x 220V Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: aut. 2p 40A Schak.: alg.diff.schak.
Meter-bordverbinding: kabeltype: VOB aantal geleiders: 3 doorsnede: 6 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: DNB aantal geleiders: - doorsnede: - mm²
Aardelektrode: type: pennen sectie: 16 mm² spreidingswaarde: 4 Ohm
Diff. schak.: algemene: 4p 40A/300mA is verzegeld met loodje: nvt bijkomende diff.: 2p 40A/30mA
Werking testknop: in orde Controle foutlus: in orde Algemene isolatieweerstand: 130 MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrisch materieel: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: in orde
Beschrijving installatie - toestellen: zie schema in bijlage ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☒ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 2 Aantal eindstroombanen: 11

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

geen

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op hoger vermelde datum, zoals voorzien door art. 271 van het AREI,
alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
Voor de Technisch Directeur,

Stephan Pooters


De Agent-onderzoeker

EVERT HAMBLOK
JAN MOORKENSSTRAAT 16
2600 BERCHEM

3X230V

25 V LINKS

POORE'S OIL
13/5/2014

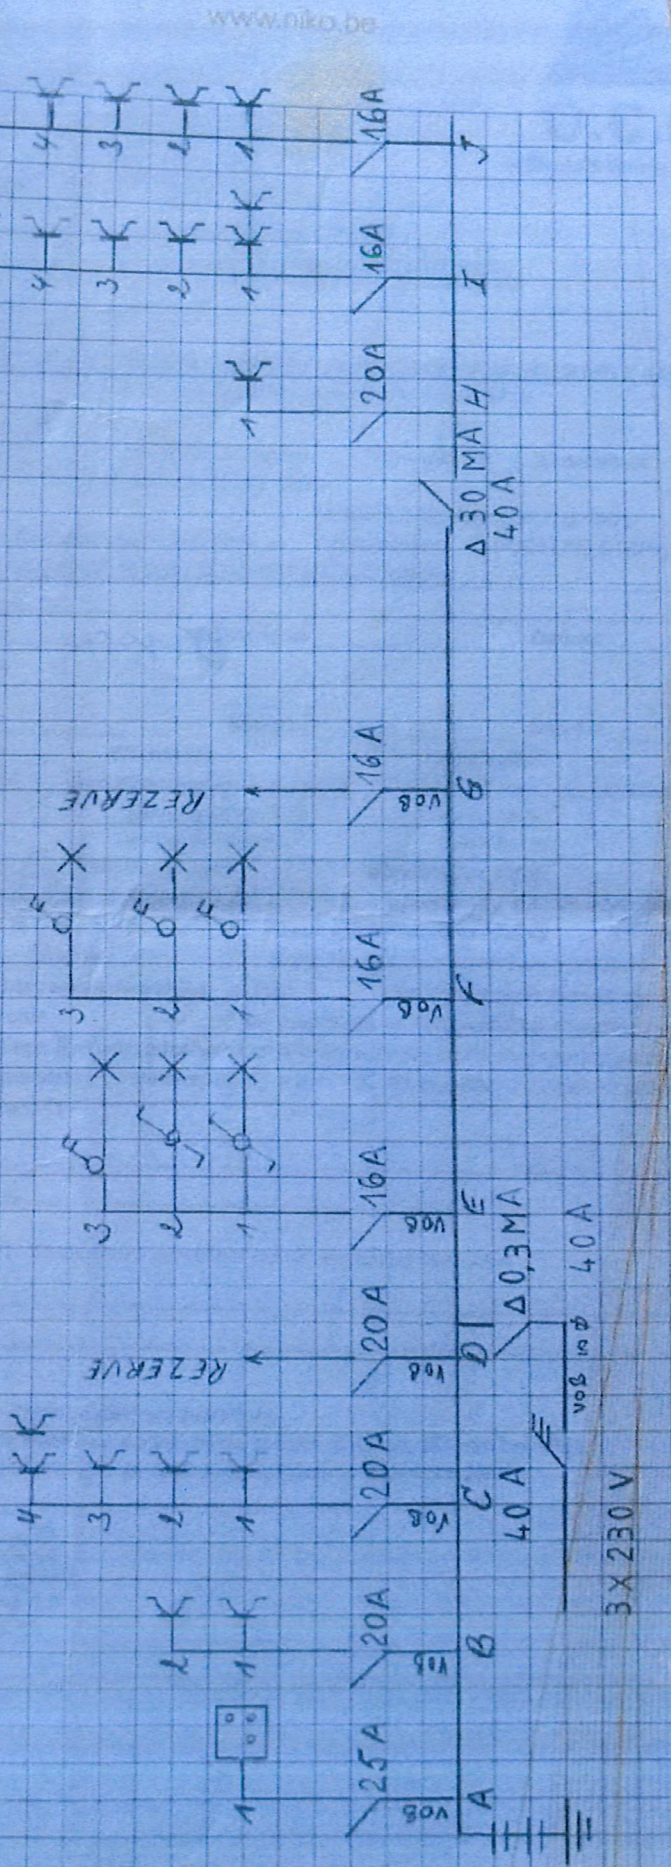

EVERT HAMBLOK
JAN MOORKENSSTRAAT 16 2E L
2600 BERGHEM
2E V LINKS

