

Elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning (Boek 1 - KB 8/09/2019) - Algemene Directie Energie

📍 Plaats van het onderzoek: KLAPROOSSTRAAT 72 F 2610 ANTWERPEN België

Bus: 9

📄 Aard onderzoek: Periodieke inspectie (Boek 1 6.5)

📅 Datum van het bezoek
13/02/2026

📅 Volgend controlebezoek:
13/02/2051

👤 Agent-bezoeker
Hasan Ozdemir

BESLUIT : CONFORM

Identificatie van derden

Opdrachtgever

Naam	PEB CERTI BV
Adres	Blaisantvest 105 -, 9000 Gent, België

Eigenaar, uitbater of beheerder

Naam	Anne Kleynjans
Adres	KLAPROOSSTRAAT 72 F 2610 ANTWERPEN België

Installateur

Naam	Sam Electro Solutions bv
BTW	BE0790866734

Identificatie van de elektrische installatie

Adres	KLAPROOSSTRAAT 72 F 2610 ANTWERPEN België
Nr Teller	1LGZ0584060854
Netbeheerder naam	Fluvius
Gebouw	Appartement 4de verdieping links

Atlas Controle VZW

Erkend controleorganisme

Hoofdkantoor: Lambermontlaan 127 1030 Schaarbeek

Tel: +32 2 726 64 04 | Mail: office@atlascontrole.be

BTW BE0732536476 | RPR Brussel

Wetgeving



AREI. Algemeen Reglement op de elektrische installaties.

Aard onderzoek:	Periodieke inspectie (Boek 1 6.5)
Datum van de uitvoering van de installatie	Voor 01/06/2020 en na 01/10/1981
Funderingen	vanaf 81
Afwijkende beschikkingen voor bestaande huishoudelijke elektrische installaties oud AREI waren toegepast (Boek 1 8.2.2)	

Identificatie van de elektrische installatie en gegevens verdeler

Netbeheerder naam	Fluvius
Nr Teller	1LGZ0584060854
EAN-code	
Meter/bord verbinding	XVB 4X16
Net spanning	3 x 400 V + N
Algemene bescherming	32A 4P
Maximum beveiliging	40A 4P
Aantal verdeelborden	1
Hoofd differentieelschakelaar	300mA - 40A - type A
Type van aardelektrode	Aardingslus
Waarde (Ω)	2,59
Beschrijving van de elektrische installatie	Zie beschrijving

Elektrisch paneel(en)

Aantal	Beveiliging	Doorsnede	Referentie verdeelbord
2	U16	1,5	A,B
2	C20A	2,5	C,K
1	U25A	6	D,E
9	U20A	2,5	G,H,I,J,L,M,N

Resultaten van de controle

Testapparatuur:

Schema's en situatieplannen	OK
Equipotentiale verbindingen	OK
DK Test van DSR	OK
ΔI_n	OK
Controle van de staat	OK
Waarde (Ω)	2,59
Isolatiemeting ($M\Omega$)	2,53
Opgesteld materieel	OK
Beschermingsinrichtingen tegen directe aanraking	OK
Beschermingsinrichtingen tegen indirecte aanraking	OK
Beschermingsinrichtingen tegen overstroom	OK

Schema's, plannen en documenten van de installatie

Schema's en situatieplannen	OK
-----------------------------	----

Inbreuken

Nihil

Opmerkingen

Bewoordingen	Referentie
De schema's van de elektrische installatie moeten in het elektrische installatiedossier bewaard worden. Het wordt ook ten zeerste aanbevolen een kopie van de schema's in de buurt van het hoofdverdeelbord te bewaren.	RDE2
Dit rapport is slechts een weergave van de elektrische installatie op het moment van de controle.	RDE6
De eenheid was gemeubileerd ten tijde van de inspectie.	RDE15

Besluit van de controle

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het Boek 1 inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.

Indien van toepassing, verklaart Atlas Contrôle dat de bezoekende agent de differentieelstroombeschermingsinrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, heeft verzegeld.

Het (de) eendraadsschema('s)- en situatieplan(en) werd door de bezoekende agent van Atlas Controle voor gezien getekend.

De volgende inspectie moet uiterlijk op datum van controle + 25 jaar worden uitgevoerd.

De door Atlas Contrôle uitgevoerde inspectie had betrekking op de zichtbare delen van de installatie die normaal toegankelijk zijn.

Bezoekagent

Hasan Ozdemir


Plichten van de eigenaar, beheerder of huurder van de installatie

De verplichting om het verslag te bewaren in het dossier van de elektrische installatie.

De verplichting om alle wijzigingen aan de elektrische installatie op te nemen in het dossier.

De verplichting om de toezichthoudende ambtenaar van de Federale Overheidsdienst Energie onmiddellijk op de hoogte te brengen van elk ongeval met personen dat rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt wordt door de aanwezigheid van elektrische installaties.

Bijlagen

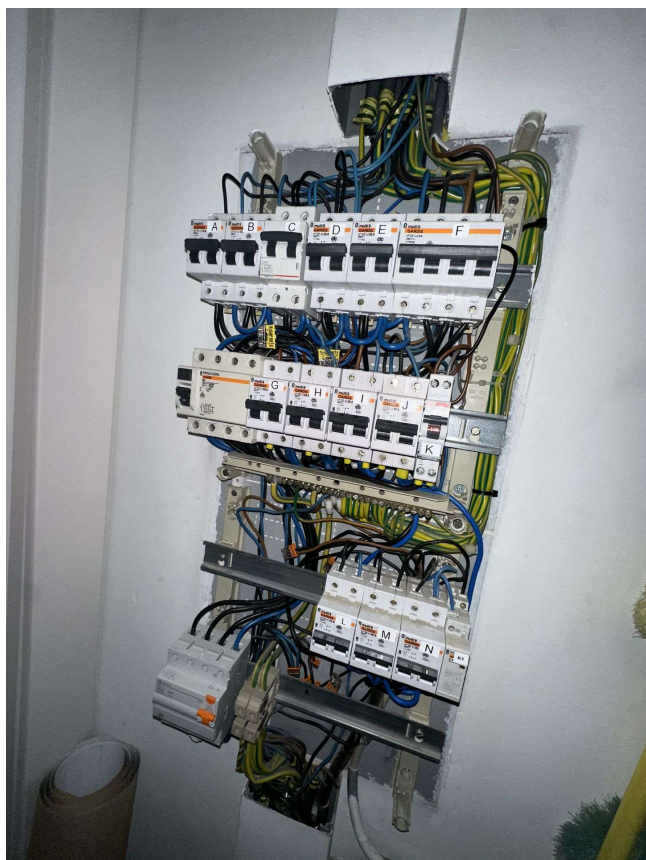

Bord

1
