

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.:
Cont.pers.: Anne Nivard
Tel.: -
Fax: -
GSM: 0498712839
e-mail: anne.nivard@gmail.com



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

ProKo.: LS13
Verslagnr.: 4651203
Voorl. verslagnr.:
Datum: 26/01/2016

Klant / Opdrachtgever:
Anne Nivard
Generaal Drubbelstraat 112
2600 Berchem

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE I.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: Aard installatie: verkoop wooneenheid Type lokalen: woning
Plaats onderzoek: Generaal Drubbelstraat 112 Berchem 2600
Aard onderzoek: controlebezoek Volgens AREI Art.: 86/271bis/276bis
Datum onderzoek: 26/01/2016 Volgende binnen 300 maand of vóór 31/01/2041 Onderzoeker: DOUILLEZ CHRISTOPHE
Eigendom van: -
Installateur: -
B.T.W.: - ID-kaart: - Uitgereikt te: - Datum: -

BESCHRIJVING

EAN nr.:	Teller nr.:	Stand I:	Stand II:
Aansluiting: ondergronds		Wachtbuis: geplaatst	Isolatieplaat: niet aanwezig
Dienstspanning: 1 x 220V	Max. beveiliging: 40A	Hoofdbeveiliging: aut. 2p 40A	Schak.: alg.diff.schak.
Meter-bordverbinding:	kabeltype: XVB	aantal geleiders: 2	doorsnede: 10 mm ²
Voedingsbekabeling:	kabeltype: EXVB	aantal geleiders: 4	doorsnede: 10 mm ²
Aardelektrode: type: pennen		sectie: 16 mm ²	spreadingswaarde: 8,9 Ohm
Diff. schak.: algemene: 2p 40A/300mA	is verzegeld met loodje: in orde		bijkomende diff.: 2p 40A/30mA
Werking testknop: in orde	Controle foutlus: in orde	Algemene isolatieweerstand: 10,37 MOhm	
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde		Staat van het vast elektrisch materieel: in orde	
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde	onrechtstreekse aanraking: in orde		
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde	Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: in orde		
Beschrijving installatie - toestellen: zie schema in bijlage één draadschema en situatieschema werd voor gezien getekend			
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding			
Aantal borden: 1	Aantal eindstroombanen: 12		

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

1. Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
2. Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

N

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op hoger vermelde datum, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker

50 KONTICH
ie X
100
312


b. Maack

Deze schema's zijn gemaakt voor de woning


Gelegen te 2600 Berchem (9-10-00)

Generaal Drubbelstraat nr 112

Yücelbaş Ibrahim



Situatieschema : Kelder

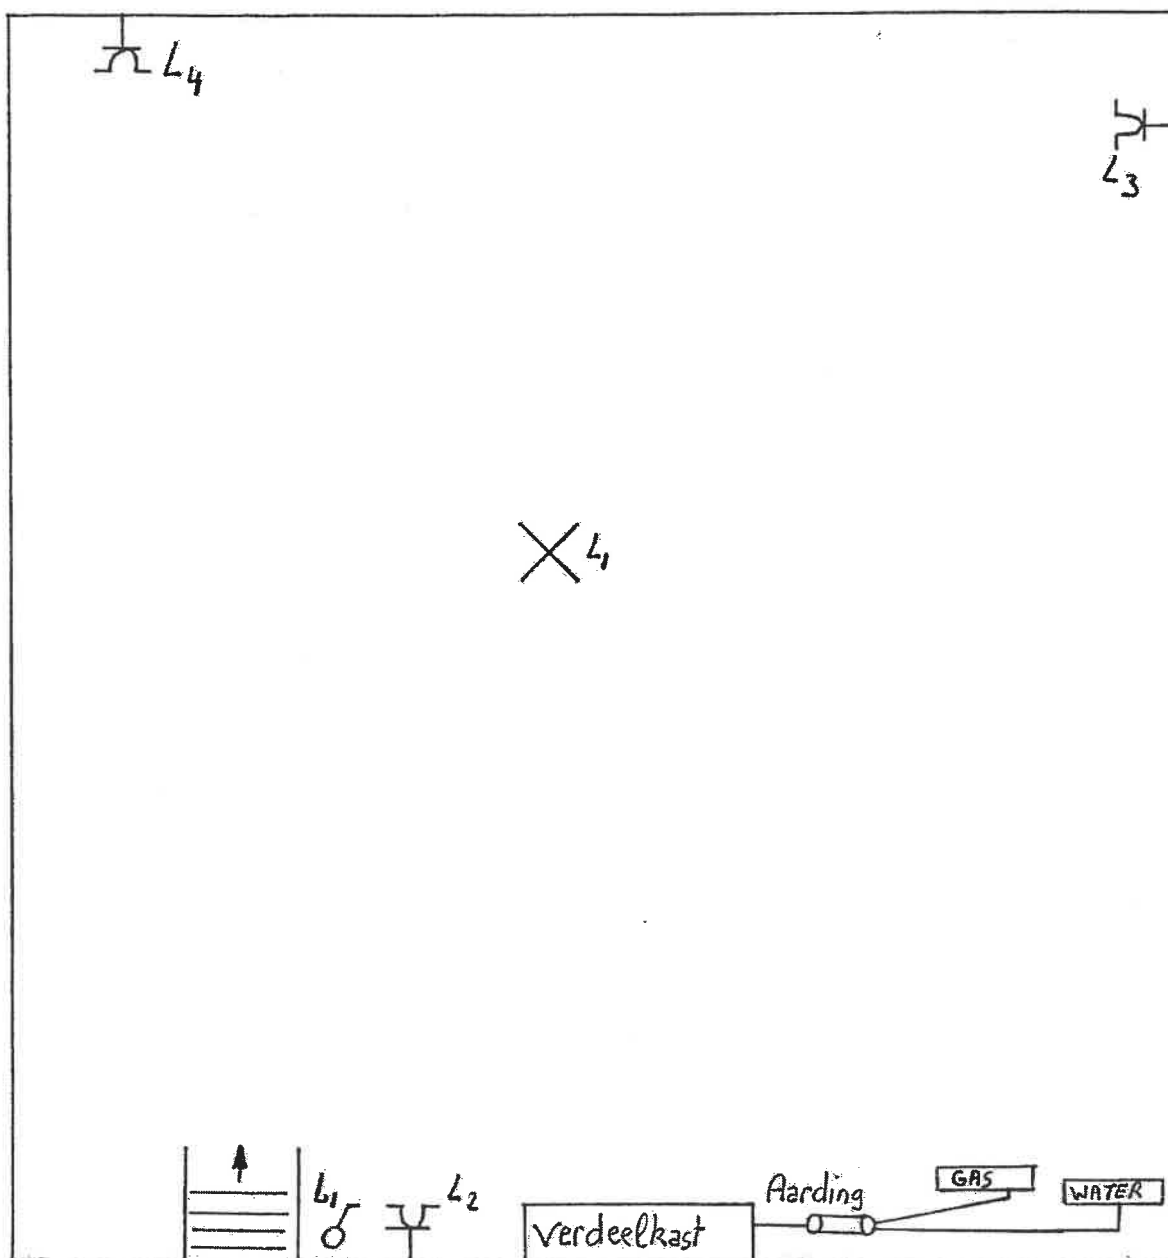

DOUILLEZ Christophe
GSM 0493/246 142
Christophe.douillez@ocb.be
www.ocb.be

R84651203

[Signature]
26/01/16


Anne Divoirel
76111213848

10 gelbip 28.12.2017

Guennel Deubelstries
112

2600 BERCHEN

Situatieschema: Gelijkvloers

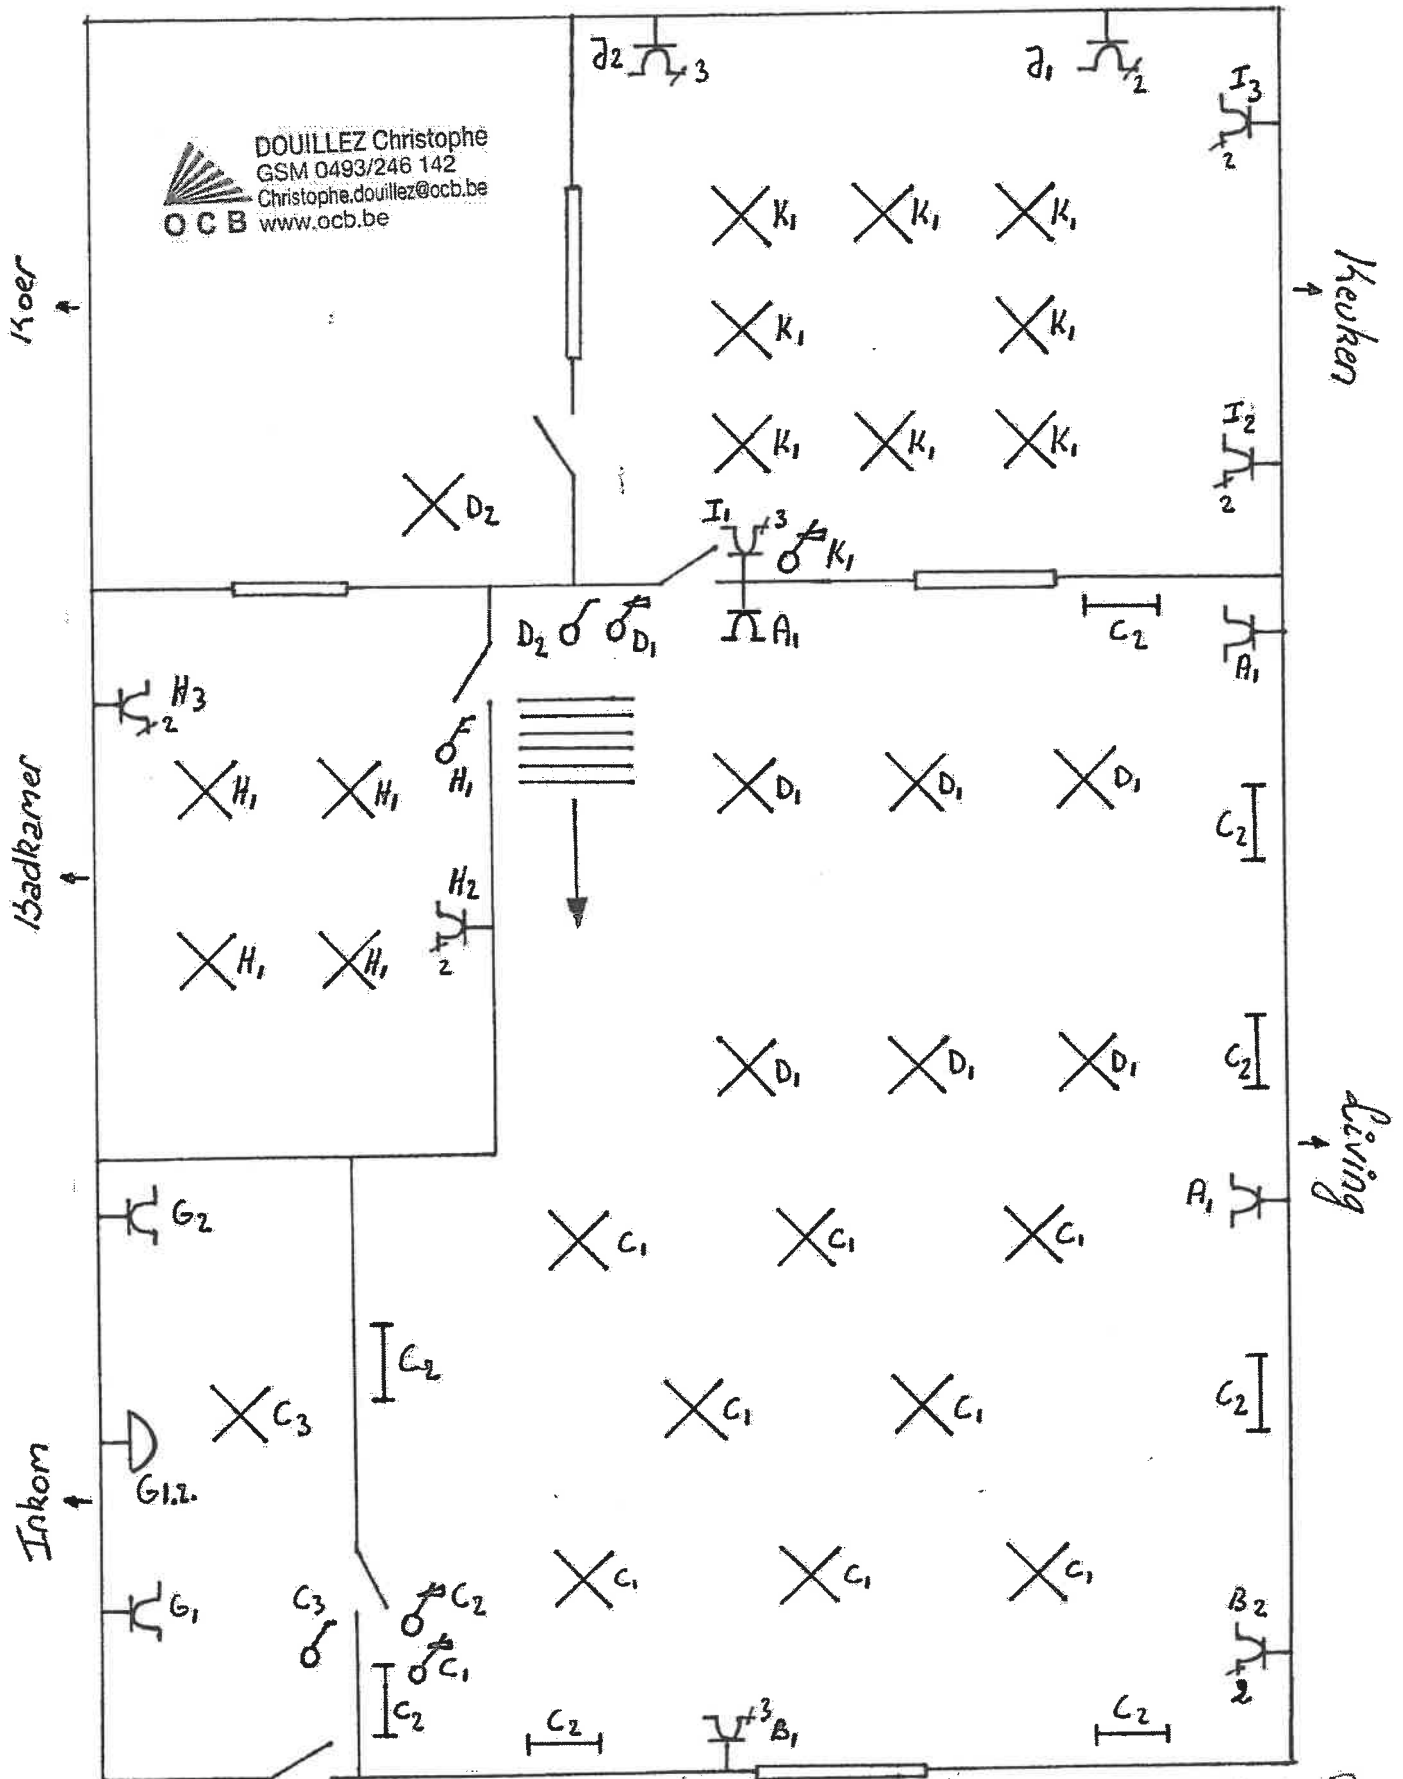


DOUILLEZ Christophe
GSM 0493/246 142
Christophe.douillez@ocb.be
www.ocb.be



Anne Nivand 76111219848 ID 28122017
Generaal Druhlstraat 112
1600 BERCHTEM

© G.H.

Situatieschema : 1^{ste} verdieping (slaapkamers)

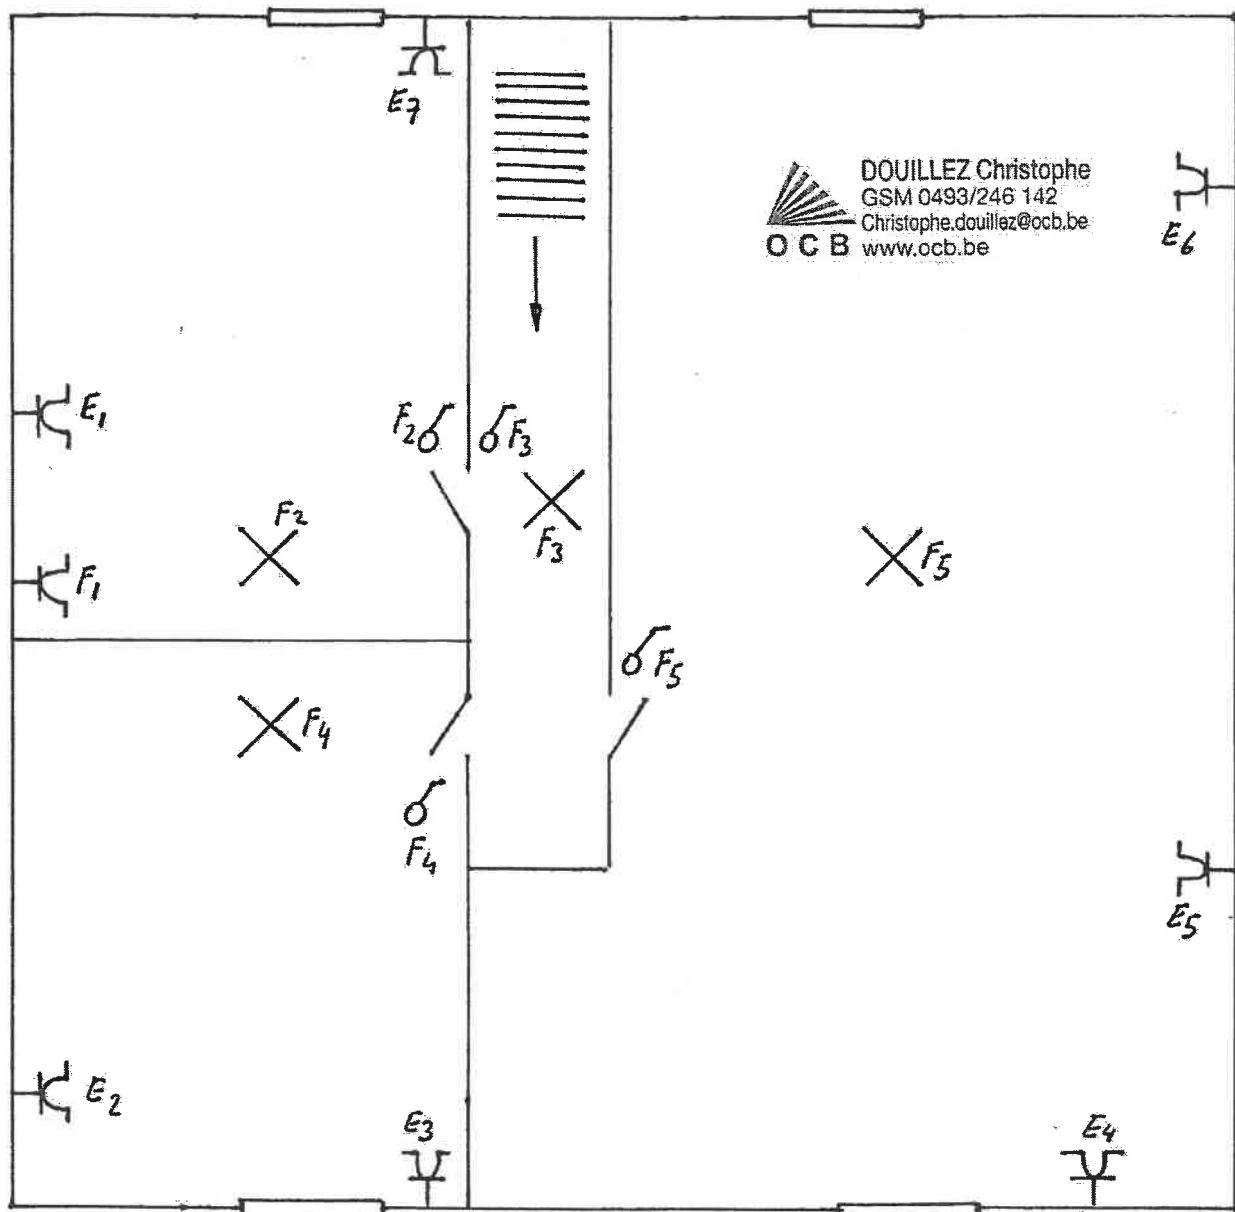


Anne Nivard


761112 1958 48

ID gelokk 2012 2017

General Durbelstraat 112

2600 BECHEN

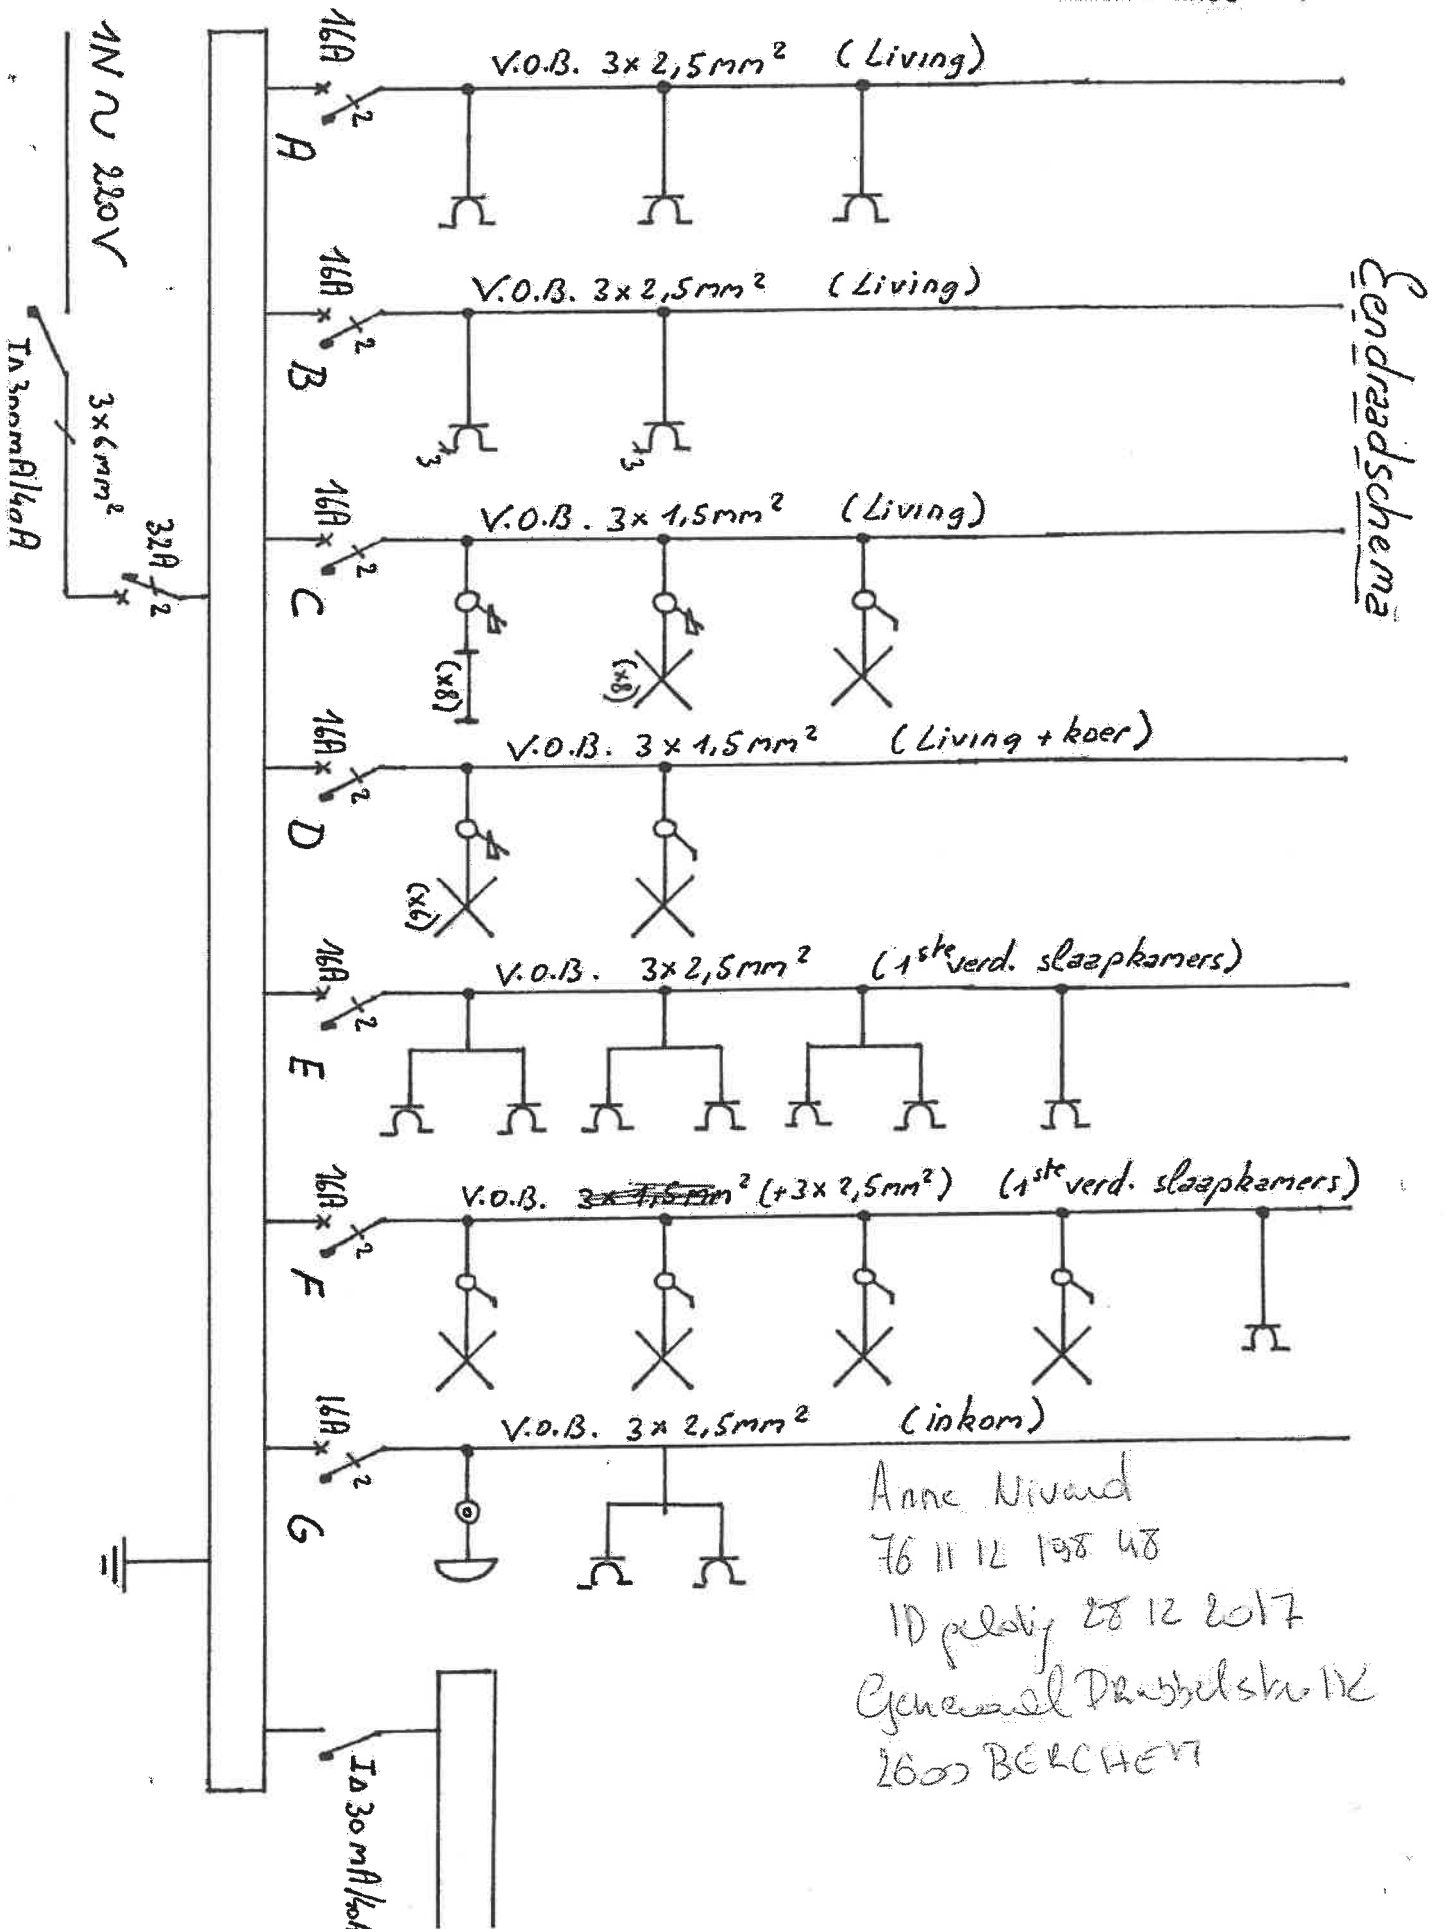

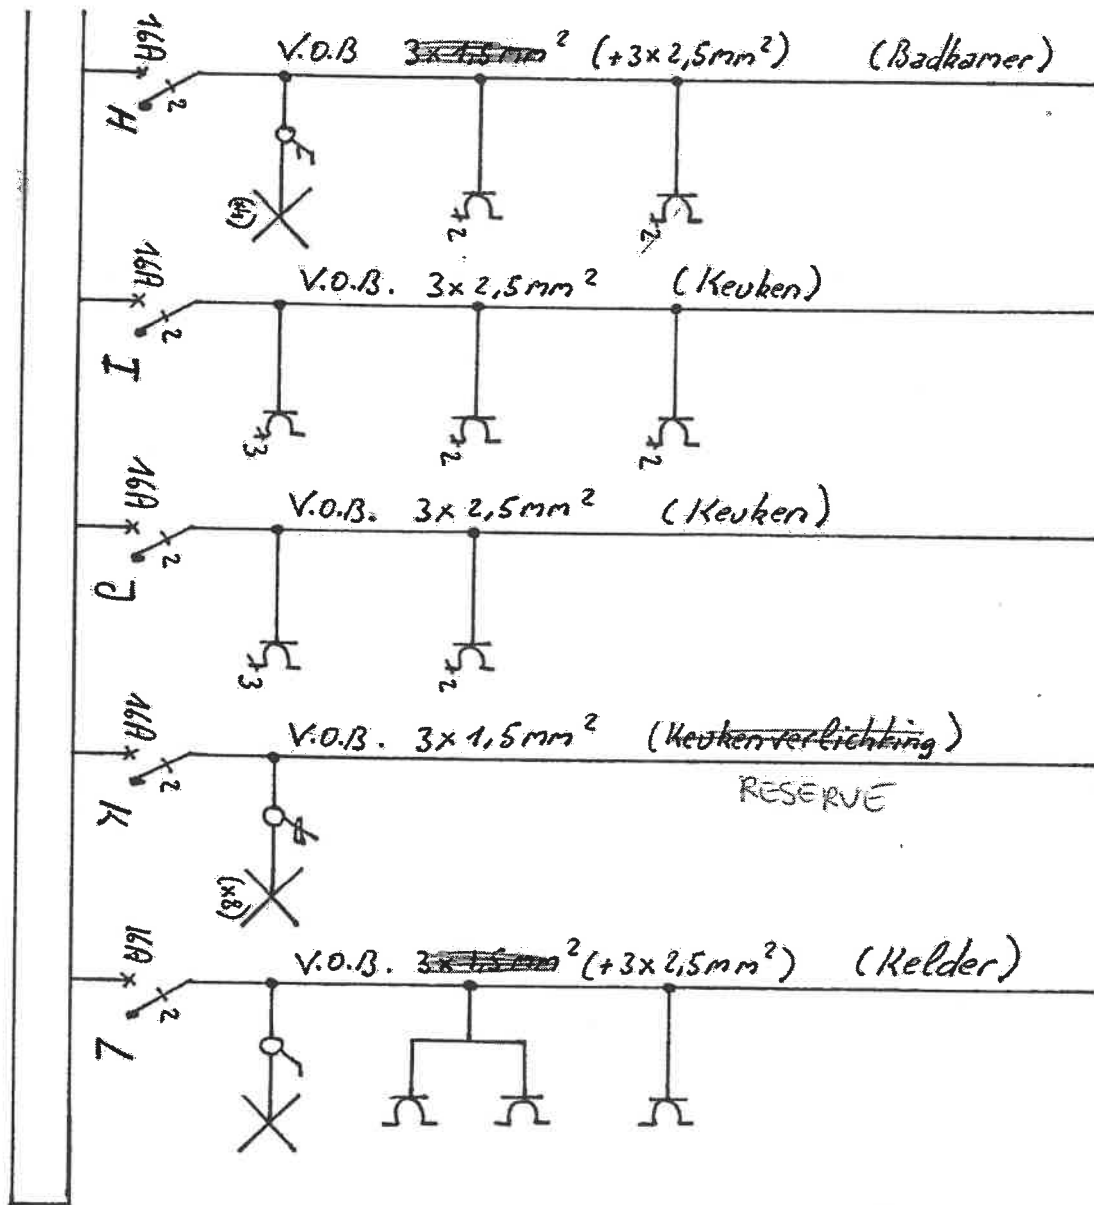

Anne Nivard
 76 11 12 1984
 ID geldig 28.12.2017
 gemacht door Prinske
 2000 BECHET

