

DE INSTALLATIE IS CONFORM

Datum(s) van controle: 24/03/2021 **Uitgiftedatum verslag:** 24/03/2021
Verslagnummer: 0508-210324-06

Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Technisch Bureau Verbruggen
Adres: Neerveldstraat 109 bus 6, 1200 Brussel
T: 011 42 18 34 E: btv.limburg@btvcontrol.be Ondernemingsnummer: 0406.486.616
De agent-bezoeker: nummer 0508

Identificatie van derden:

Opdrachtgever: SOCIAAL DIENSTBETOON
Adres: MGR. BROEKXPLEIN 6, 3500 HASSELT
Naam eigenaar, uitbater of beheerder: ACV PEER
Adres: STEENWEG WIJCHMAAL 12, 3990 PEER
Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: SOCIAAL DIENSTBETOON
Adres: MGR. BROEKXPLEIN 6,3500 HASSELT
BTW-nummer:

Identificatie van de elektrische installatie:

Naam: ACV PEER
Adres: STEENWEG WIJCHMAAL 12, 3990 PEER
EAN- code: 541449206008104150
Nummer teller: 74835903
Private hoogspanningscabine: Nee
Type installatie: werkeenheid

Gegevens van de controle:

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019: Controlebezoek (6.5)
Datum uitvoering van de installatie: Vanaf 01/10/1981 tot 01/06/2020

Informatie inhoud controle: Geen

Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: toegepast
Ander(e) wettelijk(e) kader(s): n.v.t.



Gegevens van de elektrische installatie:

Spanning en aard van de stroom: Mono 230V

Voedingsleiding hoofdbord: Type: XVB - Doorsnede: 4 x 10 mm²

Type aardelektrode: Aardingslus

Aantal borden: 1

Nominale waarde bescherming aansluiting: 40A


Type algemene schakelaar: 2P 40A/300mA

Type aardverbindingssysteem: TT

Aantal stroombanen: 15 (reserve inbegrepen)

BESCHRIJVING:

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 2P 40 A 300 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's
 Zie stroombaanschema's en situatieplannen

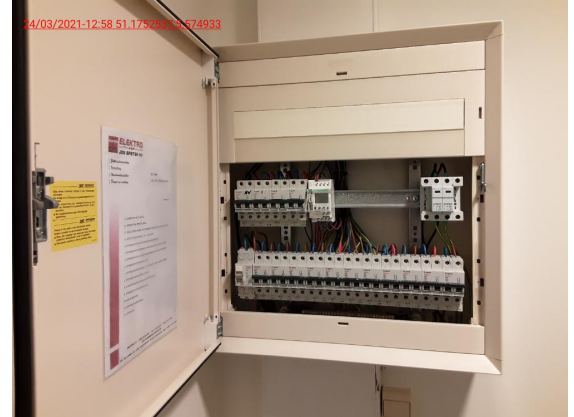

Document met uitwendige invloeden: Zie bijlage

Documenten van de veiligheidsinstallaties: Geen meegedeeld

Documenten van de kritische installaties: Geen meegedeeld

Situatieplan van de aardverbindingen: n.v.t.

Andere gegevens: /

Resultaten van de controle:

Metingen en beproevingen:

Spreadingsweerstand van de aardverbinding: 5 Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: 20 MOhm

Test van de differentieelstroominrichtingen via testknop: OK

Test van differentieelstroominrichtingen via opwekken foutlus: OK

Continuïteit van de beschermingsgeleiders: OK

Vastgestelde inbreuken:

Geen

Opmerkingen:

Geen

Besluit van de controle:

1. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 24/03/2026





Handtekening van de technisch verantwoordelijke (of namens de technisch verantwoordelijke):

