

Atlas Controle
Chaussée De La Hulpe 181 box 1
1170 Brussels

Bewoordingen	Paragraaf
Een hoofd-equipotentiaalverbinding is te installeren en te verbinden.	B1: 4.2.3.2.; 4.2.3.4.; 5.4.4.1.; B3: 4.2.3.2.; 4.2.3.4.; 5.4.4.1.
De aansluitingen van de hoofd-equipotentiaalverbindingen (water-, gasleiding, vertrek- en terugvoerleiding van verwarming) dienen vervolledigd te worden.	B1: 4.2.3.2.; B3: 4.2.3.2.
Bijkomende equipotentiaalverbinding(en) in de badkamer of douche is (zijn) te installeren.	B1: 7.1.4.4.
Een afzonderlijke differentieelschakelaar met een gevoeligheid van 30 mA plaatsen voor de installaties van badkamer(s).	B1: 4.2.4.3.
Een afzonderlijke differentieelschakelaar met een gevoeligheid van 30 mA plaatsen voor wasmachine, vaatwasmachine en/of droogkast en gelijkaardige toestellen.	B1: 4.2.4.3.
Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien.	B1: 3.1.2.; 9.1.1; 9.1.2; B3: 3.1.2.
Situatieschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien.	B1: 9.1.2.
De nominale spanning dient duidelijk vermeld te worden op een oordeelkundig gekozen plaats.	
Pictogram "levensgevaar" dient op degelijke wijze aangebracht te worden.	
Wij raden u aan de niet gebruikte leidingen te verwijderen.	
De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren.	

Opmerkingen lijst

Bewoordingen	Referentie
De schema's van de elektrische installatie moeten in het elektrische installatiedossier bewaard worden. Het wordt ook ten zeerste aanbevolen een kopie van de schema's in de buurt van het hoofdverdeelbord te bewaren.	RDE2
De schema's van de elektrische installatie zijn op het tijdstip van de inspectie aanwezig en werden ter plaatse gecontroleerd. Deze moeten opnieuw worden getoond bij de volgende (her)inspectie.	RDE3
Deze controle is beperkt tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie. Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.	RDE4
Deze inspectie is enkel beperkt tot de delen van de elektrische installatie die op de overeenkomstige (en ondertekende) delen van de schema's aangegeven zijn.	RDE5
De uitgevoerde controle is een onmiddellijke controle op basis van het tijdstip van doorgang. Dit rapport is slechts een weergave van de elektrische installatie op het moment van de controle.	RDE6
Het is niet uitgesloten dat bij de presentatie van de schema's nog andere inbreuken vastgesteld zullen worden.	RDE12

Atlas Controle
 Chaussée De La Hulpe 181 box 1
 1170 Brussels

Opmerkingen

Het is niet uitgesloten dat bij een nacontrole bijkomende inbreuken worden vastgesteld bij voorleggen schema's.

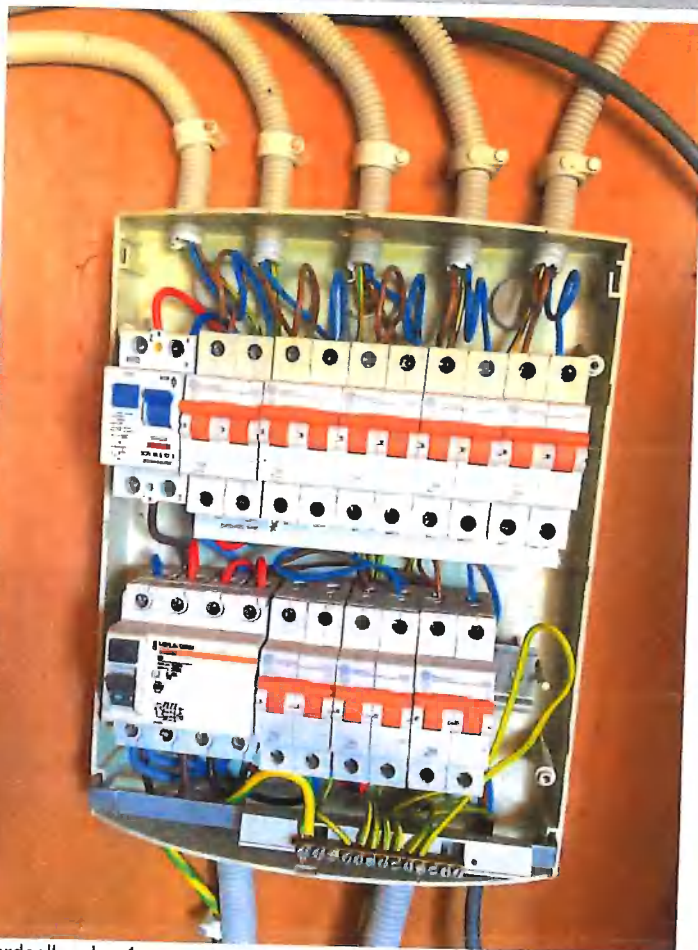
Besluit

BESLUIT : NIET CONFORM

De elektrische installatie voldoet aan de eisen van Boek 1 van de AREI (Koninklijk Besluit van 5/03/2023: C-2023/41114) betreffende elektrische installaties met lage en zeer lage spanning. Een extra inspectie moet worden uitgevoerd door Atlas Contrôle vóór 1 jaar.

De werkzaamheden die nodig zijn om de tijdens het inspectiebezoek geconstateerde inbreuken ongedaan te maken, moeten onverwijld worden uitgevoerd en alle passende maatregelen moeten worden genomen om ervoor te zorgen dat de inbreuken, in geval van voortzetting van de exploitatie van de installaties, geen gevaar voor personen en goederen opleveren.

Handtekening van de inspecteur

Verdeelborden 1

Lijst inbreuken

Bewoordingen

Paragraaf



Atlas
Contrôle



663 - INSP

Organisme d'inspection agréé/Erkend Keuringorganisme

Atlas Controle

Chaussée De La Hulpe 181 box 1

1170 Brussels

Atlas Controle
Chaussée De La Hulpe 181 box 1
1170 Brussels

VERSLAG VAN ONDERZOEK: HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Verslag Nr:

29.406

Datum van bezoek:

06-09-2023

Plaats van het onderzoek:

Venlosesteenweg 171 - Kinrooi 3640

Testeur d'installation:

Inspecteur:

Ramazan Yoruk

Aard onderzoek:

Controlebezoek (Livre 1 6.5)

TI-011/5396003

De datum van opstelling:

V1 06-09-2023 12:50:06

Volgend controlebezoek:

06-09-2024

Opdrachtgever

Naam

PEB Certi

Adres

Blaisantvest, 105, 9000 Gent

Telefoon

+32 2 466 45 66

Email

epc.certi@gmail.com

Algemene gegevens

Adres van de installatie

Venlosesteenweg 171 - Kinrooi 3640

Gebouw

Huis

Eigenaar

Eigenaar Venlosesteenweg 171 - 3640 Kinrooi

Adres van de eigenaar

Venlosesteenweg 171 - Kinrooi 3640

Installateur

Gegevens verdeler

DNB

Fluvius

Nummer teller

1SAG3100217460

EAN code

Meter/bord verbinding

XVB 4X10

Net spanning

1 X 400 V + N

Maximum beveiliging

20 A 4P

Onderzoek

Schémas/plans

NOK

Equipotentiale verbindingen

OK

Fundamenten

vanaf 81

Elektrische installatie

vanaf 81

Beschrijving van de installatie

8x automaat

1x hoofddifferentieel 40A 300mA

1x differentieel 40A 30mA

Aantal verdeelborden

1

Hoofd differentieelschakelaar

300mA - 40A - type A

DK Test van DSR

OK

ΔI_n

OK

Controle van de staat

NOK

Opgesteld materieel

OK

beschermingsinrichtingen tegen directe aanraking

OK

beschermingsinrichtingen tegen indirecte aanraking

OK

beschermingsinrichtingen tegen overstroom

OK

Type aardelektrode

Baar

Weerstand aardelektrode (Ω)

25

Isolement (M Ω)

0,5
