

DE INSTALLATIE IS NIET CONFORM

Datum(s) van controle: 15/11/2022 **Uitgiftedatum verslag:** 15/11/2022
Verslagnummer: 0458-221115-02

Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Technisch Bureau Verbrugghen
Adres: Neerveldstraat 109 bus 6, 1200 Brussel
T: 011 42 18 34 E: btv.limburg@btvcontrol.be Ondernemingsnummer: 0406.486.616
De agent-bezoeker: nummer 0458

Identificatie van derden:

Opdrachtgever: SAVEMAK VASTGOED
Adres: KERKHOVENSESTEENWEG 447, 3920 LOMMEL
Naam eigenaar, uitbater of beheerder: -
Adres: VREYSHORRING 25, 3920 LOMMEL
Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: Onbekend
Adres: ,
BTW-nummer:

Identificatie van de elektrische installatie:

Naam: -
Adres: VREYSHORRING 25, 3920 LOMMEL
EAN- code: 541449200001610007
Nummer teller: 1SAG3105167099
Private hoogspanningscabine: Nee
Type installatie: handelsgedeelte

Gegevens van de controle:

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019: Controlebezoek (6.5)
Datum uitvoering van de installatie: Vanaf 01/10/1981 tot 01/06/2020

Informatie inhoud controle:

1 een mogelijke berging behoort niet tot deze keuring
Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: toegepast
Ander(e) wettelijk(e) kader(s): n.v.t.



Gegevens van de elektrische installatie:

Spanning en aard van de stroom: 3 x 400V + N
 Voedingsleiding hoofdbord: Type: XVB - Doorsnede: 4 x 10 mm²
 Type aardelektrode: Onbekend
 Aantal borden: 1


Nominale waarde bescherming aansluiting: 32A
 Type algemene schakelaar: 4P 40A/300mA
 Type aardverbindingssysteem: TT
 Aantal stroombanen: 15 (reserve inbegrepen)

BESCHRIJVING:

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 300 mA type A, beschermde stroombanen: gehele installatie

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 2P 40 A 30 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's

Zie ééndraadsschema's en situatieplannen

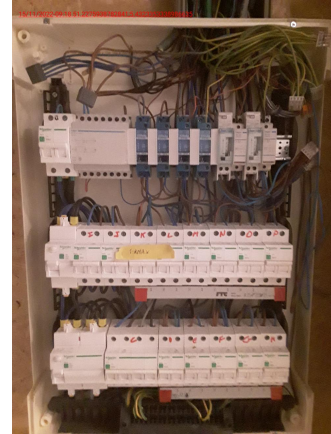

Document met uitwendige invloeden: Zie inbreuken
 Ref. lijst evacuatiewegen en moeilijk evacueerbare ruimten: zie inbreuken
 Documenten van de veiligheidsinstallaties: Geen meegedeeld
 Documenten van de kritische installaties: Geen meegedeeld
 Situatieplan van de aardverbindingen: n.v.t.
 Ref. verslag gelijkvormigheidscontrole: zie inbreuken
 Plaatsaanduiding ondergrondse leidingen: mondeling meegedeeld

Resultaten van de controle:

Metingen en beproevingen:

Spreidingsweerstand van de aardverbinding: n.g. zie inbreuken Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: >5 MOhm

Vastgestelde inbreuken:

- 1 de plaats van de aardingsonderbreker is onbekend, geen spreidingsweerstand kunnen meten
- 2 De verbindingen zijn niet gebeurd in borden, in aftakdozen, aan de klemmen van stopcontacten, schakelaars of in de verlichtingstoestellen (Boek 1: 5.2.6.1). zie onder bureau achterste ruimtes
- 3 Het document met de uitwendige invloeden ontbreekt (Boek 1: 9.1.6).
- 4 De lijst van de evacuatiewegen en de moeilijk evacueerbare ruimten ontbreekt (Boek 1: 3.1.2.1).
- 5 Het verslag van de gelijkvormigheidscontrole ontbreekt (Boek 1: 9.1.1 / 9.1.2).

Opmerkingen:

Geen

Besluit van de controle:



- 3. De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van Boek 1, van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie.**

De werken, nodig om de tijdens het controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging worden uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen.

Tijdstip van afwerking:

De technisch directeur, ir. Bart van Rossum

