

**RAPPORT DE VISITE DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BT & TBT DOMESTIQUE****INFORMATIONS GENERALES**

Type d'installation : Modification importante
Type de locaux : Appartement
Lieu d'inspection : Av. de la Brabançonne 85, 1000 Bruxelles
Etagé : 4.2
Référence : R.G.I.E Livre 1, Partie 6 Chapitre 6.5
Agent visiteur : Alein Kolukisaoglu
Propriété de : [REDACTED]

Date d'inspection : 28/11/2025

Date d'émission : 02/12/2025

Autres règlements :
Documents de référence : /
A réinspecter au plus tard dans : 25 ans

CARACTERISTIQUES DU POINT DE BRANCHEMENT

G.R.D : SIBELGA
Numéro EAN : Pas disponible
Raccordement :
N° Compteur: 1SAG3200120990
Marque : Sagemcom
Tension de serv. : 3X230V
Liaison comptage-coffre TGBT(mm²) : 10 mm²
Type de Câble : XVB

Nature du courant: Alternatif
Nombre de cond. : 3
I.Jour(1.8.1.) : 556.982
II.Nuit(1.8.2.) : 482.147
Jour(2.8.1) : /
Nuit(2.8.2) : /
Prot. princ. branchement : aut. 3p 40A
Section (mm²): 6 mm²

CONTROLES VISUELS - MESURES - ESSAIS

Schémas conformes et signés : OUI
Description Installation :
voir les schémas en annexe : Oui
Installation exécutée conformément aux schémas : OK
Etat du matériel électrique (fixation, dégradation...) : OK
Continuité PE et liaison équipotentielle : OK

Electrode de terre et interrupteur différentiel

type d'électrode: Piquet de terre
Section cond. de terre: 16 mm²
Inter. diff. général : 4p 40A/300mA
Nbre de diff. supplem:
Différentiels essayés par bouton test: OK

Resistance de disp.(Ohm) : 30
Inter. diff. secondaire : 4p 40A/30mA
Inter. diff. supplem :
Scellé par plombage : OK

Protection contre les chocs électriques

Contre les contacts directs: OK
Test des boucles de défaut: OK

Contre les contacts indirects: OK
Resist. d'isolement (MOhm) : 9.47

Matériel et influences externes : OK
Nombre de tableaux : 2
Nombre de circuits terminaux : 8
Pas encore installé : /

Identification circuit : OK

Adéquation entre les dispositifs de protection et la section des conducteurs : OK
Adéquation entre le différentiel et la valeur de la résistance de dispersion de l'électrode de terre : OK
Appareil mobile à poste fixe et appareil fixe : OK
schéma unifilaire et plans de position ont été signés de nouveau pour approbation : Oui

CONCLUSION

L'INSTALLATION EST CONFORME AU LIVRE 1 DU RGIE (AR 08/09/2019)

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 concernant les installations électriques à basse tension et à très basse tension. La prochaine visite de contrôle est à effectuer dans le délai prescrit dans les généralités.



Pour le Directeur Technique,
L'inspecteur,

L'inspecteur confirme avoir suivi toutes les points de la check-list: OUI

NOTES

- 1- Sauf stipulation contraire, les appareils et machines raccordés à l'installation fixe, ne font pas partie de l'inspection..
- 2- Le présent contrôle porte sur les parties aisément accessibles et visibles de l'installation et exclu les parties cachées tel que les cloisons, les faux-plafonds, etc.
- 3- Sauf stipulation contraire, l'examen porte exclusivement sur l'état et le bon fonctionnement de l'installation. Sa conception sort du cadre de la mission.

INFRACTIONS

Description des infractions

/

REMARQUES


/

DEROGATIONS

CONSEILS

- a) l'obligation de conserver le rapport de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique;
- b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique;
- c) l'obligation d'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service public fédéral ayant l'Energie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques.
- d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du rapport de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

Enregistré par Alein KOLUKISAOGU le 2025-12-10 20:05:30

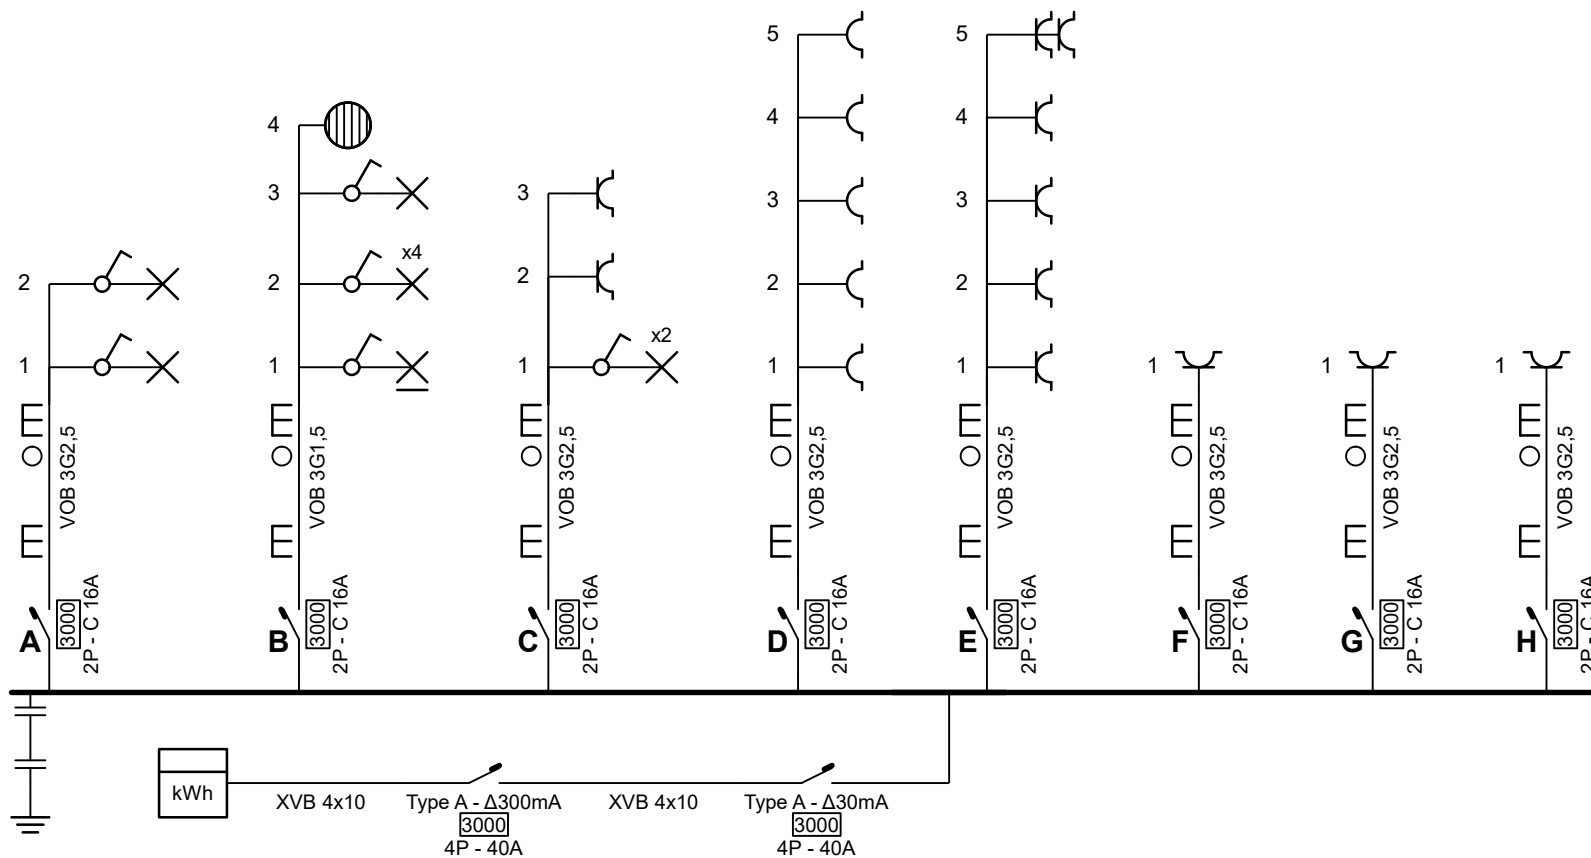


Certifié par :
 Gecertificeerd door
 Inspecteur: KOLUKISAOGLU Alein
 Date / Datum:
 Signature / Handtekening:



[Handwritten signature]

ilaire
 0Hz

4e étage

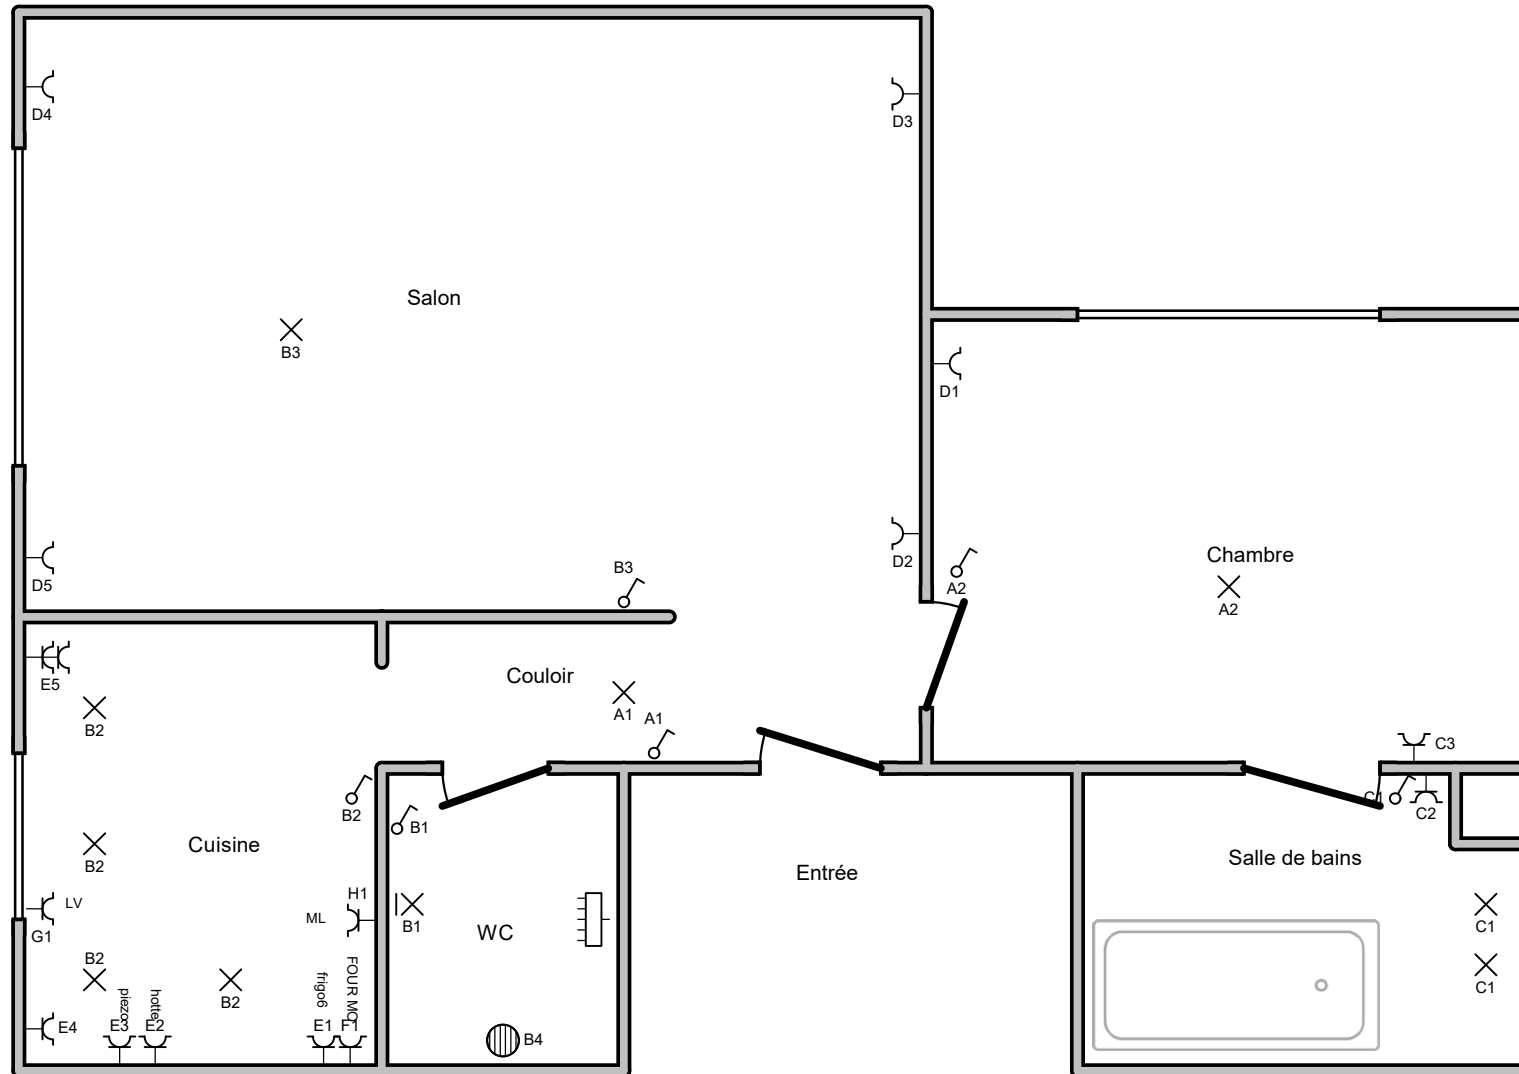

Certifié par :
Gecertificeerd door

Smart
CONTROL

Inspecteur: KOLUKISA OGLU Alein


Date / Datum:

Signature / Handtekening:

p. 2/3
Plan de position

3 x 230V ~ 50Hz

Cave

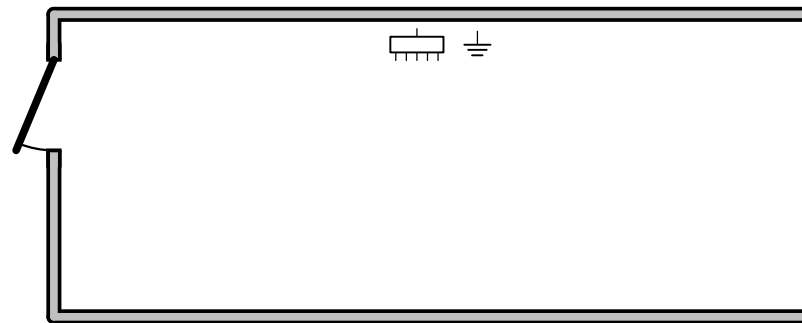

Certifié par :
Gecertificeerd door

Smart
CONTROL

Inspecteur: KOLUKISAAGLU Alein

Date / Datum:

Signature / Handtekening:

p. 3/3
Plan de position

3 x 230V ~ 50Hz
