

PROCÈS-VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE À BASSE TENSION

Membre n°: Demandeur: E. Lévy

Responsable des travaux:		Installation:		Propriétaire/gestionnaire:	
Nom, Prénom: <u>E. Lévy</u>		Nom, Prénom: <u>ULVELING</u>		Nom, Prénom: <u>ULVELING</u>	
N° carte d'identité:		Adresse: <u>Chemin de Gola</u>		Adresse: <u>Ave. de Lorey, 20</u>	
N° TVA: BE		CP + Commune: <u>6800 Bras Bas</u>		CP + Commune: <u>6870 Arville</u>	
		Tél: <u>1</u>		Tél: <u>1</u>	

Bases de l'examen: ☒ Règlement Général sur les Installations Électriques (RGIE) ☐ RGPT ☐			
☒ Art 270	☐ mise en usage ☐ modification ☐ extension	☒ Art 86	☐ Art 271bis
☐ Art 271	☐ mobile ☐ temporaire	☐ Art 87	☐ Art 270
☐ Art 272	☐ périodique ☐ contrôle	☐ Art 88	☒ Art 235
☐ Art 273	☐ renforcement ☐ Art 276bis: vente d'une unité d'habitation	☐ Art	☐ Art

Données générales de l'installation électrique:	
Données distributeur	EAN <u>547449060008535686</u> EAN non communiqué ☐ Compt. kWh non placé ☐ Compt. kWh n°: <u>50219694</u> Index jour: <u>912</u> nuit: <u>66,2</u> Protection branchement (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☒ 125
Données installation	Conçue pour U _n : ☒ 230V ☐ 3x230V ☐ 2N400V Courant nominal maximum (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☒ 63 ☐ 80 ☐ 100 Câble d'alimentation tableau principal: <u>4</u> X <u>16</u> mm ² - Type: <u>EXV.B</u> Type de prise de terre: ☒ boucle de terre ☐ barres / piquets
Description installation	☒ Dispositif diff. gén.: <u>6.3</u> A / <u>30.0</u> mA Nombre de tableaux: <u>1</u> Nombre de circuits terminaux: <u>3</u> Ajout d'un disjoncteur bipolaire B20 + 1 compteur vert n° 708313 + 1 onduleur Sunny Boy 3000 n° 2000763292 + 14 panneaux photovoltaïques 244 pour une puissance de <u>± 3,5 kW</u>

Mesures - tests - contrôle visuel - scellés:	
☒ Contacts Dir. ☒ Contacts Indir. ☒ Montage ☒ Appareils ☒ Matériel ☒ I>/section ☒ Schémas ☐ Contrôle bcl de défaut	
☒ Résistance de dispersion de la prise de terre: <u>25,5</u> Ω ☒ Isolement général: <u>10</u> MΩ ☒ Continuité de terre ☒ Test dispositif diff.	
Le dispositif différentiel général: ☒ était plombé ☐ a été plombé ☐ n'a pas été plombé ☐ ne peut pas être plombé	


Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels: voir au verso)

Infractions	Visa GRD:
Nouvelle installation	
☒ Néant	
Infractions	
Installation existante	
☒ Néant	
Remarques	
☒ Néant	

Conclusion(s):	
☒ La nouvelle installation est conforme n'est pas conforme au RGIE.	L'installation électrique doit être recontrôlée avant le <u>09/11/2009</u> (*) ☒ par le même organisme de contrôle (*) (*) délai prescrit sous réserve de modification de la réglementation
☐ L'installation existante est conforme n'est pas conforme au RGIE.	

Agent visiteur:		Pour le Directeur Général: Signature	
Nom: <u>José TOUSSAINT</u>	Agent n°: <u>1128</u>	Date: <u>09/11/2009</u>	
Annexe(s): ☐ Schéma(s) de position: ☐ Schéma(s) unifilaire(s): ☐			

Schéma de Position

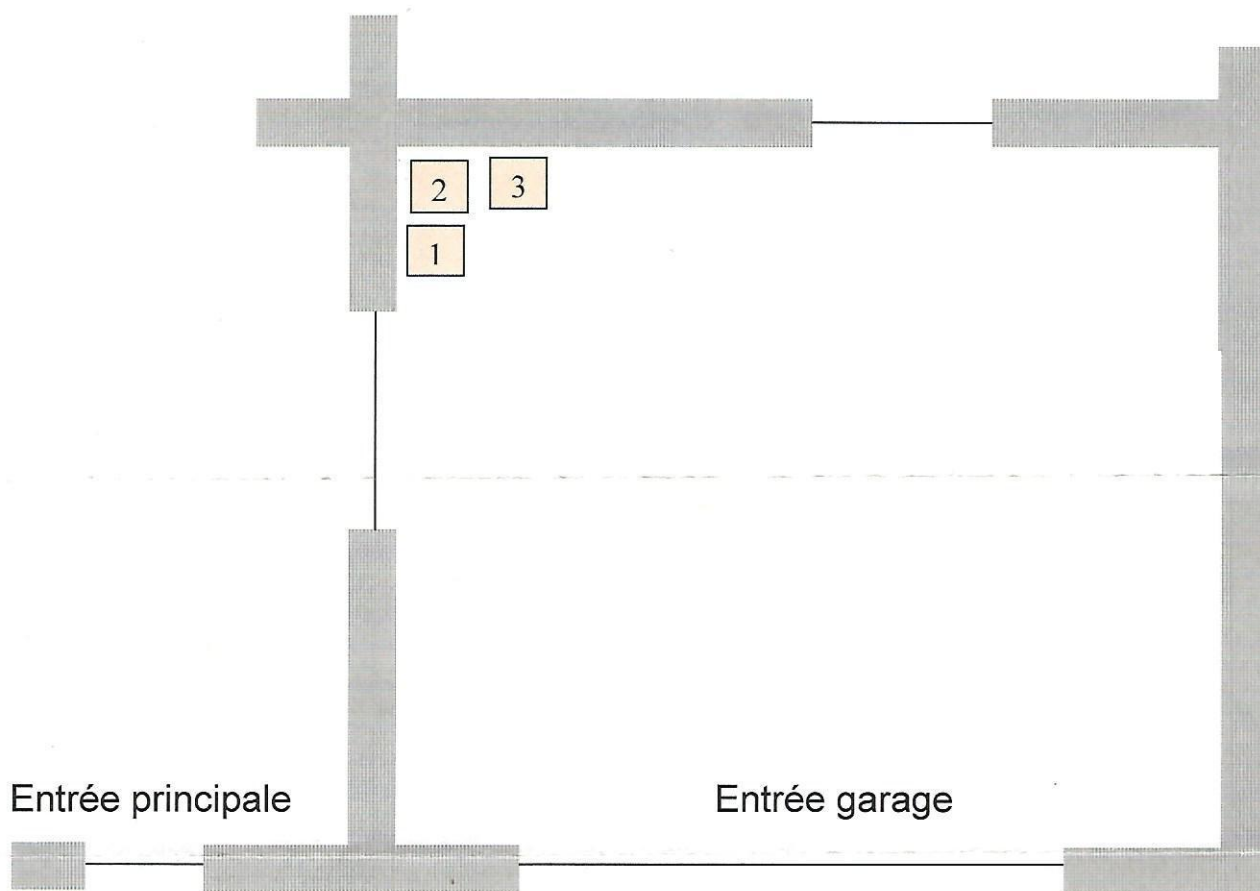

1	Compteur GRD	Actaris	n° 50214691-2009
2	Compteur CV	Finder	n° 7008313
3	Onduleur	SMA SB 3000	n° 2000763292


EAN : 54 1449 0600 0853 5686

Adresse de l'installation

MM Ulveling
Chemin de Golo
6800 Bras Bas

Installateur	Pour l'organisme de contrôle agréé	Le propriétaire
 Rue Maréchal Foch 25 6760 Virton TVA BE0888.981.145 Représenté par : E. Rion Signature :  Date : 06/11/2009	Organisme : Nom : Signature :  Date :	Nom : Ulveling Adresse : rue de Lorcy 20 6870 Arville Signature :  Date : 06/11/09

Schéma Unifilaire

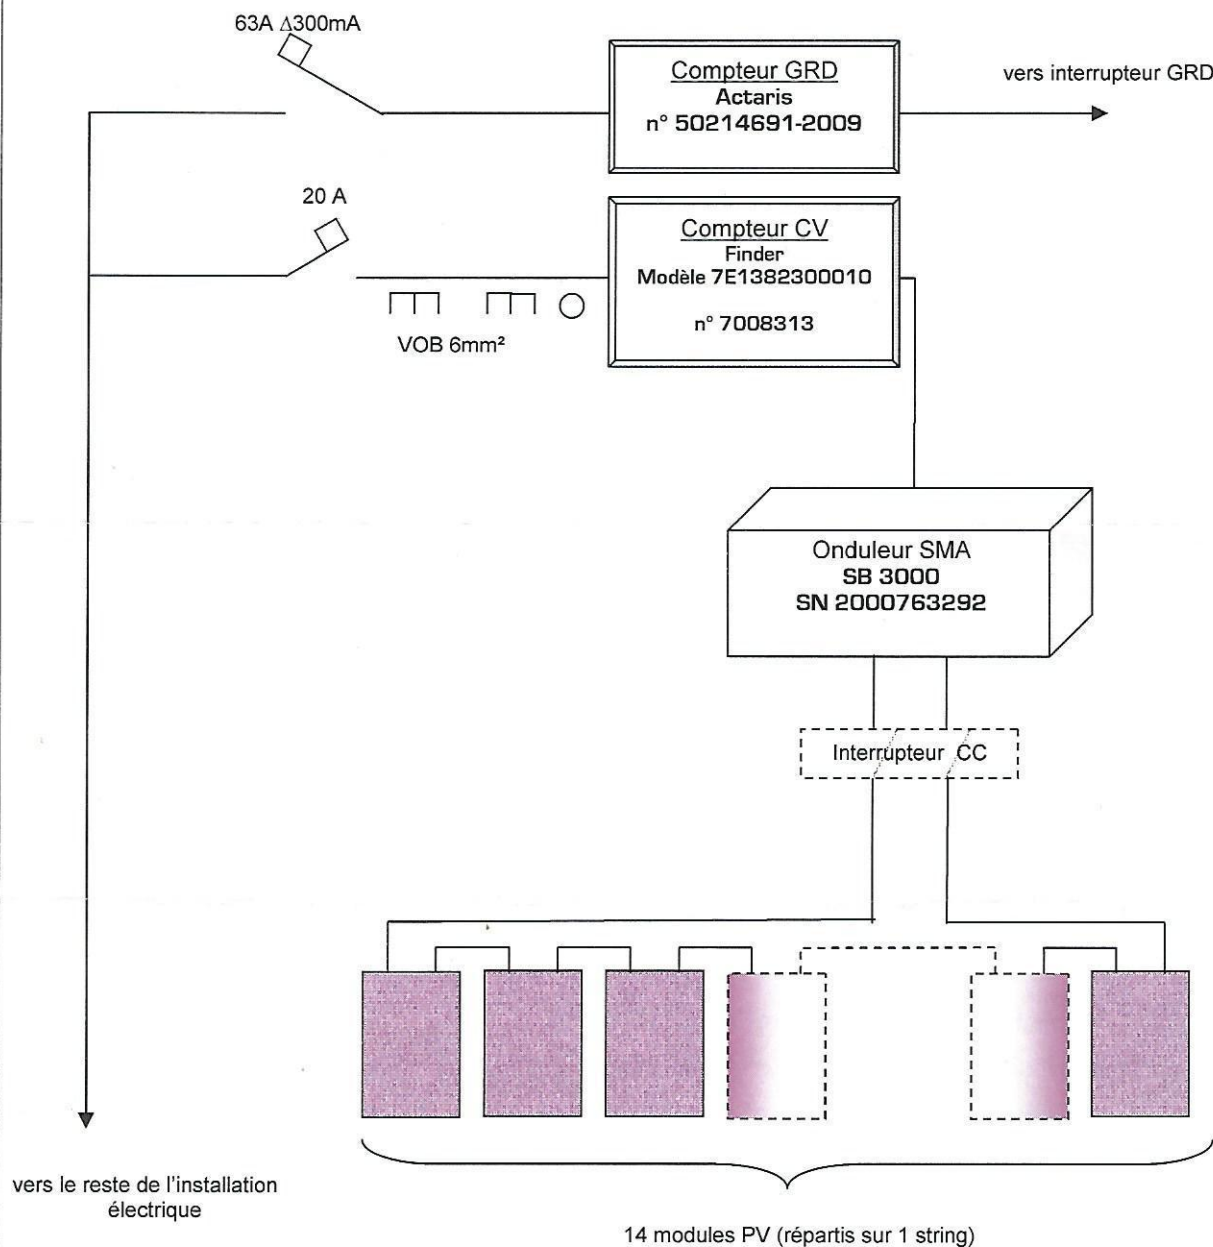

Adresse de l'installation

MM Ulveling
Chemin de Golo
6800 Bras Bas

Installateur	Pour l'organisme de contrôle agréé	Le propriétaire
 Rue Maréchal Foch 25 6760 Virton TVA BE0888.981.145 Représenté par : <u>E. Rion</u> Signature :  Date : <u>06/11/2009</u>	Organisme : <u>Vincelle</u> Nom : <u>Toussaint Sose</u> Signature :  Date : <u>le 03/11/2009</u>	Nom : <u>Ulveling</u> Adresse : <u>rue de Lorcey 20</u> <u>6870 Arville</u> Signature :  Date : <u>le 03/11/2009</u>
