



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Exploitatietel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel

Safety, quality and environmental services

Verslag nr. : 506055748813



N 114499

Resi code:

☒ Antwerpen-Limburg
☐ Brabant

tel.: 03 221 86 11
tel.: 02 674 57 11

☐ Oost & West -Vlaanderen
☐ Wallonië

tel.: 09 244 77 11
tel.: 081 432 611

1

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :

Installatie :

Eigenaar of beheerder :

Naam, voornaam : Geb. Minne
Ident. Kaart nr. :
BTW nr.: BE 0835.608.773

Naam, voornaam :
Adres : A. de Raughele 11-13/1VA
Post nr. + Stad : 1150
Tel. : 02 674 57 11

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

☒ Art 270	☒ ingebruikname	☐ wijziging	☐ uitbreiding	☒ Art 86	☐ Art 271 bis	☒ 1 Wooneenheid
☐ Art 271	☐ mobiel	☐ tijdelijk		☐ Art 87	☐ Art 278	☐ 2 Huishoudelijke werkeenheid
☐ Art 276	☐ periodiek	☐ controle		☐ Art 88	☐ Art	☐ 3 Gemeenschappelijke delen
☐ Art 276	☐ verzwarend	☐ Art 276bis	☐ verkoop van een wooneenheid	☐ Art ...	☐ Art	☐ 4 Werkeenheid

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdeler	EAN	☐ EAN niet meegedeeld	☐ kWh meter niet geplaatst
Gegevens installatie	kWh meter nr. :	meterstand dag :	nacht :
	Bescherming aansluiting (A) : ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐	☐ kWh excl. nacht meter :	nr. :
	Ontworpen voor U _N : ☒ 230 V ☐ 3x230 V ☐ 3N400 V ☐	Type aardelektrode :	☒ aardingslus ☐ pen / baar
	Maximale nominale stroom (A) : ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐		☐
	Voedingsleiding hoofdbord : <u>4</u> X <u>16</u> mm ² - Type : <u>XVB</u>		
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroominrichting : <u>40</u> A / <u>300</u> mA	Aantal borden : <u>1</u>	Aantal eindstroombanen : <u>12</u>
☒ zie bijlage(n)			

Metingen - testen - controles - verzegeling :

☒ Rechtstreekse aanraking	☒ Onrechtstreekse aanraking	☒ Montage	☐ Toestellen	☒ Materieel	☒ I>/doorsnede	☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand : <u>14,7</u> Ω	☒ Algemeen isolatieniveau : <u>17</u> MΩ	☐ Controle foutlus	☒ Aardingscontinuïteit	☐ Test diff.		
Differentieelstroominrichting : ☐ was verzegeld ☒ werd verzegeld ☐ werd niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	☒ Nihil	
Inbreuken Bestaande installatie	☒ Nihil	
Opmerkingen	<u>Beurk, badkamer, verlichtings- en andere toestellen nog niet geplaatst.</u>	Visum DNB of aangestelde :
☐ Nihil		

Besluit(en) :

☒ De nieuwe installatie voldoet aan het AREI.
☐ De bestaande installatie voldoet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór

12/05/16 (*)

☐ door hetzelfde erkend organisme.



Agent bezoeker :

Naam : Sens T. Agent nr. : 3053 Datum : 12/05/16

Bijlage(n) : ☒ Situatieschema('s) : 2 ☒ Einddraadsschema('s) : 1 ☐


Voor de directeur generaal : Handtekening

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
☐ Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
☐ Wij raden U aan om het (de) schema('s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

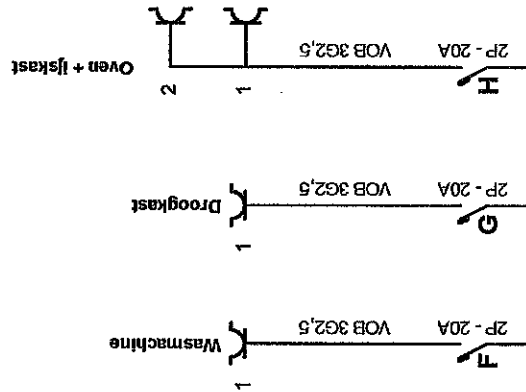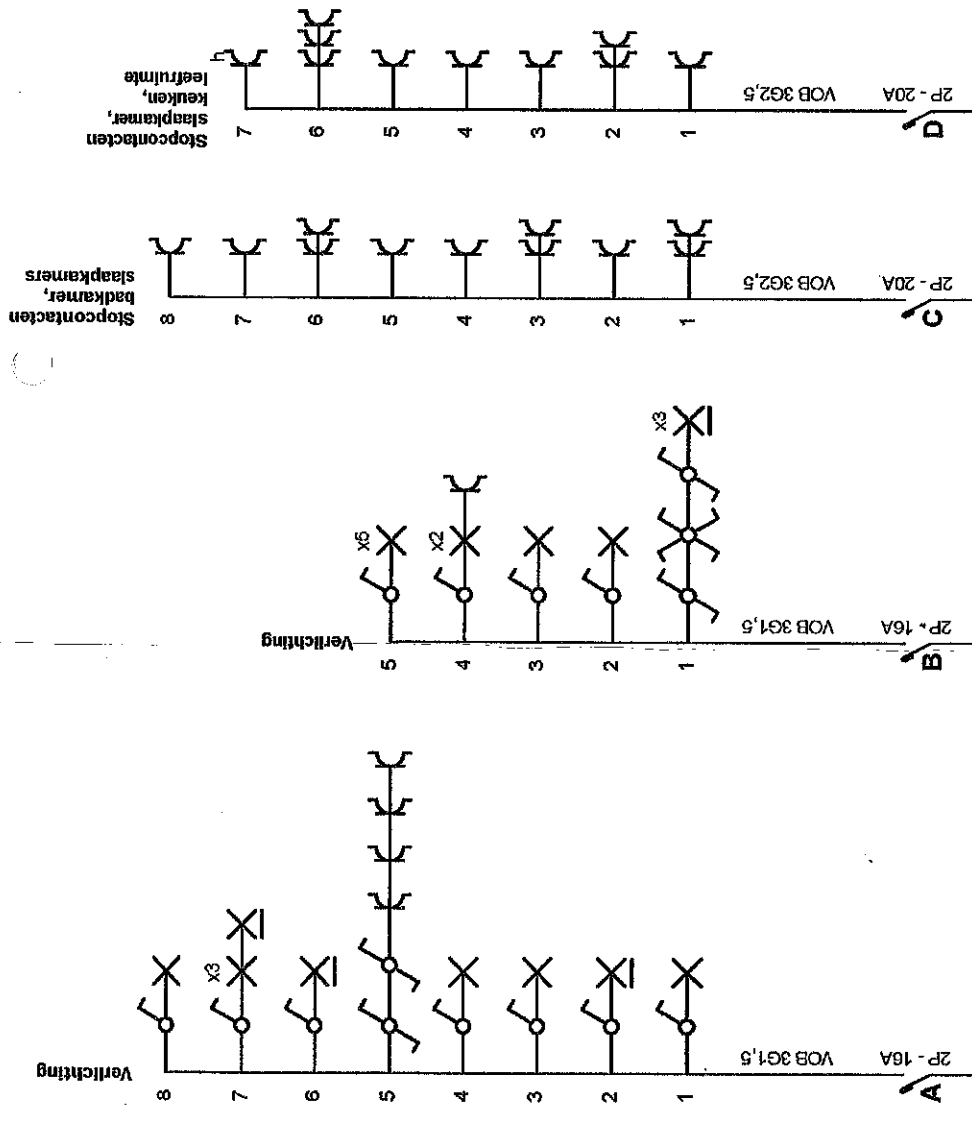

Verlichting

2P - 16A VOB 3G1,5



Stopcontacten, badkamer, slaapkamers

Stopcontacten, slaapkamer, keuken, leefruimte

Plaats van de elektrische installatie

Feryn app. 1.1
De Langelestraat 11-13
2290 Nieuw

Installateur
Gebroeders Minnen B.V.B.A.
Molsebaan 86 bus 1
2470 Retie


Tel.: 014 38 89 33 GSM: 0495 64 51 99
Fax: 014 74 84 74
e-mail: info@gebroedersminnen.be
BTW BE 0895.108.773

MINNEN
ELEKTRICITEITSWERKEN

p. 1/5
Eendraadschema
2 x 230V ~ 50Hz

2P

Δ300mA
2P - 40A




Plaats van de elektrische installatie
Feryn app. 1.1
De Langelestraat 11-13
2290 Nieuw

Installateur
Gebroeders Minnen B.V.B.A.
Molsebaan 86 bus 1
2470 Retie
Tel.: 014 38 89 33 GSM: 0495 64 51 99
Fax: 014 74 84 74
e-mail: info@gebroedersminnen.be
BTW BE 0895.108.773

p. 2/5
Eendraadschema
2 x 230V ~ 50Hz

MINNEN
ELEKTRICITEITSWERKEN



A Verlichting

B Verlichting

C Stopcontacten badkamer, slaapkamers

D Stopcontacten slaapkamer, keuken, leefruimte

F Wasmachine

G Droogkast

H Oven + ijskast

I Vaatwas

J CV - ketel

K Ventilatie

L Verdeelkast + garage

E Kookplaat

Plaats van de elektrische installatie

Ferny app. 1.1

De Langelestraat 11-13

2290 Niel

Installateur

Gebroeders Minnen B.V.B.A.

Molsebaan 86 bus 1

2470 Retie

Tel.: 014 38 89 33 GSM: 0495 64 51 99

Fax: 014 74 84 74

e-mail: info@gebroedersminnen.be

BTW BE 0895.108.773

p. 5/5
Lijst Kringen

2 x 230V ~ 50Hz

MINNEN
ELEKTRICITEITSWERKEN
