

DE INSTALLATIE IS CONFORM

Het onderzoek gebeurt volgens werkinstructie 10le006 of 10le008 op basis van de hieronder vermelde voorschriften.

Uw controle werd uitgevoerd door BTV VZW, kantoor BTV Antwerpen, Van der Sweepstraat 3, 2000 ANTWERPEN
T: 03 216 28 90, E: btv.antwerpen@btvcontrol.be

Verslagnummer: 0043-160624-01 Datum van het onderzoek : 24/06/2016
Extra controle datums

ALGEMENE GEGEVENS:

ADRES INSTALLATIE : LUC HUYGEN
KAREL WEYLERSTRAAT 4, GELIIKVLOERS
2020 ANTWERPEN

Visualisatie van de installatie


EIGENAAR : LUC HUYGEN
Adres : JONKER VAN DE NOOTSTRAAT 6
2050 ANTWERPEN

OPDRACHTGEVER : LYSEN GILBERT TECHNO b.v.b.a.
Adres : STEENBAKKERIJEN 70/301
2845 NIEL

INSTALLATEUR : LYSEN GILBERT TECHNO b.v.b.a.
Adres : STEENBAKKERIJEN 70/301
2845 NIEL

BTW of IK : BE0897.818.835.

EAN : / Teller nr. 33928620. Index : 013360,9.

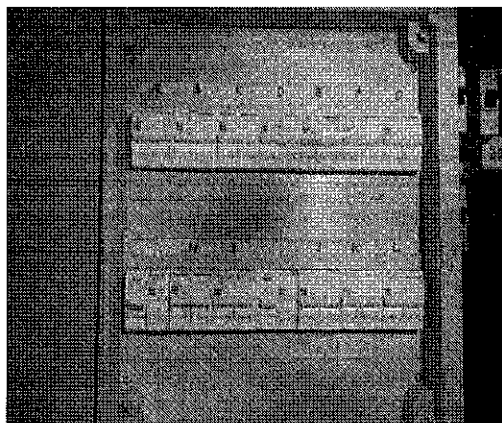

ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN:

Aard installatie :	Uitbreiding / Wijziging /	Type der Lokalen :	Appartement Gelijkvloers
Begin werken fundering:	Voor 01/10/81	Elektrische installatie :	Voor & Na 01/10/81
Aansluiting spanning :	Mono 230V	AREI art. :	86
Voedingskabel hoofdbord :	2 x 10 mm ²	Bescherming van de aansluiting :	Gi2/40 A
Type van de aardelektrode:	Baren	Alg. schakelaar: type :	2p 40A/300mA
Aantal borden :	1	Aantal eindstroombanen :	12
Uitwendige invloedsfactoren :	N.v.t.	Schema :	TT

ONDERZOEK:

Controlebezoek volgens : AREI art. 270, AREI art. 278
Aard van het onderzoek : Gelijkvormigheidsonderzoek en Controle bezoek

METINGEN:

RA: 29,5 Ohm RI tot 100 MOhm

BESCHRIJVING:

Zie ééndraadschema en situatieschema in bijlage.

VASTGESTELDE INBREUKEN

Geen

NOTA'S

- 1 Stopcontacten en verlichting zonder aarding, enkel voor gebruik toestellen klasse 2.

Besluit

De installatie is conform.

De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld.

De ééndraads - en situatieschema's werden voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 24.06.2041 (art. 271 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De agent-onderzoeker,
0043 KURT VAN ASCH

voor De Directeur,



UITGEVOERDE CONTROLES

Tijdens het controleonderzoek van huishoudelijke installaties (art. 271)

- de controle van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's;
 - de controle van de staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrisch materieel in het bijzonder wat betreft de schakelaars, de stopcontactdozen, de aansluitingen in de verdeelborden,...;
 - de controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking;
 - de controle van de werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting;
 - de controle van de foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom van minimum 2,5 maal de gevoeligheid van het apparaat;
 - de controle van de continuïteit van de equipotentiële verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse 1
 - de visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen;
 - de visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
- Behoudens inbreuken, wordt de overeenstemming bevestigd tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstromen en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.

Plichten van de Eigenaars, Beheerders, Huurders

- de verplichting het proces-verbaal van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie samen met de ééndraadschema's en de situatieplannen;
- de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden;
- de verplichting de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit;
- de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

Betekenis van de nota's: betreffen gebreken die geen invloed hebben op de besluitvorming, vaststellingen die buiten het kader van onderzoek vallen maar een gevaar inhouden voor de veiligheid, of organisatorische gegevens.

WELKE STAPPEN NEMEN ALS INSTALLATIE CONFORM IS

STAP 1

Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's.

STAP 2

Bij belangrijke uitbreidingen van de installatie, laat opnieuw controleren.





STAP 3

Een herkeuring van de installatie is verplicht voor 24.06.2041.

STAP 4

BTV Antwerpen staat tot uw dienst voor de noodzakelijke keuringen.

Schema's



Luc Huyghe

Van: Claudia Wils <Claudia.Wils@btvcontrol.be>
Verzonden: maandag 27 juni 2016 11:47
Aan: lyseng@pandora.be
CC: Kurt Van Asch
Onderwerp: verslag Karel Weylerstraat 4 in Antwerpen
Bijlagen: 0043-160624-01.pdf

Beste,

Hierbij zenden wij u bovenvermeld verslag.

Met vriendelijke groeten, Meilleures salutations,

Claudia Wils | Planning elektriciteit - CIB



BTV | Technisch Bureau Verbruggen vzw | Bureau Technique Verbruggen asbl
Erkend Controleorganisme | Externe Dienst voor Technische Controles
Organisme de contrôle agréé | Service Externe pour les Contrôles Techniques

Van der Sweepstraat 3 | 2000 Antwerpen


T 03 216 28 90 | F 03 238 86 65 | www.btvcontrol.be

Al onze contracten zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden van BTV.
Tous nos contrats commerciaux sont soumis aux conditions générales de BTV.

BTV Café Oost-Vlaanderen 21 juni 2016 - brouwerij Liefmans "Wat zijn de uitdagingen vandaag voor elektriciens op technisch vlak?"	REGISTREER VIA http://bit.do/btvcafe_OVL BTV
** ER ZIJN HELAAS GEEN PLAATSEN MEER VRIJ VOOR HET BTV CAFE IN ANTWERPEN OP 16 JUNI **	

EIGENAAR	Huygen Luc
ADRES	Jonker van de Nootstraat 6 2050 Antwerpen
DATUM	22-06-2016
HANDTEKEN	

INSTALLATEUR	BVBA Lysen Gilbert Techno
ADRES	Steenbakkerijen 70-301 2845 Niel
BTW	BE 0897 818 835

DATUM	20-06-2016
HANDTEKEN	


NAAM	K. Van Aarts
ORGANISME	PTV
NUMMER	43


DATUM	24-06-2016
HANDTEKEN	

K. Vap-Asch
BTV 43

datum: 24.06.16

Gelijkvloers

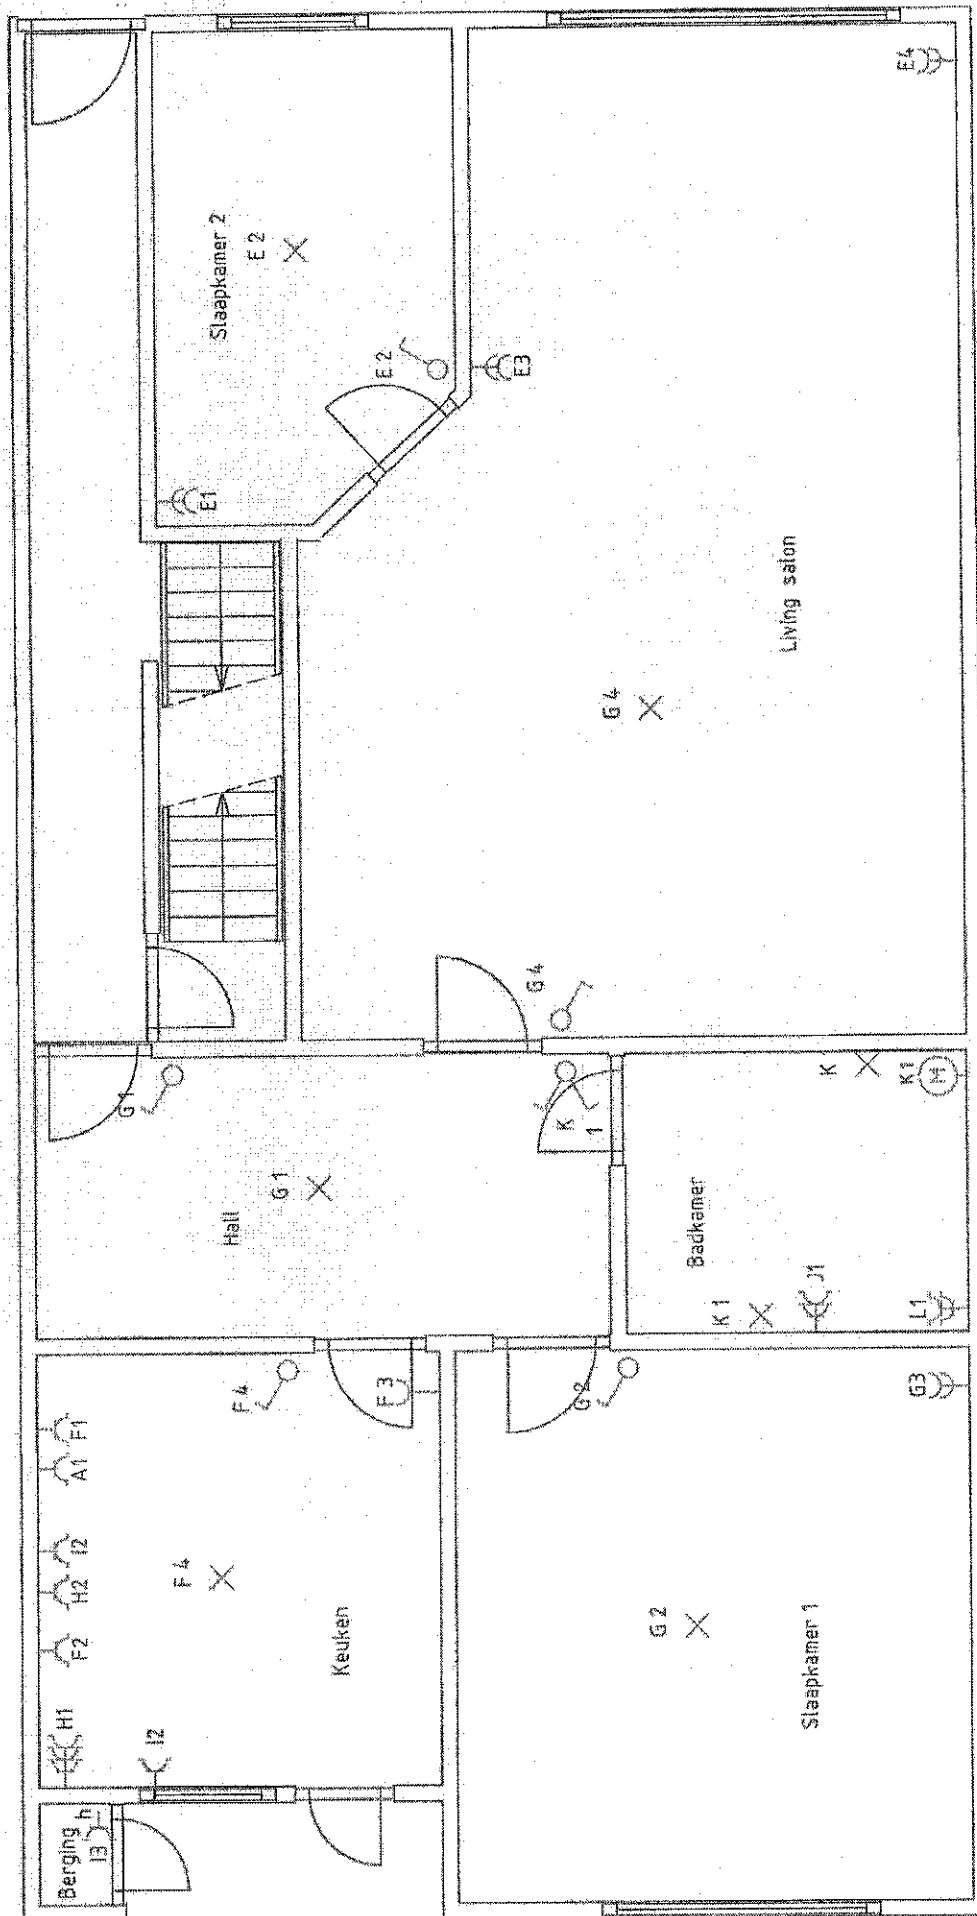

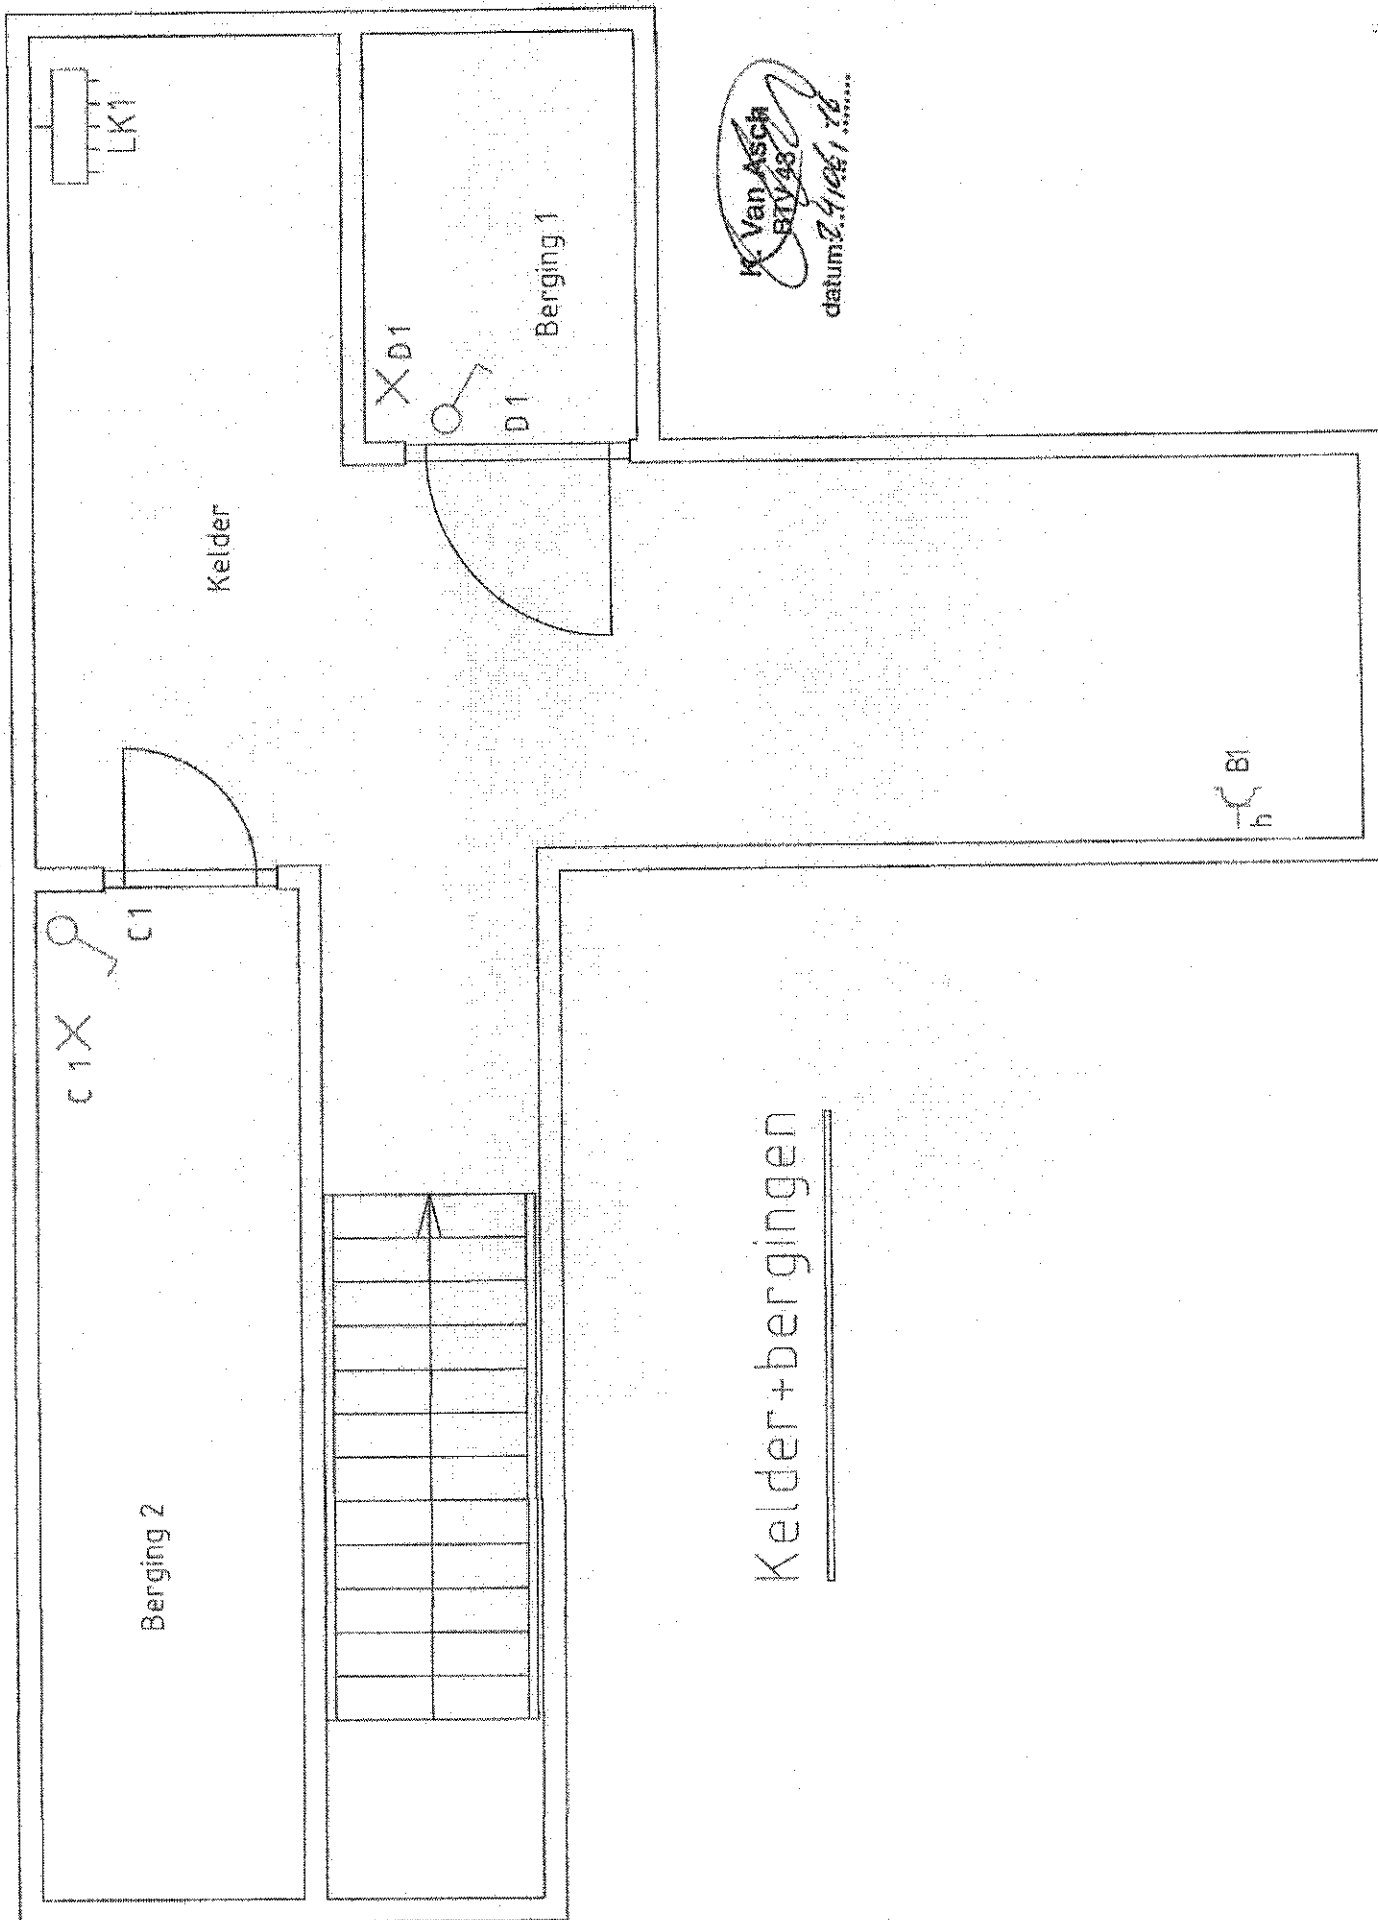

K. Van Asch
BTY 43
datum 2.4.08, 2008

LK1 appartement gelijkvloers

