

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 24/07/2026

Inspecteur: Henk Pemen

Mentor:

Installateur: Project Nekton

ID-label:

B.T.W. nr.:BE 0719 685 164

Klantreferentie:

Merk en type meettoestel: Metrel
ET61557

Serienummer: 19370719

Datum verslag: 05/08/2026

Dit rapport vervangt rapport met rapportnummer 2449703

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Abelenstraat
Huisnummer 54
Busnummer
Postcode 2640
Gemeente MORTSEL
Land België

Eigenaar

Naam Guy Van Den Bogaert
Straatnaam Satenrozen
Huisnummer 6A
Busnummer
Postcode 2550
Gemeente Kontich
Land België

Installateur

Naam Project Nekton
BTW nr. BE 0719 685 164
Telefoonnummer +32 468 12 37 03
E-mail cedric@projectnekton.be

Type : woning

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

EAN : 541448820046740548

Teller Nr.: : 1SAG3100744607



Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 3N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 32 A

Aantal borden: 2

Aantal kringen: 22



Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Ri algemeen: 2,89 MΩ

RE: 3,04 Ω

OK

OK

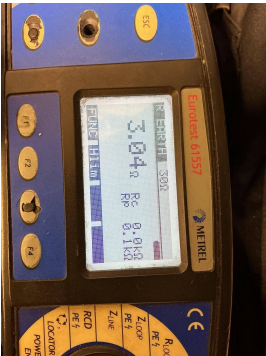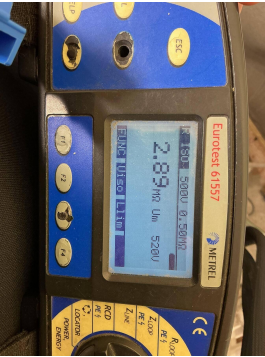

DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

Δ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _{Δt}	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A		OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A		OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A		OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A		OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
Zie schema's	-	-		-	-
Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	NVT		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

- N2 Geen inbreuken vastgesteld.
- N4 De controle omvat enkel het woongedeelte van het pand.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 24/7/2051
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema('s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 12:30 tot 13:15
De inspecteur Henk Pemen

Henk Pemen
ACEG VZW - 413

Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechte­re­eks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.


Kwaliteit
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 24/7/2051	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.




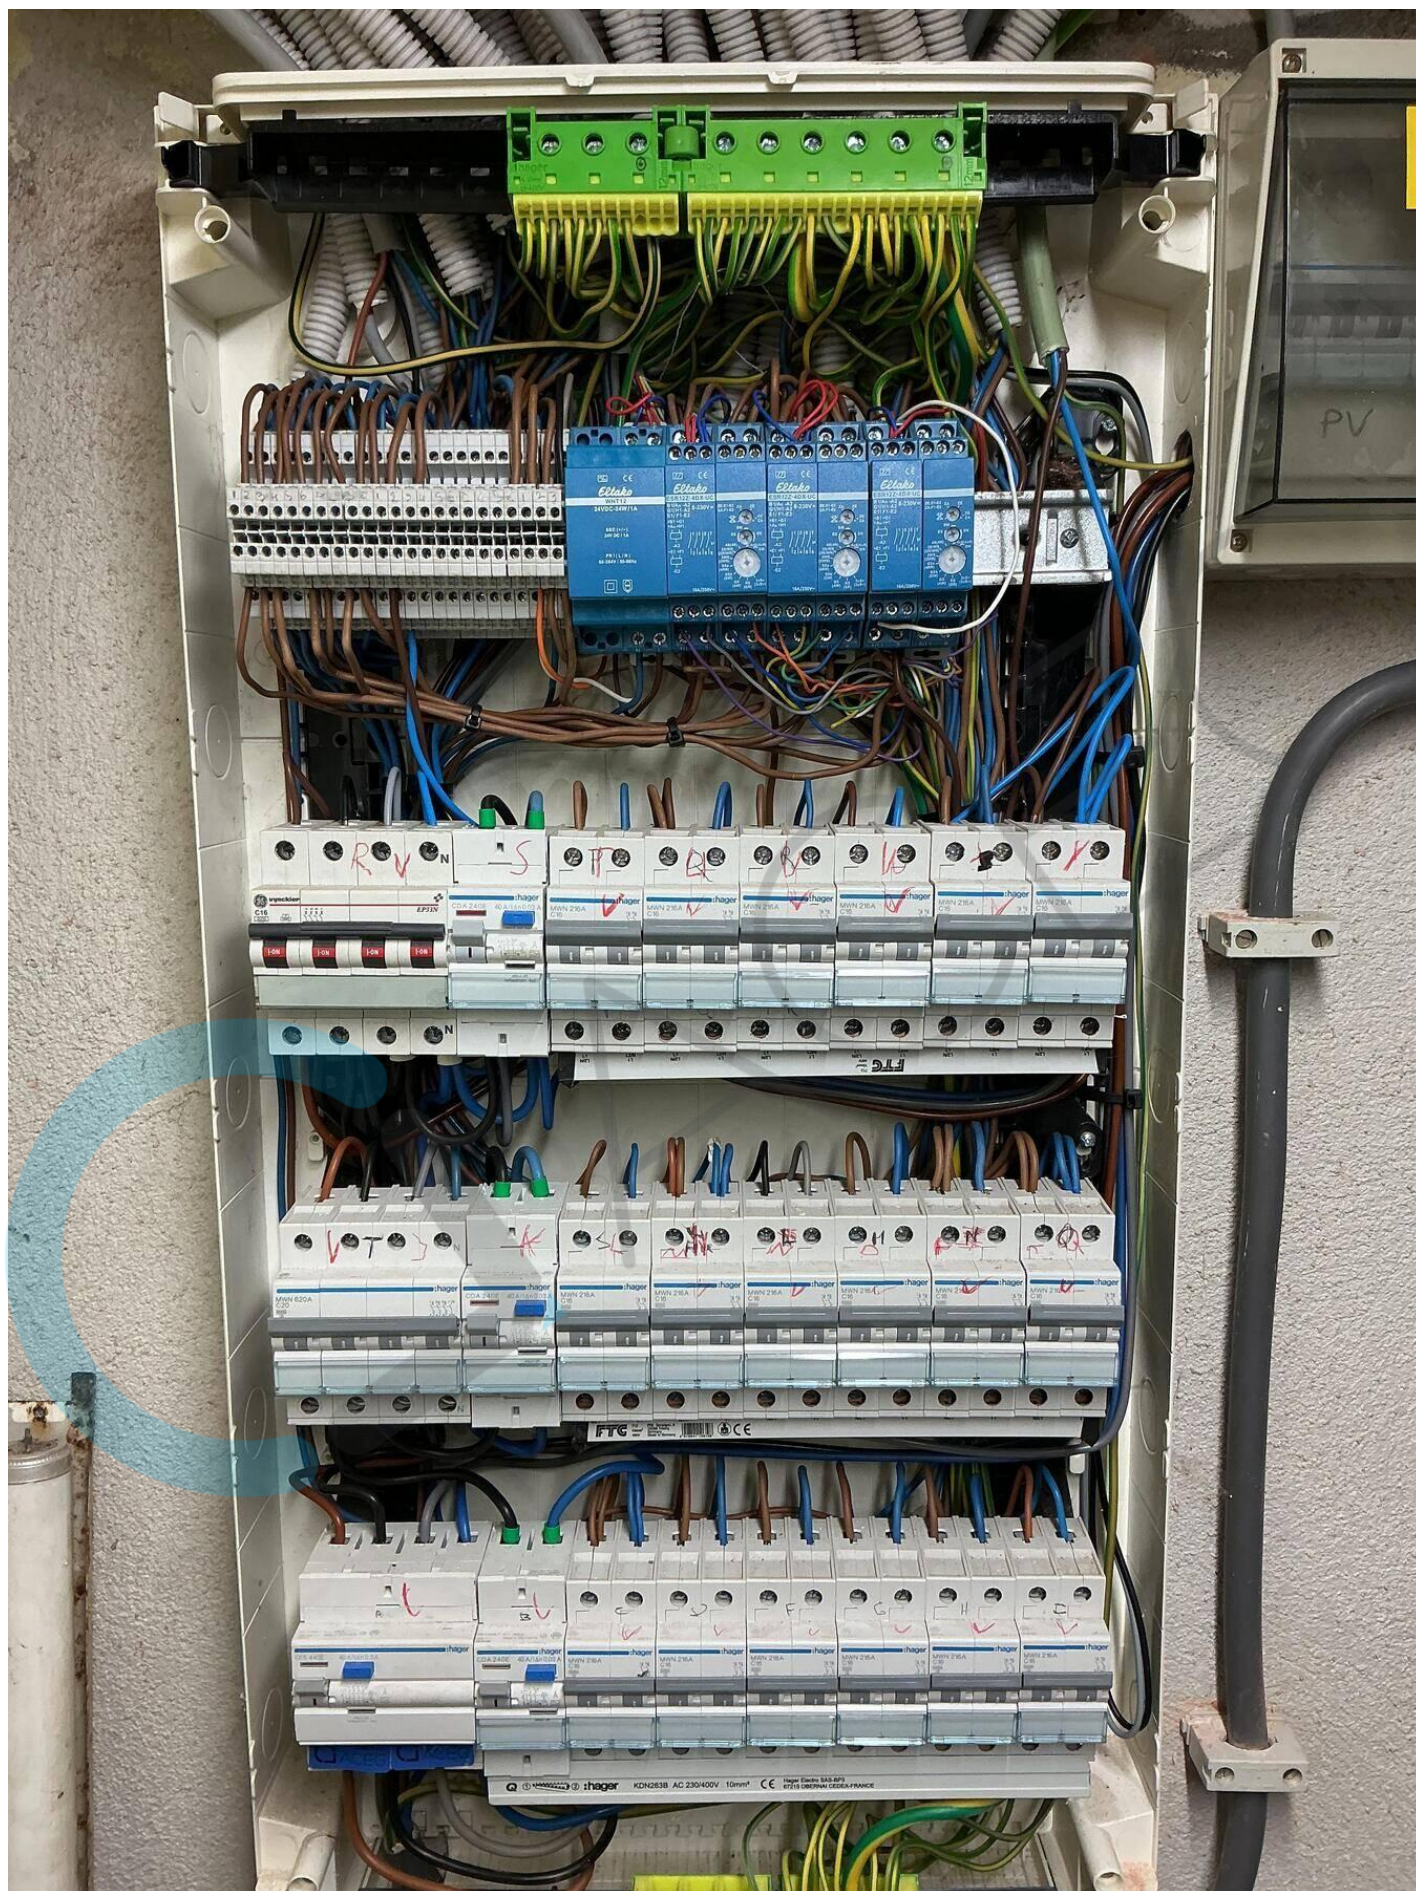








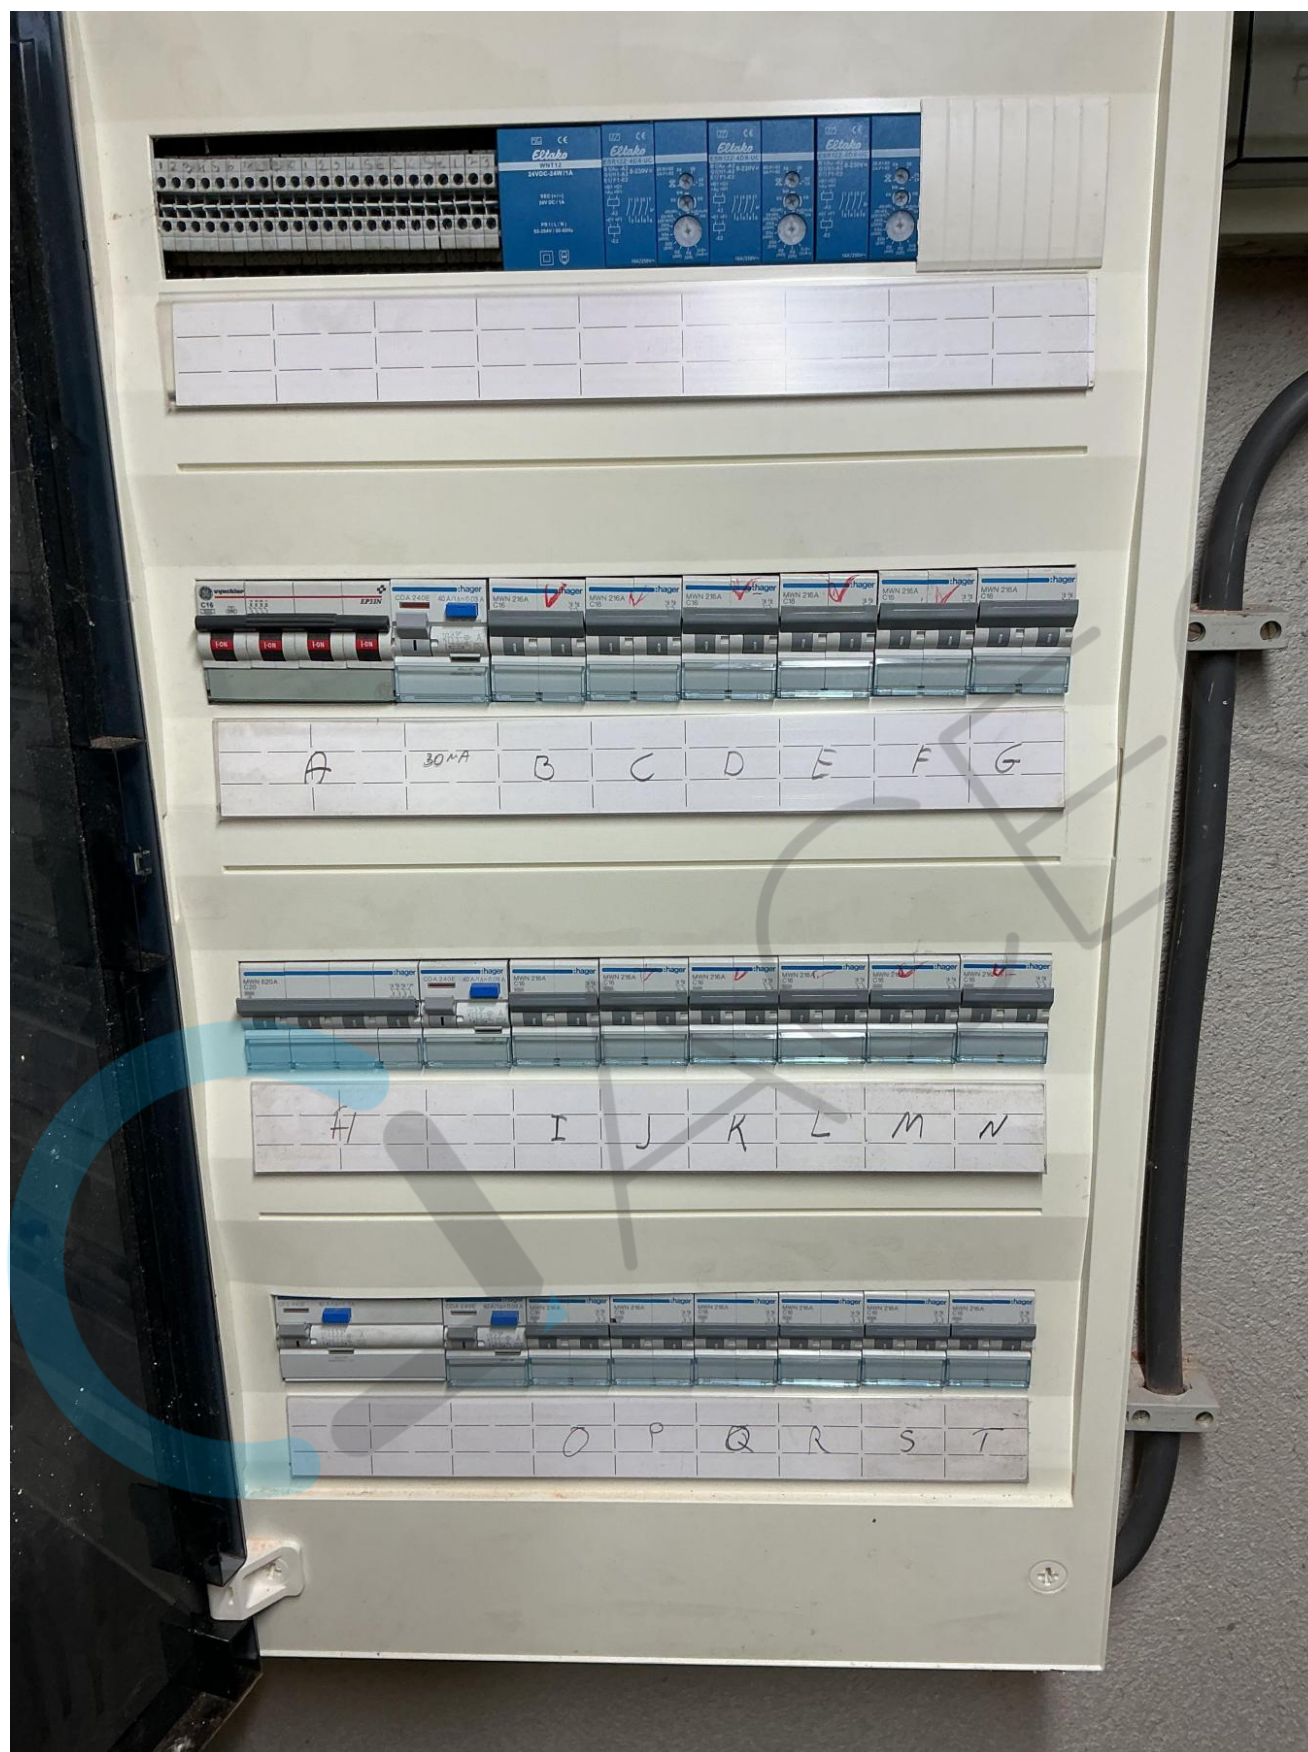

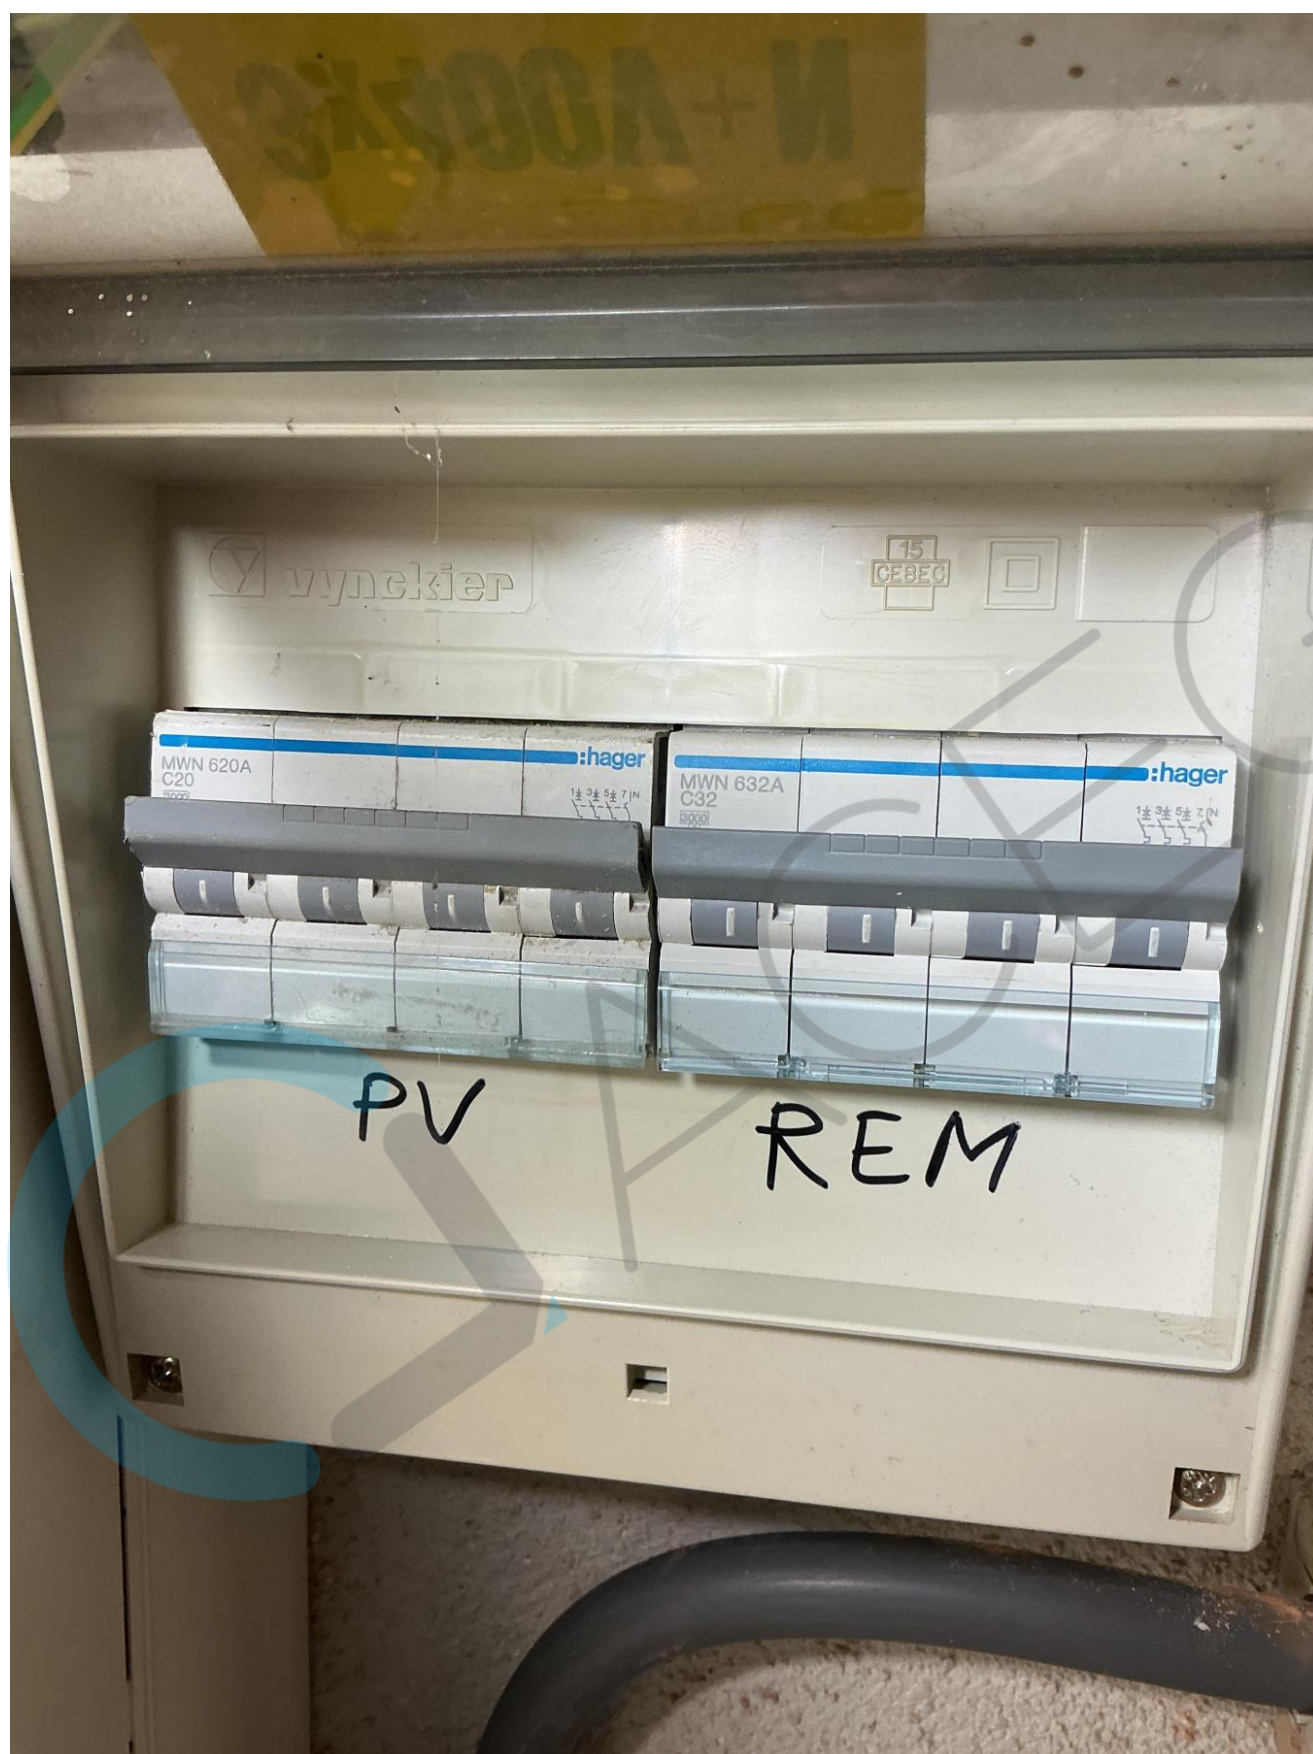













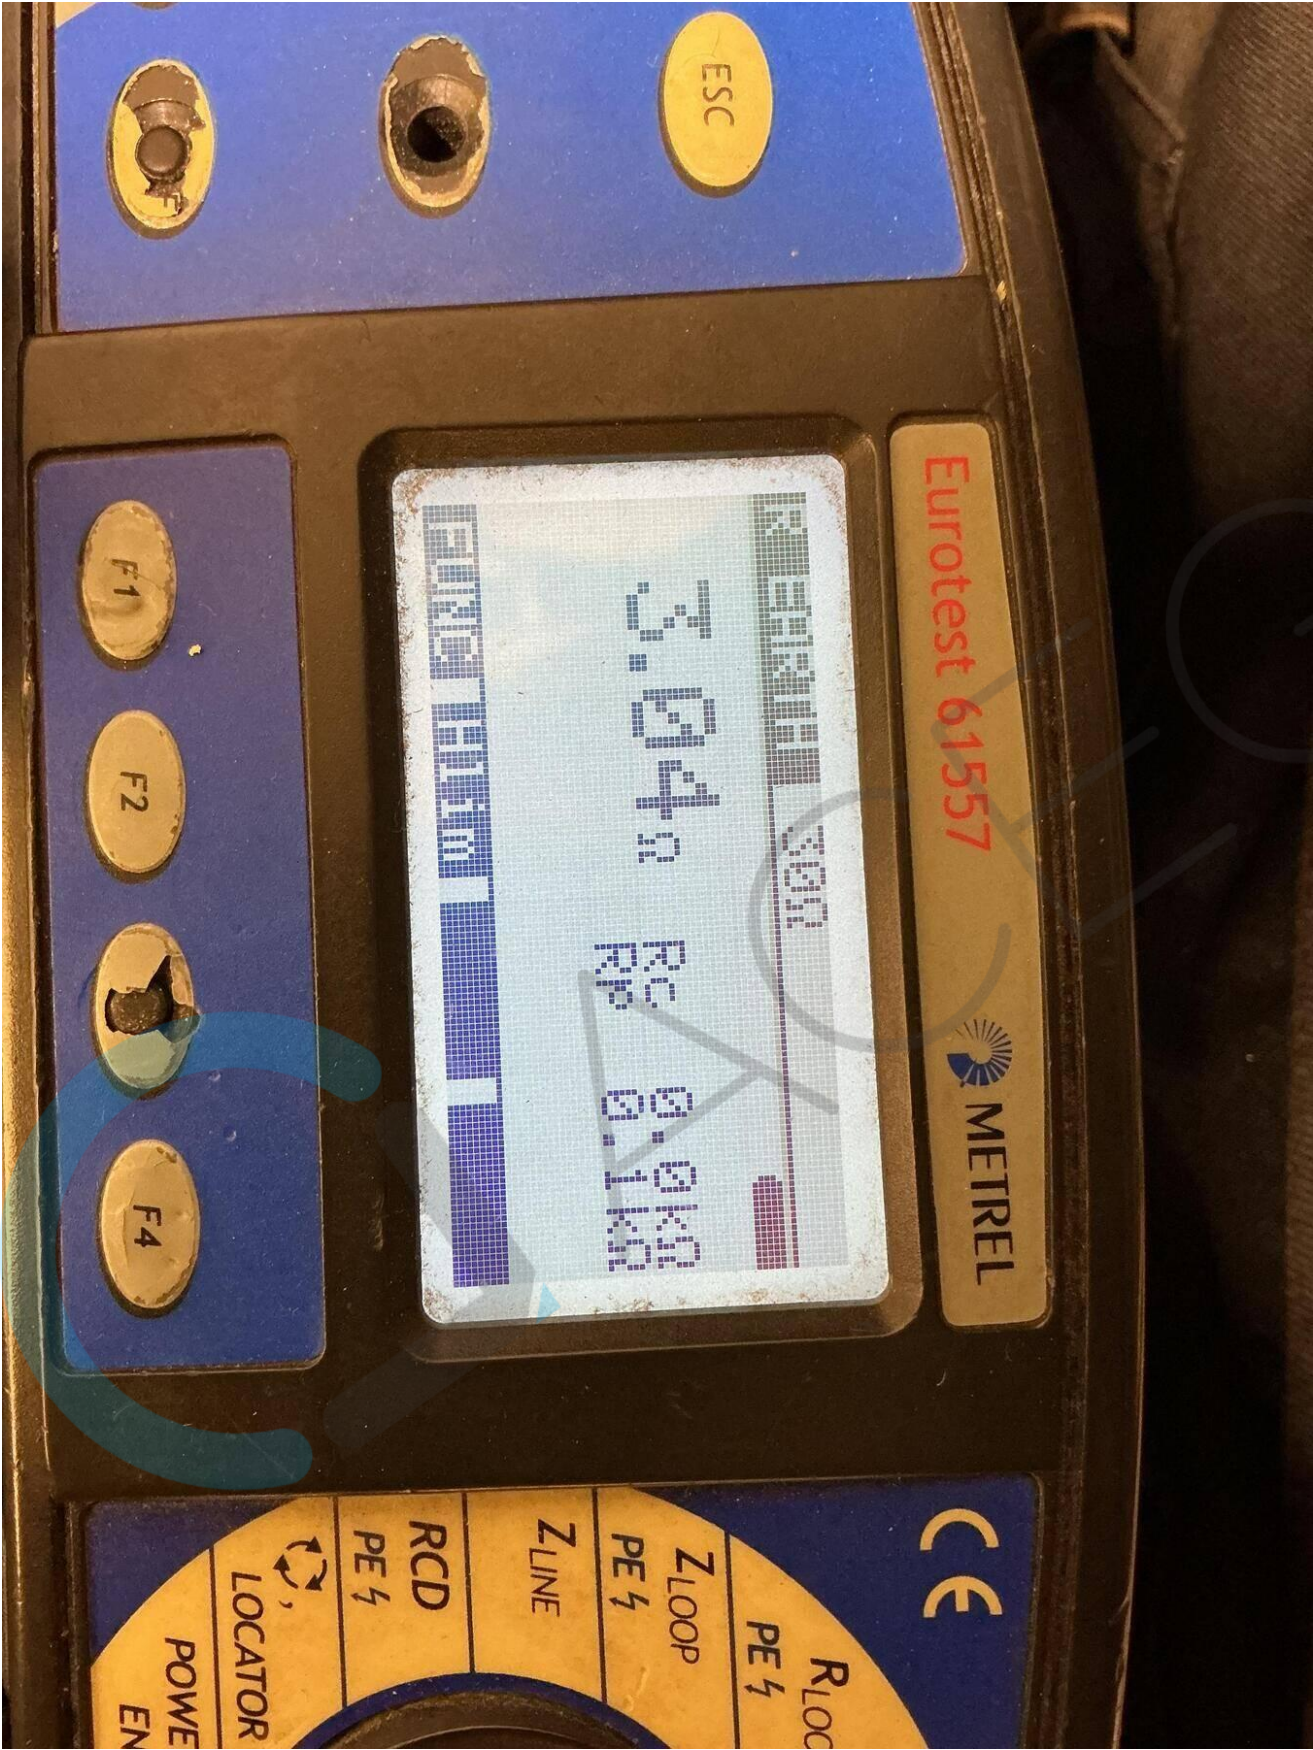



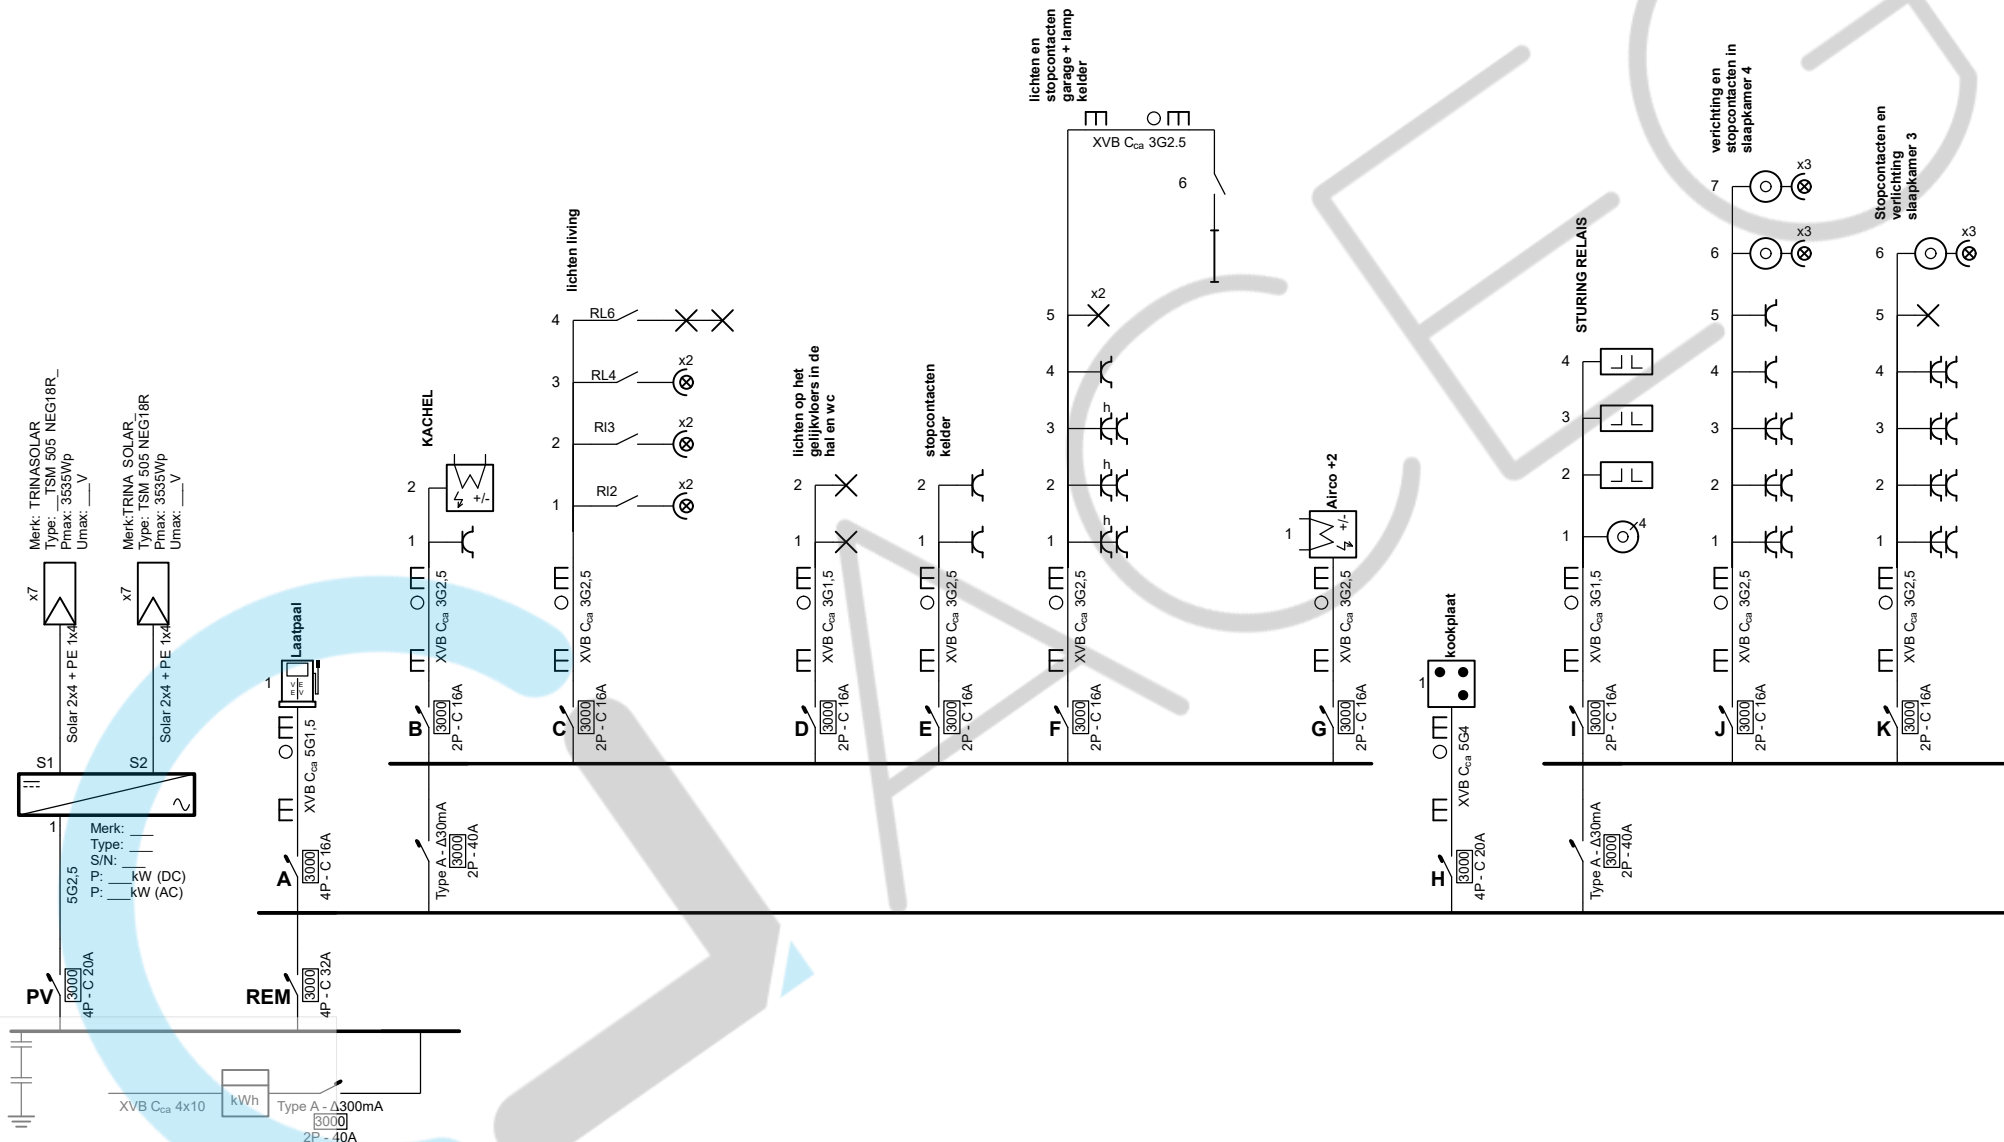

Plaats van de elektrische installatie


Guy
Abelenstraat 54
2640 Mortsel

Installateur

Project Nekton bv
Abelenstraat 54
2640 Mortsel
GSM: +32 468 12 37 03
e-mail: info@projectnektion.com
BTW BE 0719.685.164

p. 1/7 Eendraadschema

2 x 230V ~ 50Hz

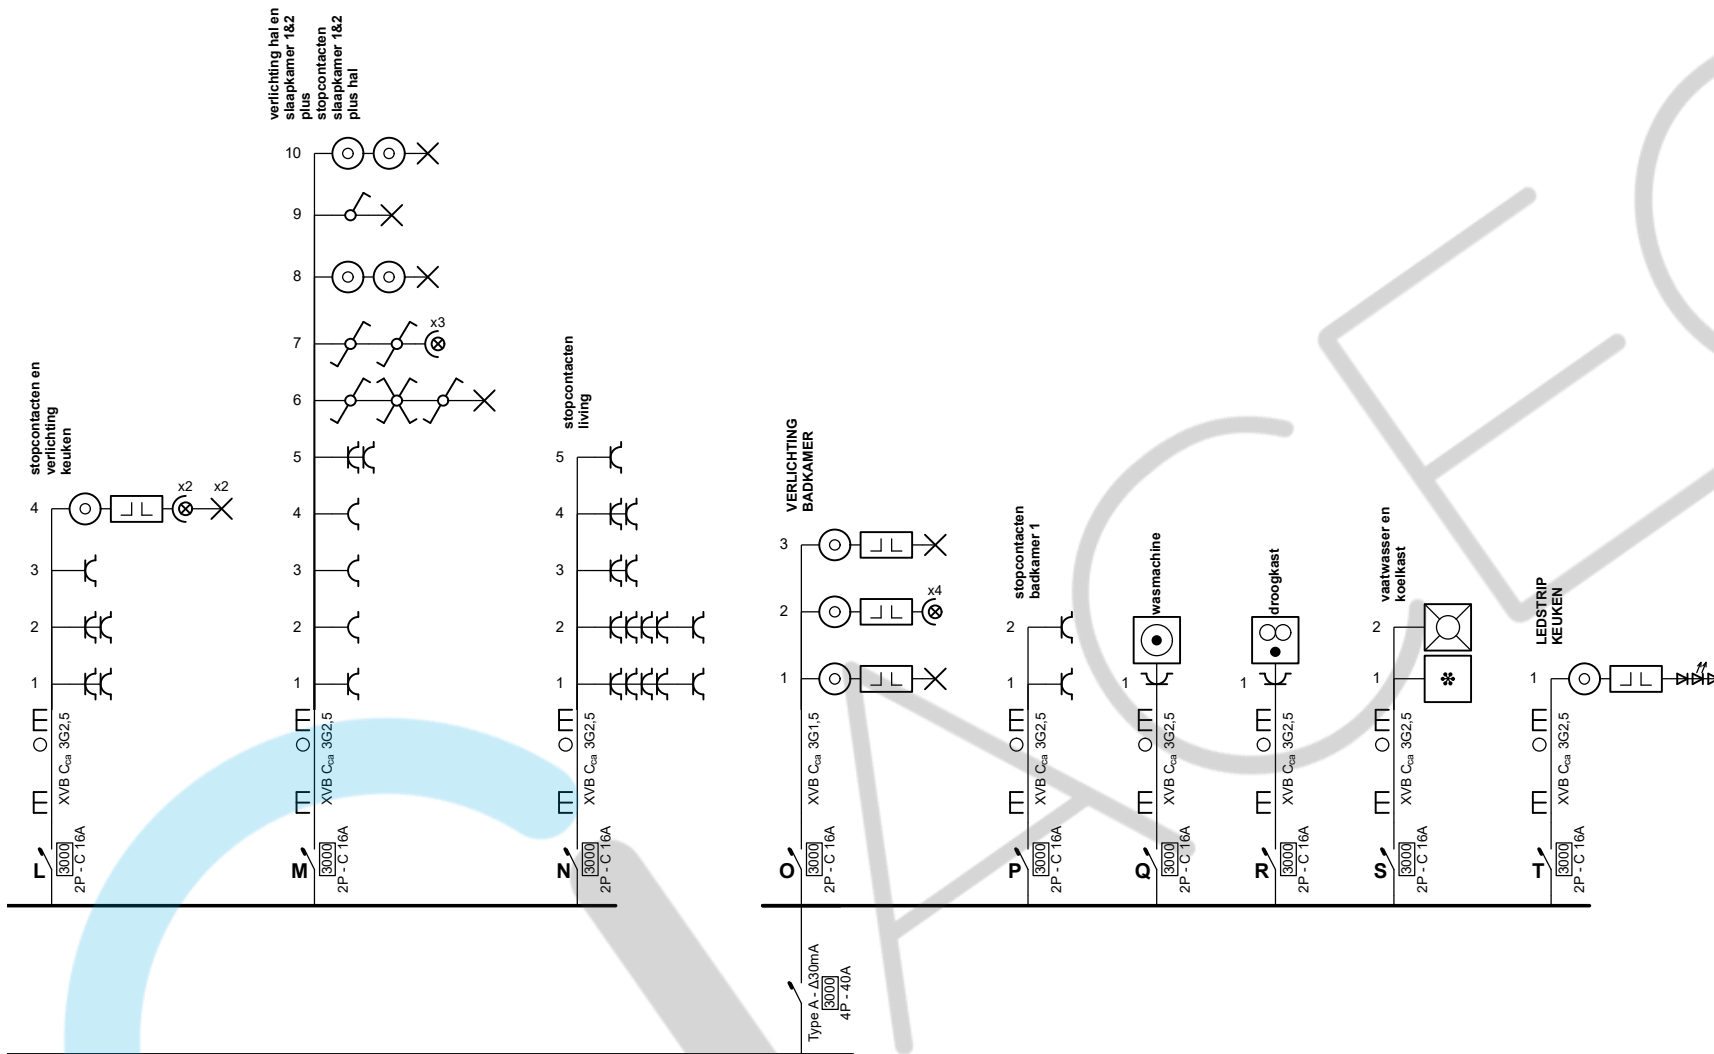

Plaats van de elektrische installatie

Guy
Abelenstraat 54
2640 Mortsel

Installateur

Project Nekton bv
Abelenstraat 54
2640 Mortsel
GSM: +32 468 12 37 03
e-mail: info@projectnektion.com
BTW BE 0719.685.164

p. 2/7 Eendraadschema

2 x 230V ~ 50Hz

Henk Pemen
ACEG VZW - 413

05/08/2026



Plaats van de elektrische installatie

Guy
Abelenstraat 54
2640 Mortsel

Installateur


Project Nekton bv
Abelenstraat 54
2640 Mortsel
GSM: +32 468 12 37 03
e-mail: info@projectnektion.com
BTW BE 0719.685.164

**p. 3/7
Situatieplan**

2 x 230V ~ 50Hz

Henk Pemen
ACEG VZW - 413

05/08/2026

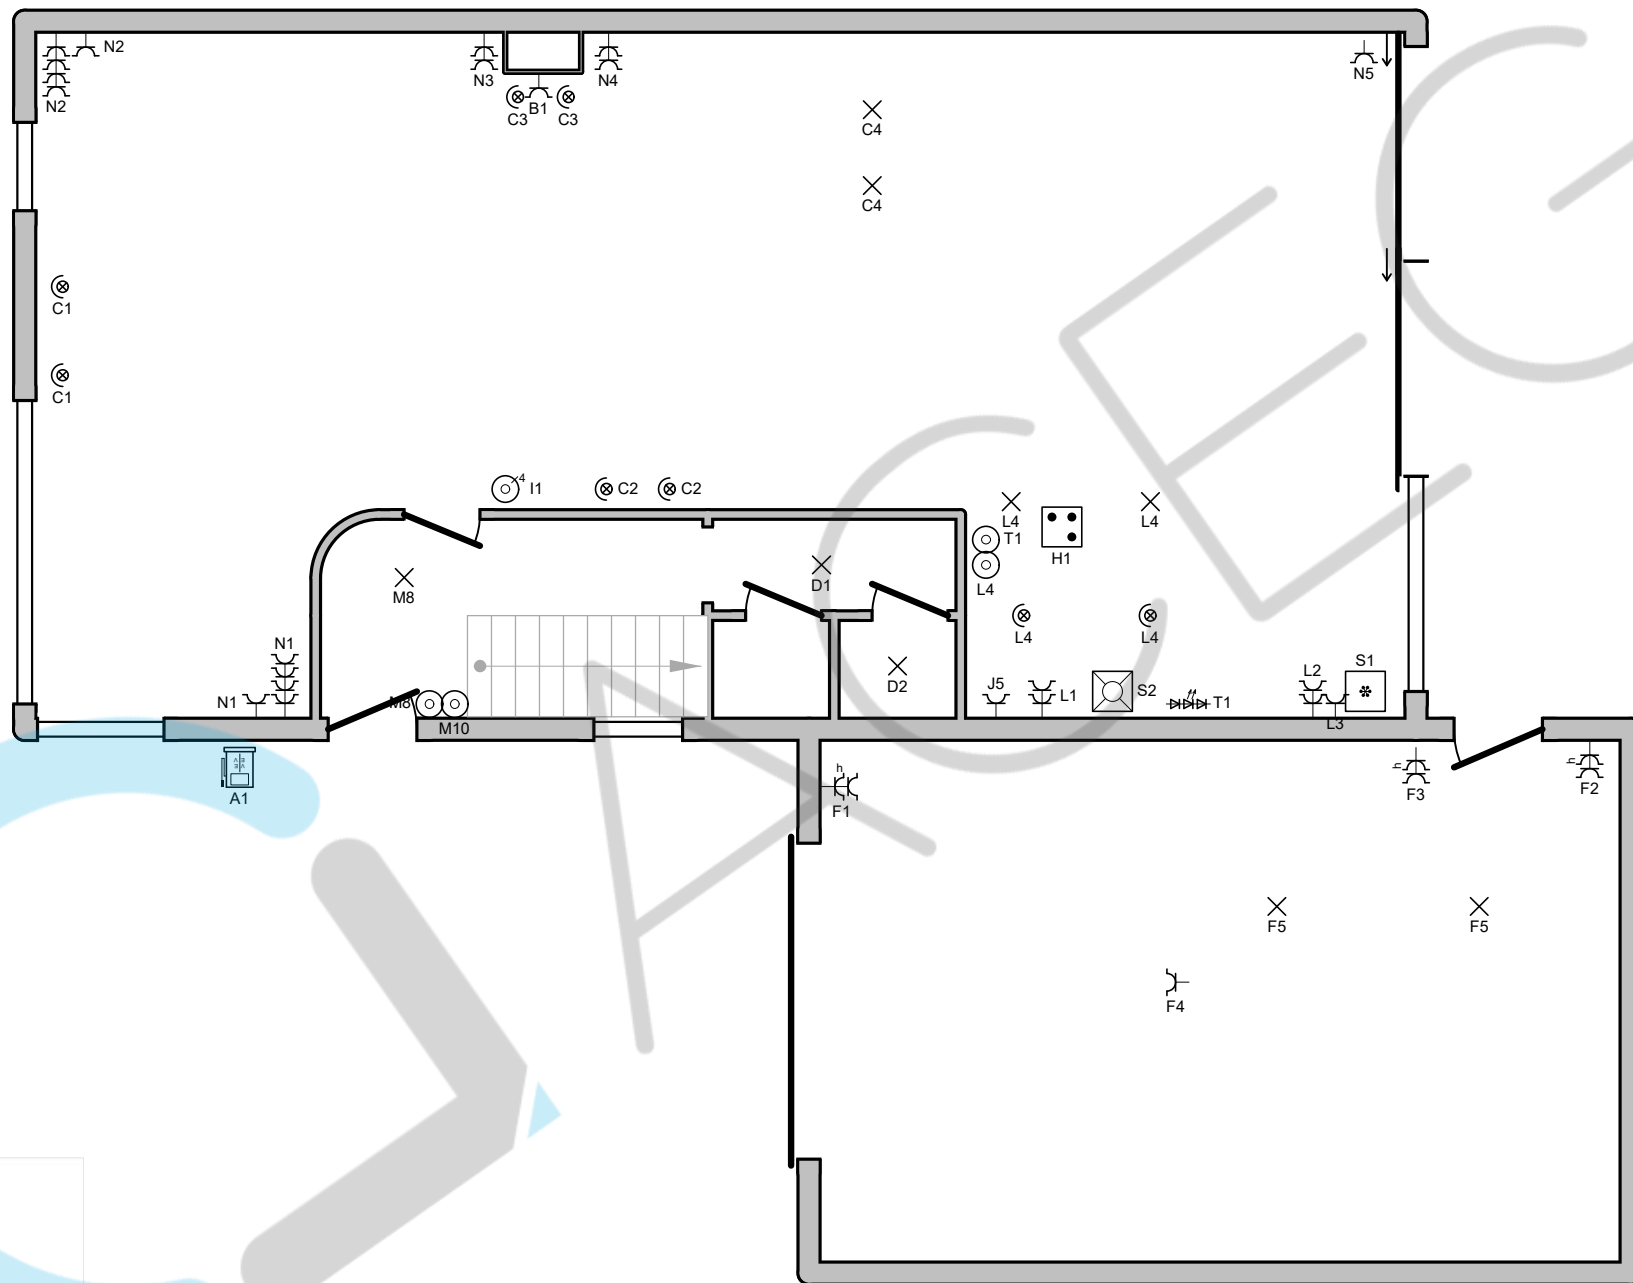

Plaats van de elektrische installatie

Guy
Abelenstraat 54
2640 Mortsel

Installateur


Project Nekton bv
Abelenstraat 54
2640 Mortsel
GSM: +32 468 12 37 03
e-mail: info@projectnektion.com
BTW BE 0719.685.164

p. 4/7 Situatieplan

2 x 230V ~ 50Hz

Henk Pemen
ACEG VZW - 413

05/08/2026

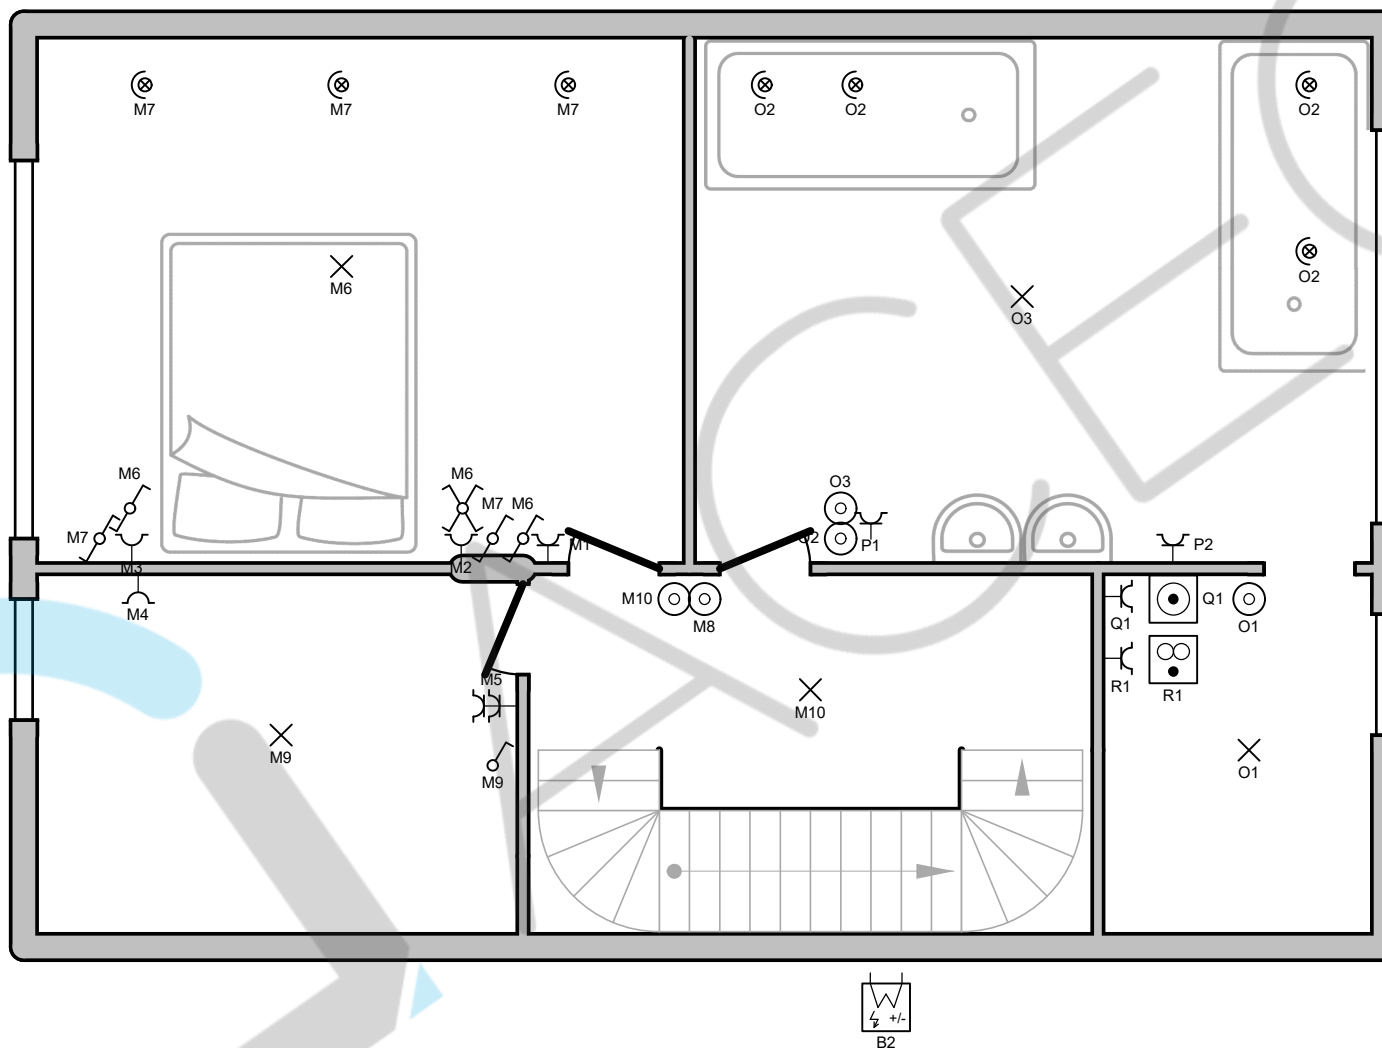

Plaats van de elektrische installatie

Guy
Abelenstraat 54
2640 Mortsel

Installateur


Project Nekton bv
Abelenstraat 54
2640 Mortsel
GSM: +32 468 12 37 03
e-mail: info@projectnektion.com
BTW BE 0719.685.164

p. 5/7 Situatieplan

2 x 230V ~ 50Hz

Henk Pemen
ACEG VZW - 413

05/08/2026

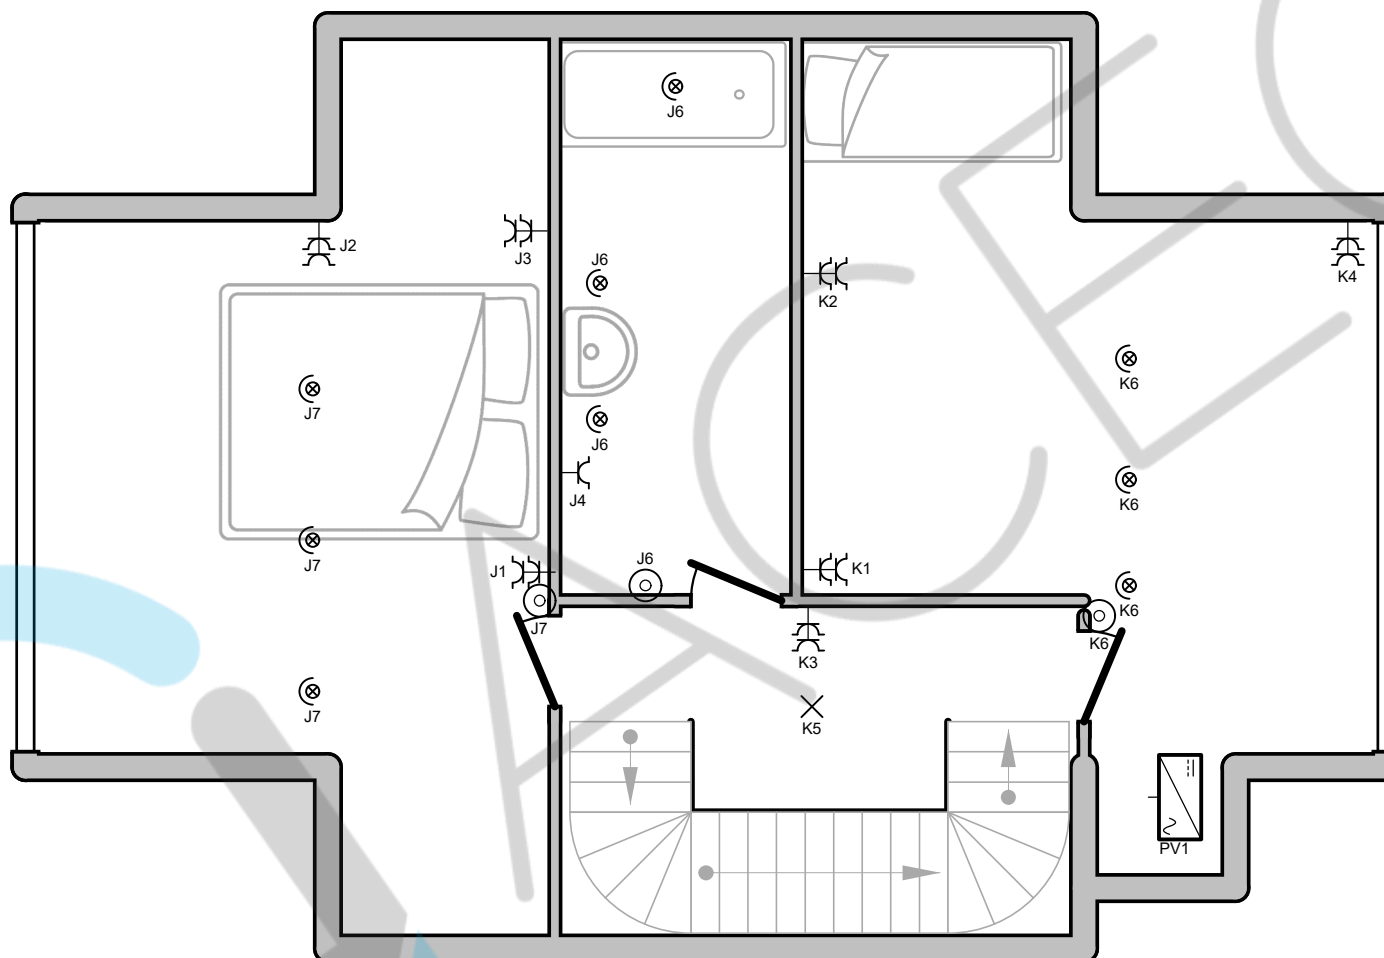

Plaats van de elektrische installatie

Guy
Abelenstraat 54
2640 Mortsel

Installateur

Project Nekton bv
Abelenstraat 54
2640 Mortsel
GSM: +32 468 12 37 03
e-mail: info@projectnektion.com
BTW BE 0719.685.164

p. 6/7 Situatieplan

2 x 230V ~ 50Hz

Henk Pemen
ACEG VZW - 413

05/08/2026

PV

REM

A Laatpaal

B KACHEL

C lichten living

D lichten op het gelijkvloers in de hal en wc

E stopcontacten kelder

F lichten en stopcontacten garage + lamp kelder

G Airco +2

H kookplaat

I STURING RELAIS

J verichting en stopcontacten in slaapkamer 4

K Stopcontacten en verlichting slaapkamer 3

L stopcontacten en verlichting keuken

M verlichting hal en slaapkamer 1&2 plus stopcontacten slaapkamer 1&2 plus hal

N stopcontacten living

O VERLICHTING BADKAMER

P stopcontacten badkamer 1

Q wasmachine

R droogkast

S vaatwasser en koelkast

T LEDSTRIP KEUKEN

Plaats van de elektrische installatie

Guy
Abelenstraat 54
2640 Mortsel

Installateur

Project Nekton bv
Abelenstraat 54
2640 Mortsel
GSM: +32 468 12 37 03
e-mail: info@projectnektion.com
BTW BE 0719.685.164

p. 7/7
Lijst Kringen

2 x 230V ~ 50Hz

Henk Pemen
ACEG VZW - 413

05/08/2026
