



Beter gekeurd
Bien vérifié

PROCES-VERBAAL VAN HET ONDERZOEK VAN
EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

DE INSTALLATIE IS CONFORM

Het onderzoek gebeurt volgens werkinstructie 10le006 of 10le008 op basis van de hieronder vermelde voorschriften.

Uw controle werd uitgevoerd door BTV VZW, kantoor BTV Antwerpen, Noorderlaan 109 bus 5, 2030 ANTWERPEN
T: 03 216 28 90, E: btv.antwerpen@btvcontrol.be

Verslagnummer: 0344-191014-05_01 Datum van het onderzoek: 14/10/19
Extra controle datums:

ALGEMENE GEGEVENS:

ADRES INSTALLATIE : LECONTE
DEURNestraat 166
2640 MORTSEL

Visualisatie van de installatie

EIGENAAR : LECONTE
Adres : BEAULIEU 12
6972 ERNEUVILLE

OPDRACHTGEVER : GLASNOST
Adres : PIETER REYSPENSLEI 32
2640 MORTSEL

INSTALLATEUR : GLASNOST
Adres : PIETER REYSPENSLEI 32
2640 MORTSEL

BTW of IK :

EAN : **Teller nr.** 6012066 **Index :**

ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN:

Aard installatie :		Type der Lokalen :	wooneenheid
Begin werken fundering:	Voor	Elektrische installatie :	Na
Aansluiting spanning :	3x230V	AREI art. :	86
Voedingskabel hoofdbord :	4 x 10 mm ²	Bescherming van de aansluiting :	40 A
Type van de aardelektrode:	Lus	Alg. schakelaar: type :	2p 40A/300mA
Aantal borden :	1	Aantal eindstroombanen :	8
Uitwendige invloedsfactoren :		Schema :	TT

ONDERZOEK:

Controlebezoek volgens : AREI art. 276,

VMA - 48.5

MA-LS-02/2015



1 / 3

Aard van het onderzoek : Controlebezoek

METINGEN:

RA: 1 Ohm RI tot >1 MOhm

BESCHRIJVING:

Zie eendraadsschema en situatieschema.

VASTGESTELDE INBREUKEN

Geen

NOTA'S

1 Dit verslag vervangt verslag 0344-191014-05. Het vorige verslag dient vernietigd te worden.

BESLUIT

De installatie is conform.

De ééndraads - en situatieschema's werden voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 14/10/2044 (art. 271 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De agent-onderzoeker,
0344 LUDO DE GROOTE

voor De Directeur,



UITGEVOERDE CONTROLES

Tijdens het controleonderzoek van huishoudelijke installaties (art. 271)

- a) de controle van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's;
 - b) de controle van de staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrisch materieel in het bijzonder wat betreft de schakelaars, de stopcontactdozen, de aansluitingen in de verdeelborden,...;
 - c) de controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking;
 - d) de controle van de werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting;
 - e) de controle van de foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom van minimum 2,5 maal de gevoeligheid van het apparaat;
 - f) de controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse 1
 - g) de visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen;
 - h) de visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
- Behoudens inbreuken, wordt de overeenstemming bevestigd tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS, HUURDERS

- a) de verplichting het proces-verbaal van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie samen met de ééndraadschema's en de situatieplannen;
- b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden;
- c) de verplichting de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit;
- d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

Betekenis van de nota's: betreffen gebreken die geen invloed hebben op de besluitvorming, vaststellingen die buiten het kader van onderzoek vallen maar een gevaar inhouden voor de veiligheid, of organisatorische gegevens.



Beter gekeurd
Bien vérifié

PROCES-VERBAAL VAN HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

WELKE STAPPEN NEMEN ALS INSTALLATIE CONFORM IS

STAP 1

Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's.

STAP 2


Bij belangrijke uitbreidingen van de installatie, laat opnieuw controleren.

STAP 3

Een herkeuring van de installatie is verplicht voor 14/10/2044.

STAP 4

BTV Antwerpen staat tot uw dienst voor de noodzakelijke keuringen.

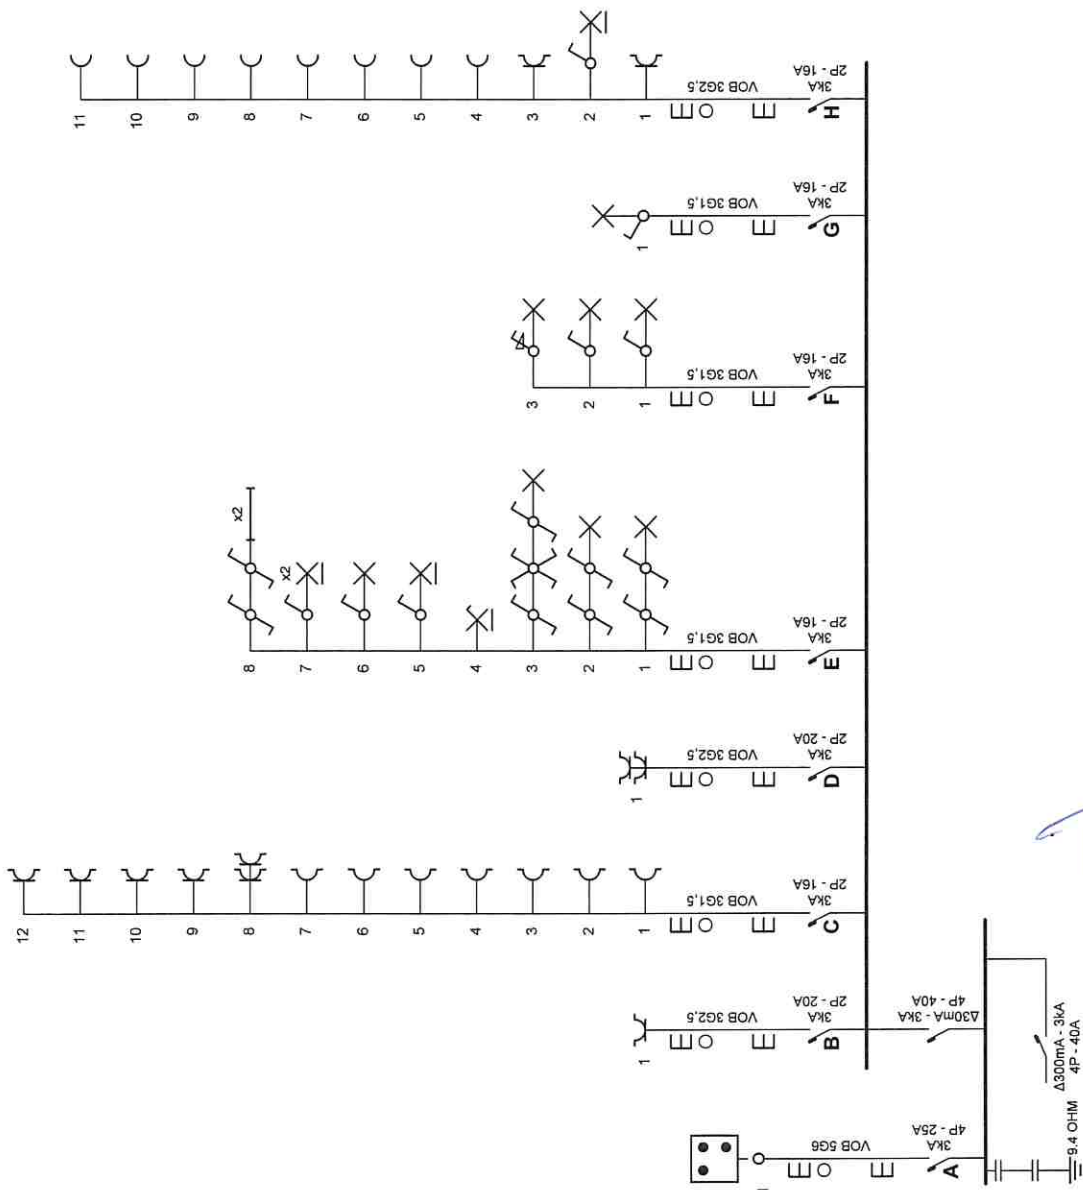

Erkend Organisme

BTV Antwerpen
Noorderlaan 109 bus 5
2030 Antwerpen
Tel.: 03 216 28 90
Fax: 03 238 86 65
e-mail: btv.antwerpen@btvcontrol.be

Plaats van de elektrische installatie

Dhr. & Mevr. Leconte
Deurnestraat 166 Bus 5
2640 Mortsel

Installateur

Glasnost bvba
Pleier Reyenslei 32
2640 Mortsel
GSM: 0495 22 13 33
Fax: 03 455 03 33
e-mail: info@glasnost-bvba.be
BTW BE 0445.831.103

p. 1/3 Eendraadschema

Datum: 2/10/2019

3 x 400V + N ~ 50Hz

- A Voeding kookvuur
- B Stopcontact berging
- C Stopcontacten leefruimte en keuken , verlichting keuken
- D Dubbel stopcontact badkamer
- E Verlichting alle ruimten behalve berging
- F Verlichting leefruimte en keuken
- G Verlichting berging
- H Stopcontacten slaapkamers , hall en badkamer , verlichting badkamer

Erkend Organisme
 BTV Antwerpen
 Noorderlaan 109 bus 5
 2030 Antwerpen
 Tel.: 03 216 28 90
 Fax: 03 238 86 65
 e-mail: btv.antwerpen@btvcontrol.be

Plaats van de elektrische installatie
 Dhr. & Mevr. Leconte
 Deurnestraat 166 Bus 5
 2640 Mortsel

Installateur
 Glasnost bvba
 Pieter Reydenslei 32
 2640 Mortsel
 GSM: 0495 22 13 33
 Fax: 03 455 03 33
 e-mail: info@glasnost-bvba.be
 BTW BE 0445.831.103

p. 3/3
 Lijst Kringen

Datum: 2/10/2019
 3 x 400V + N ~ 50Hz
