



Elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning (Boek 1 - KB 8/09/2019) - Algemene Directie Energie

📍 Plaats van het onderzoek: Max elskampstraat 25- 2020 Antwerpen België

📅 Aard onderzoek: Periodieke inspectie (Boek 1 6.5)

📅 Datum van het bezoek
14-11-2024

📅 Volgend controlebezoek:
14-11-2029

👤 Agent-bezoeker
Abdelaziz Achbari

BESLUIT : CONFORM

Identificatie van derden

Opdrachtgever

Naam	PEB Certi
Adres	Blaisanvest 105, 9000 Gent Belgique

Eigenaar, uitbater of beheerder

Naam	Eigenaar Max elskampstraat 25-2020 Antwerpen
Adres	Max elskampstraat 25- 2020 Antwerpen België

Installateur

Naam	
BTW	

Identificatie van de elektrische installatie

Adres	Max elskampstraat 25- 2020 Antwerpen België
EAN-code	-
Nr Teller	100687
Netbeheerder naam	Fluvius
Gebouw	Niet-huishoudelijk Gelijkvloers

Atlas Controle VZW

Erkend controleorganisme

Hoofdkantoor: Lambermontlaan 127 1030 Schaarbeek

Tel: +32 2 226 64 04 | Mail: office@atlascontrole.be

BTW BE0732536476 | RPR Brussel



Wetgeving



663 - INSP

AREI. Algemeen Reglement op de elektrische installaties.

Aard onderzoek:	Periodieke inspectie (Boek 1 6.5)
Datum van de uitvoering van de installatie	Voor 01/06/2020 en na 01/10/1981

Identificatie van de elektrische installatie en gegevens verdeler

Netbeheerder naam	Fluvius
Nr Teller	100687
EAN-code	-
Meter/bord verbinding	XVB 4X10
Net spanning	3 x 400 V + N
Algemene bescherming	50A 4P
Maximum beveiliging	50A 4P
Aantal verdeelborden	3
Hoofd differentieelschakelaar	300mA - 63A - type A
Type van aardelektrode	Aardingspen
Waarde (Ω)	27
Beschrijving van de elektrische installatie	Zie bijlage

Elektrisch paneel(en)



Resultaten van de controle

Installatietester

TI-025/5816213

Schema's en situatieplannen	OK
Equipotentiale verbindingen	OK
DK Test van DSR	OK
ΔI_n	OK
Controle van de staat	OK
Waarde (Ω)	27
Isolatiemeting ($M\Omega$)	>5Mohm
Opgesteld materieel	OK
Beschermingsinrichtingen tegen directe aanraking	OK
Beschermingsinrichtingen tegen indirecte aanraking	OK
Beschermingsinrichtingen tegen overstroom	OK

Schema's, plannen en documenten van de installatie

Schema's en situatieplannen	OK
-----------------------------	----



Inbreuken

Nihil

Opmerkingen

Bewoordingen

Referentie

Deze inspectie is enkel beperkt tot de delen van de elektrische installatie die op de overeenkomstige (en RDE5 ondertekende) delen van de schema's aangegeven zijn.



Besluit van de controle

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het Boek 1 inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.

Indien van toepassing, zijn door Atlas Contrôle afdoende maatregelen getroffen om te waarborgen dat de ingangsklemmen van het differentiële

het (de) éénregelige schema('s) en de positietekening(en) door Atlas Contrôle opnieuw zijn gecontroleerd.

De volgende inspectie moet uiterlijk op datum van controle + 5 jaar worden uitgevoerd.

De door Atlas Contrôle uitgevoerde inspectie had betrekking op de zichtbare delen van de installatie die normaal toegankelijk zijn.

De Agent-bezoeker

Abdelaziz Achbari

Plichten van de eigenaar, beheerder of huurder van de installatie

De verplichting om het verslag te bewaren in het dossier van de elektrische installatie.

De verplichting om alle wijzigingen aan de elektrische installatie op te nemen in het dossier.

De verplichting om de toezichthoudende ambtenaar van de Federale Overheidsdienst Energie onmiddellijk op de hoogte te brengen van elk ongeval met personen dat rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt wordt door de aanwezigheid van elektrische installaties.




Atlas
Contrôle.

Verslag van onderzoek: elektrische installatie
Verslag N° Verslag N° 59.602
Original

**B
E
L
A
C**
663 - INSP

Bijlagen

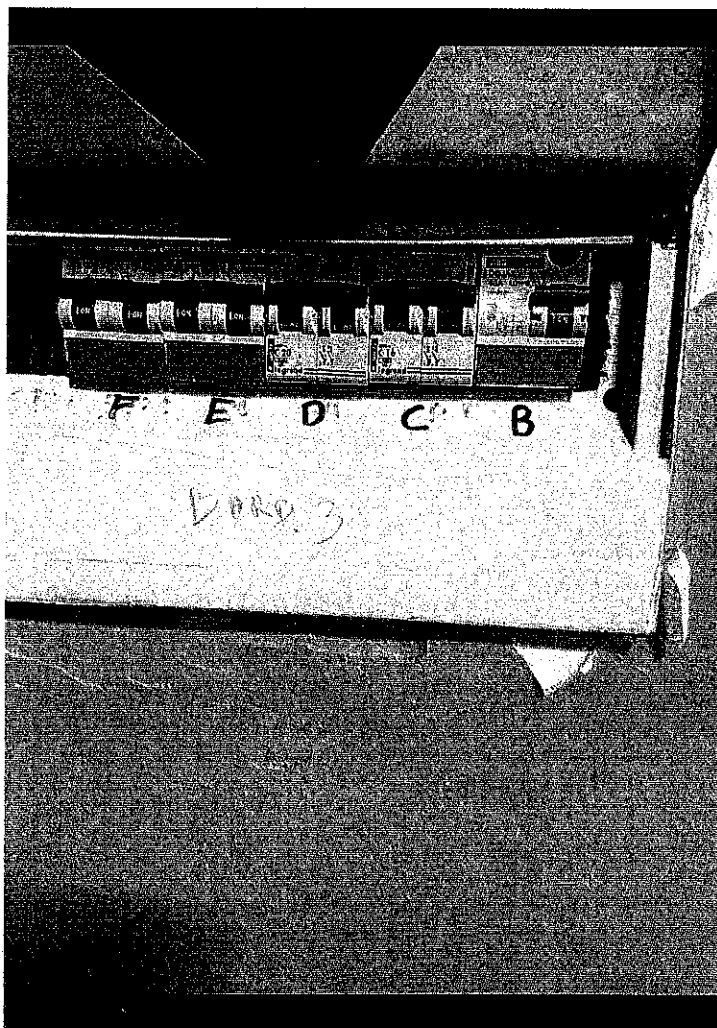

Bord 1



Bord 2

