

3331928

EAN nr. :
 Teller nr. :
 Stand I : II :

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN ~~WERF OF TIJDELIJKE AANSLUITING~~ - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / ~~controlebezoek~~ op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001
 volgens : AREI art. 86 / AREI art. 87 / AREI art. 270 / AREI art. 271 / AREI art. 276bis

Aanvulling verslag nr. :
 Aard installatie : Nieuwe / ~~Uitbreiding~~ / ~~Voortloop~~ / Bestaande / ~~Verzwarend~~ / ~~Splitting meter~~ / ~~Spanningswijziging~~ / ~~Verkoop wooneenheid~~
 Type der lokalen : *app. 1D*
 Plaats van onderzoek : *Jan Van Rijsswijcklaan 164 2020 Antwerpen*
 Eigendom van : *Verbreed Jean Van Publi 6 2018 Antwerpen*
 Opdrachtgever : *Jon Estate Jan Van Rijsswijcklaan 164 2020 Antwerpen*
 Installateur : *idm*
 BTW : *0462 433925* ID-kaart : *Vervenne* Uitgereikt te : Datum :
 Onderzoeker : *Vervenne* Datum van onderzoek : *20/02/2012*

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V ~~2 x 230 V~~ ~~3 x 230 V~~ Max. Beveiliging : *2P40A* Omschakelaar : stand :
 Hoofdbeveiliging : Zek. : *aut. bord velder* Schak. : *dift. 2P40A 300mA*
 Meter-bordverbinding : kabeltype : *XVB* aantal geleiders : *4* doorsnede : *10* mm²
 Voedingsbekabeling : kabeltype : */* aantal geleiders : */* doorsnede : */* mm²
 Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net - Wachtbuis : geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat : aanwezig/niet aanwezig
 Aardelektrode : Type : *1* / baren / pennen / horizontale geleiders Sectie : *16* mm² Spreidingswaarde : *46,2* Ω
 Aantal borden : *1* Aantal eindstroombanen : *12* Algemene isolatieweerstand : *70,5* MΩ
 Diff. schak. : algemene : *2P40A 300* mA bijkomende : *2P40A 30* mA
 werking testknop : in orde - *niet in orde* controle foutlus : in orde - *niet in orde*
 De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - *neen* Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - *niet in orde*
 Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - *niet in orde* onrechtstreekse aanraking : in orde - *niet in orde*
 Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - *niet in orde* Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde - *niet in orde*
 Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - eendraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend - toestellen :

zie schema's

VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I) - De nummers verwijzen naar de standaardinbreuken op de achterzijde.

N Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotentiale verbinding nog niet aangesloten.
 N' ~~Badkamer gasleiding waterleiding CV ketel nog niet geplaatst.~~

geen inbreuken


Godfried Vervenne
 inspecteur
 GSM: 0496/29.01.05
 Fax: 03.
 godfried.vervenne@ocb.be

BESLUIT

De installatie is conform ~~niet conform~~ met het AREI.
 De installatiedient opnieuw gecontroleerd door hetzelfde organisme uiterlijk op *20/02/2012*
 zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging
 of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. De installatiemag / ~~niet~~ in dienst gesteld
 worden / blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste
 maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.


voor de directeur,
 de onderzoeker

Jan Van Rijswijcklaan 164 – 2020 Antwerpen – Appartement 1D
Situatieschema

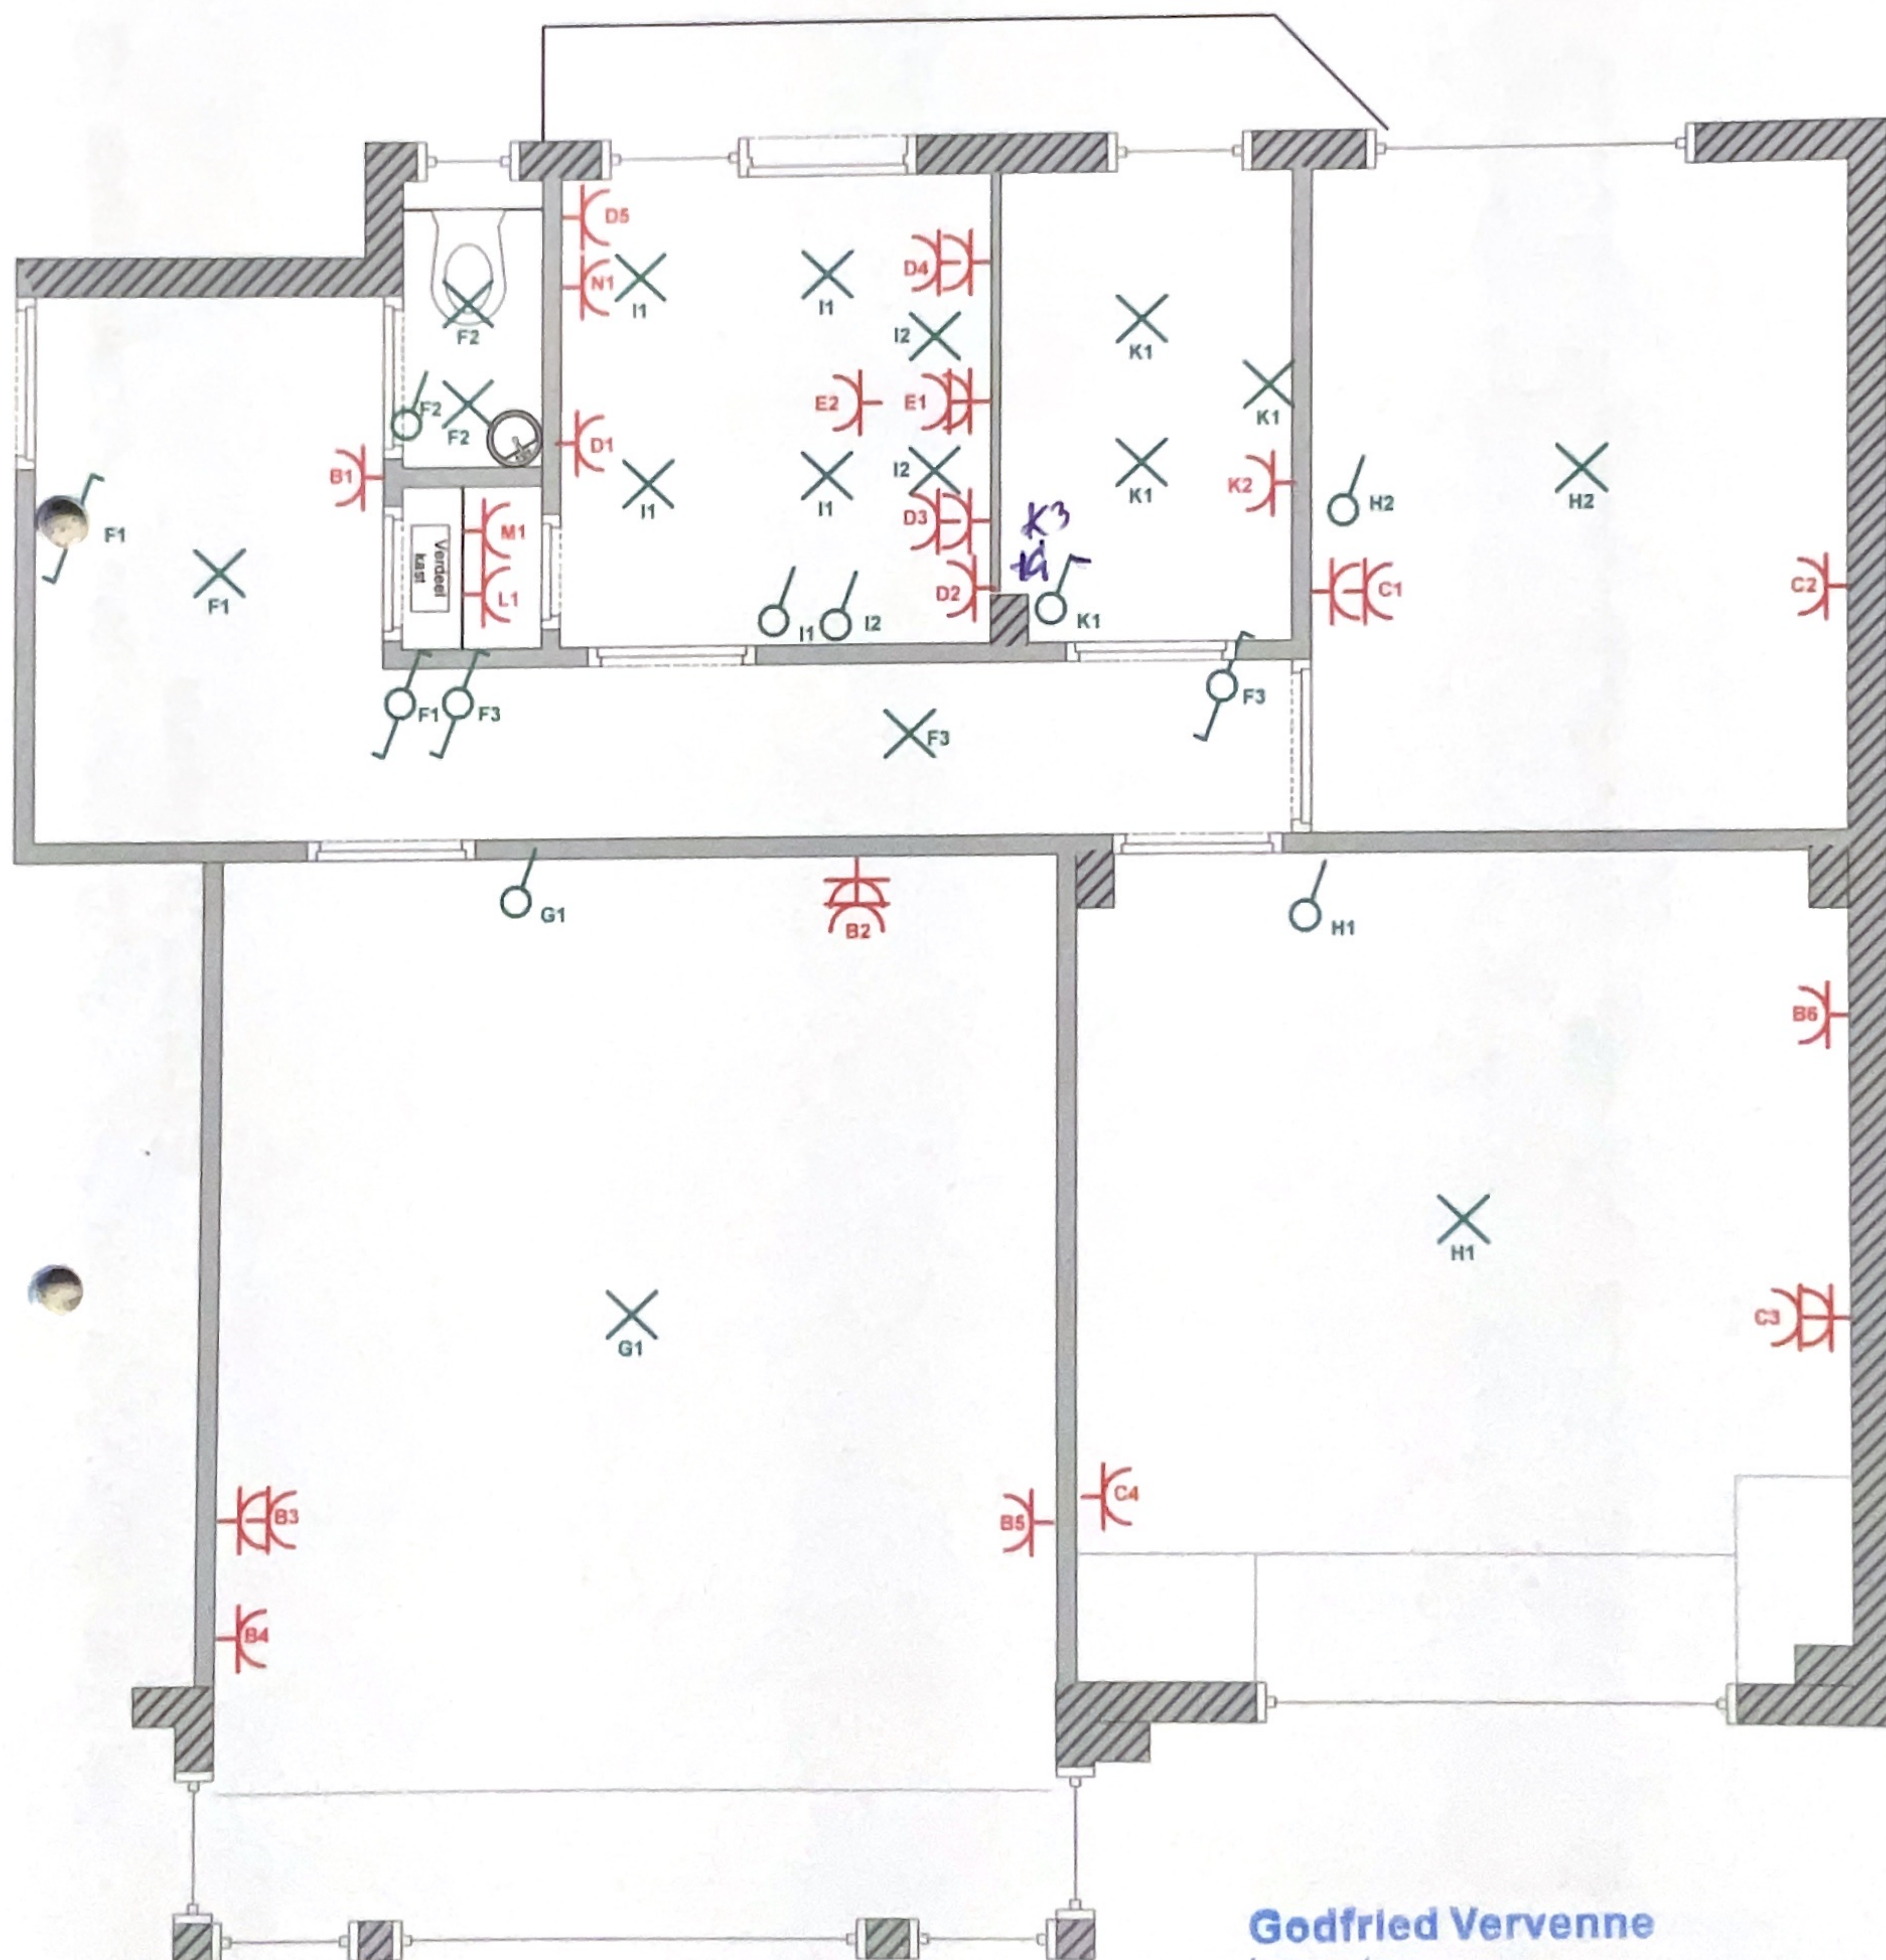

Godfried Vervenne
Inspecteur
GSM: 0496/29.01.05
Fax: 03.2.2.2.2.2.
godfried.vervenne@ocb.be


Jan Van Rijswijcklaan 164 – 2020 Antwerpen – Appartement 1D Eendraadschema

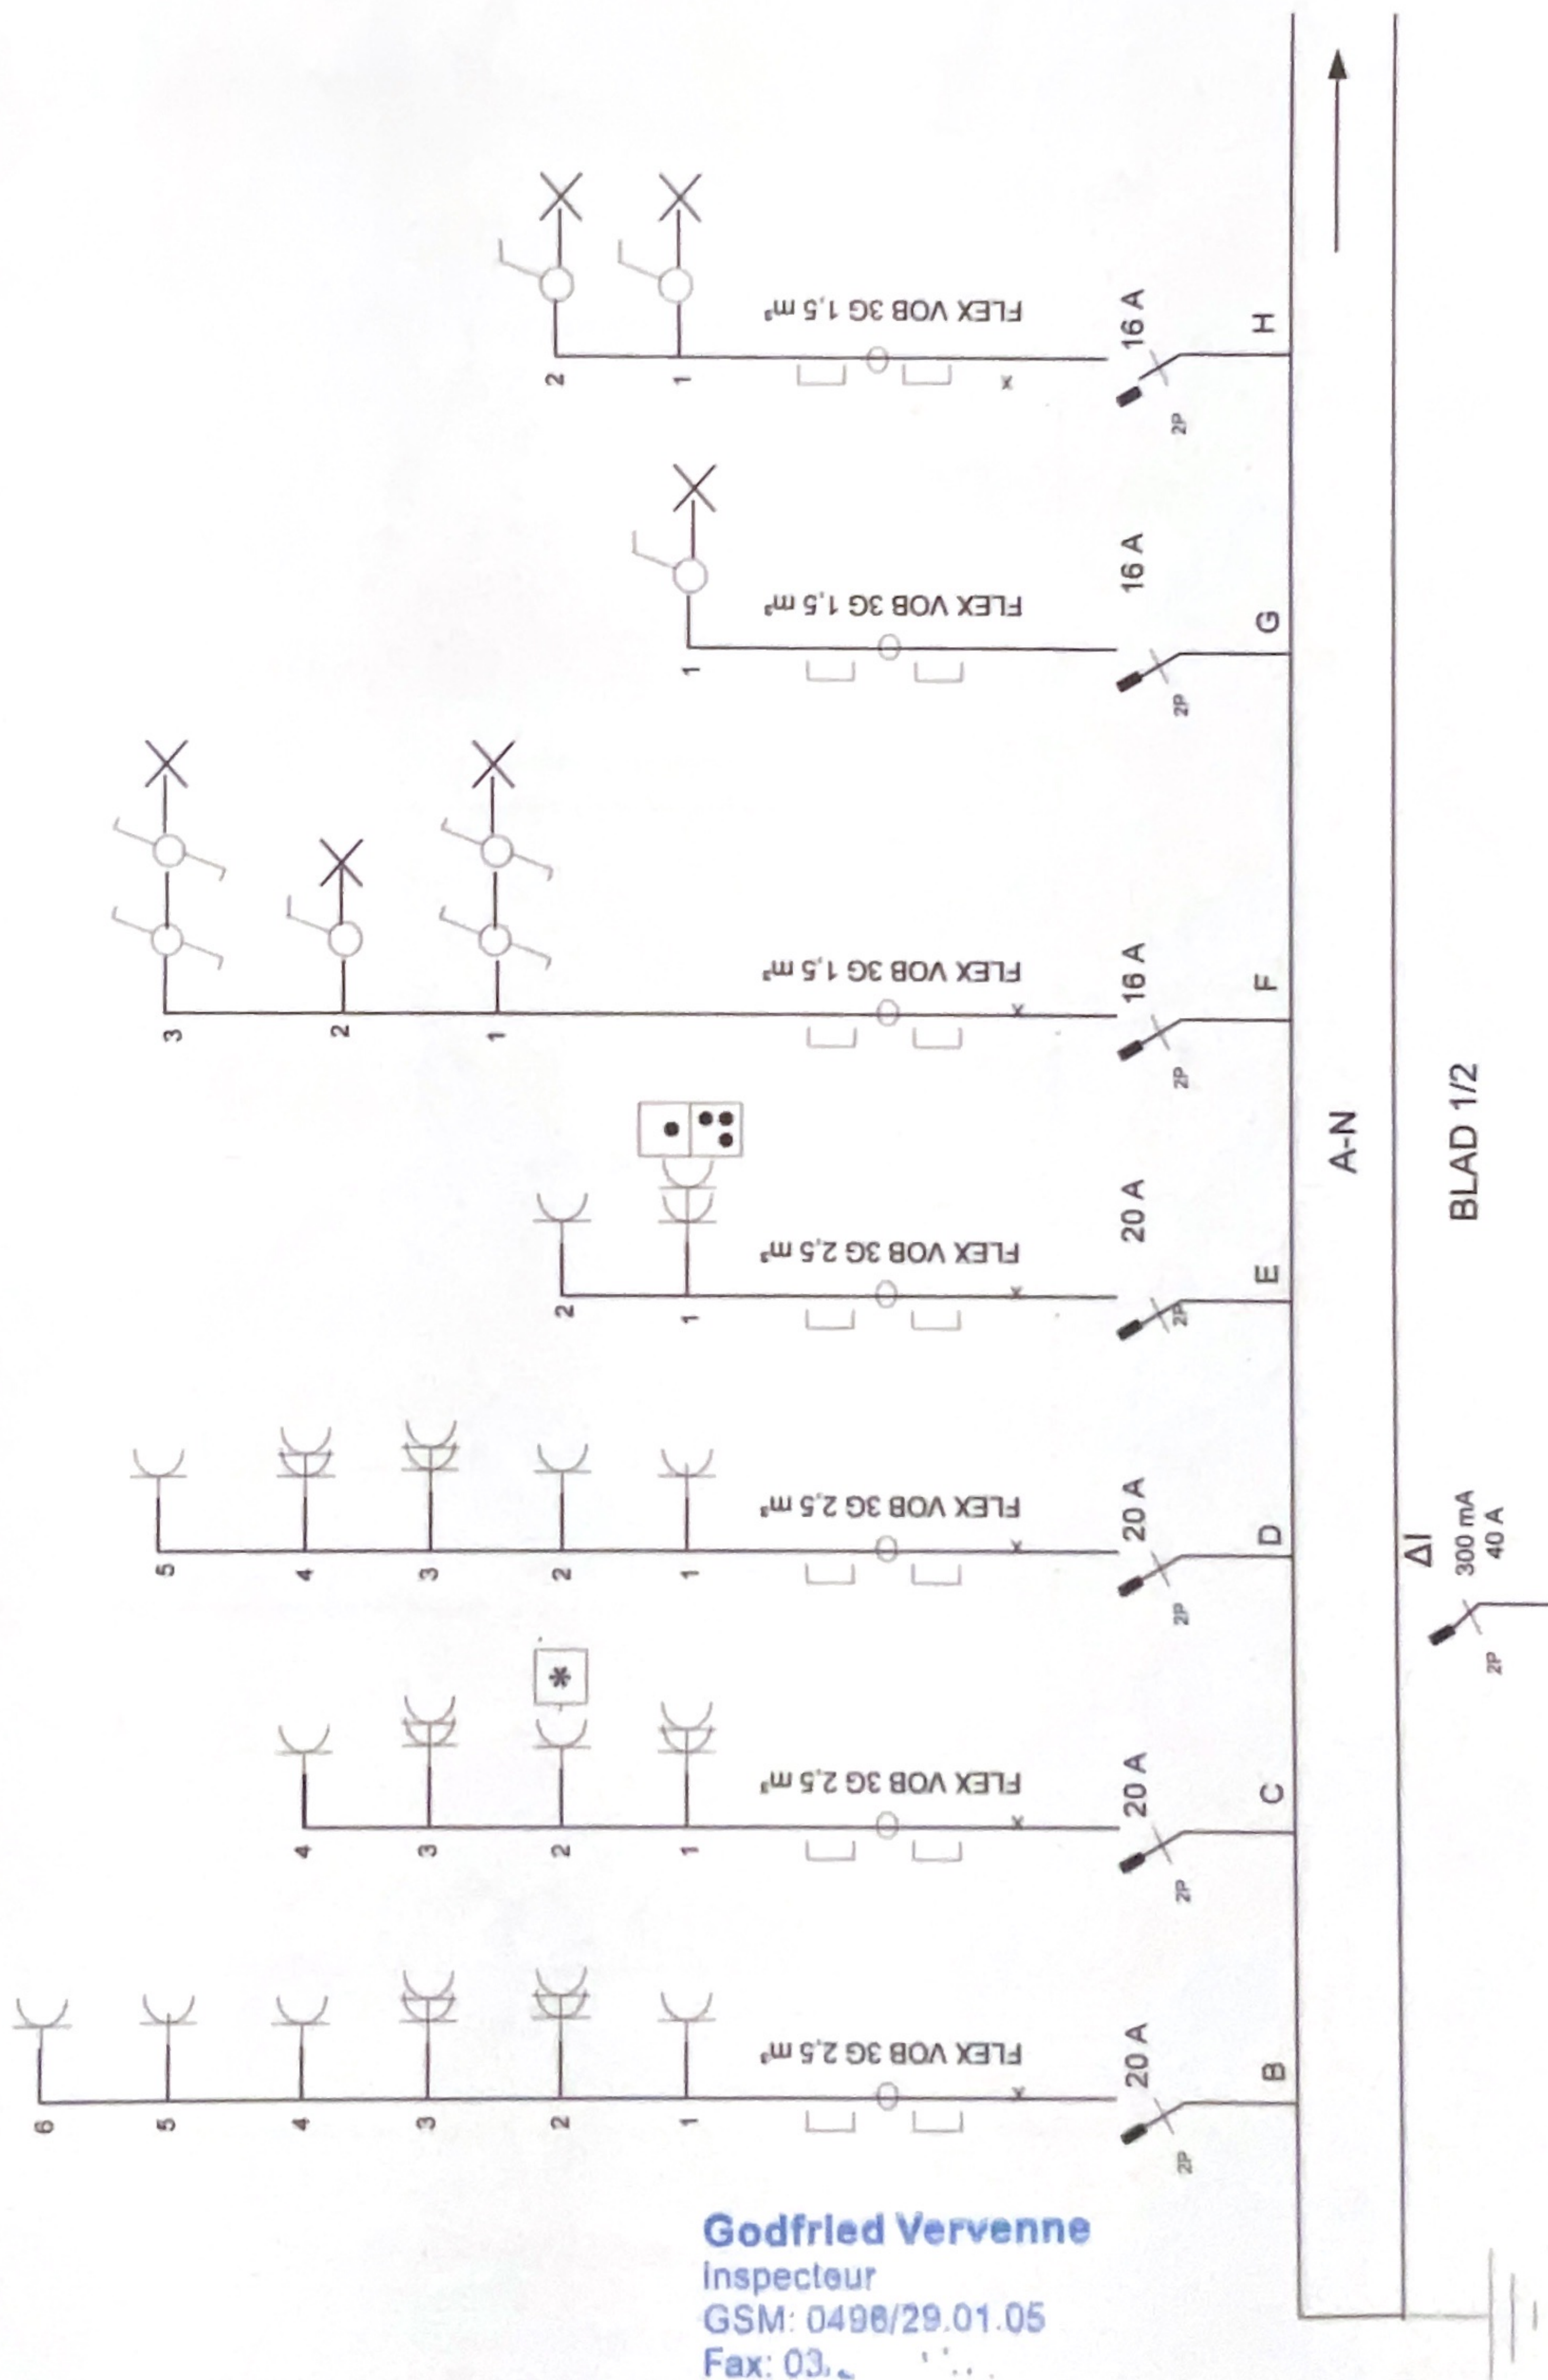

Godfried Vervenne
Inspecteur
GSM: 0498/29.01.05
Fax: 03...
godfried.vervenne@ocb.be

Jan Van Rijswijcklaan 164 – 2020 Antwerpen – Appartement 1D

Eendraadschema

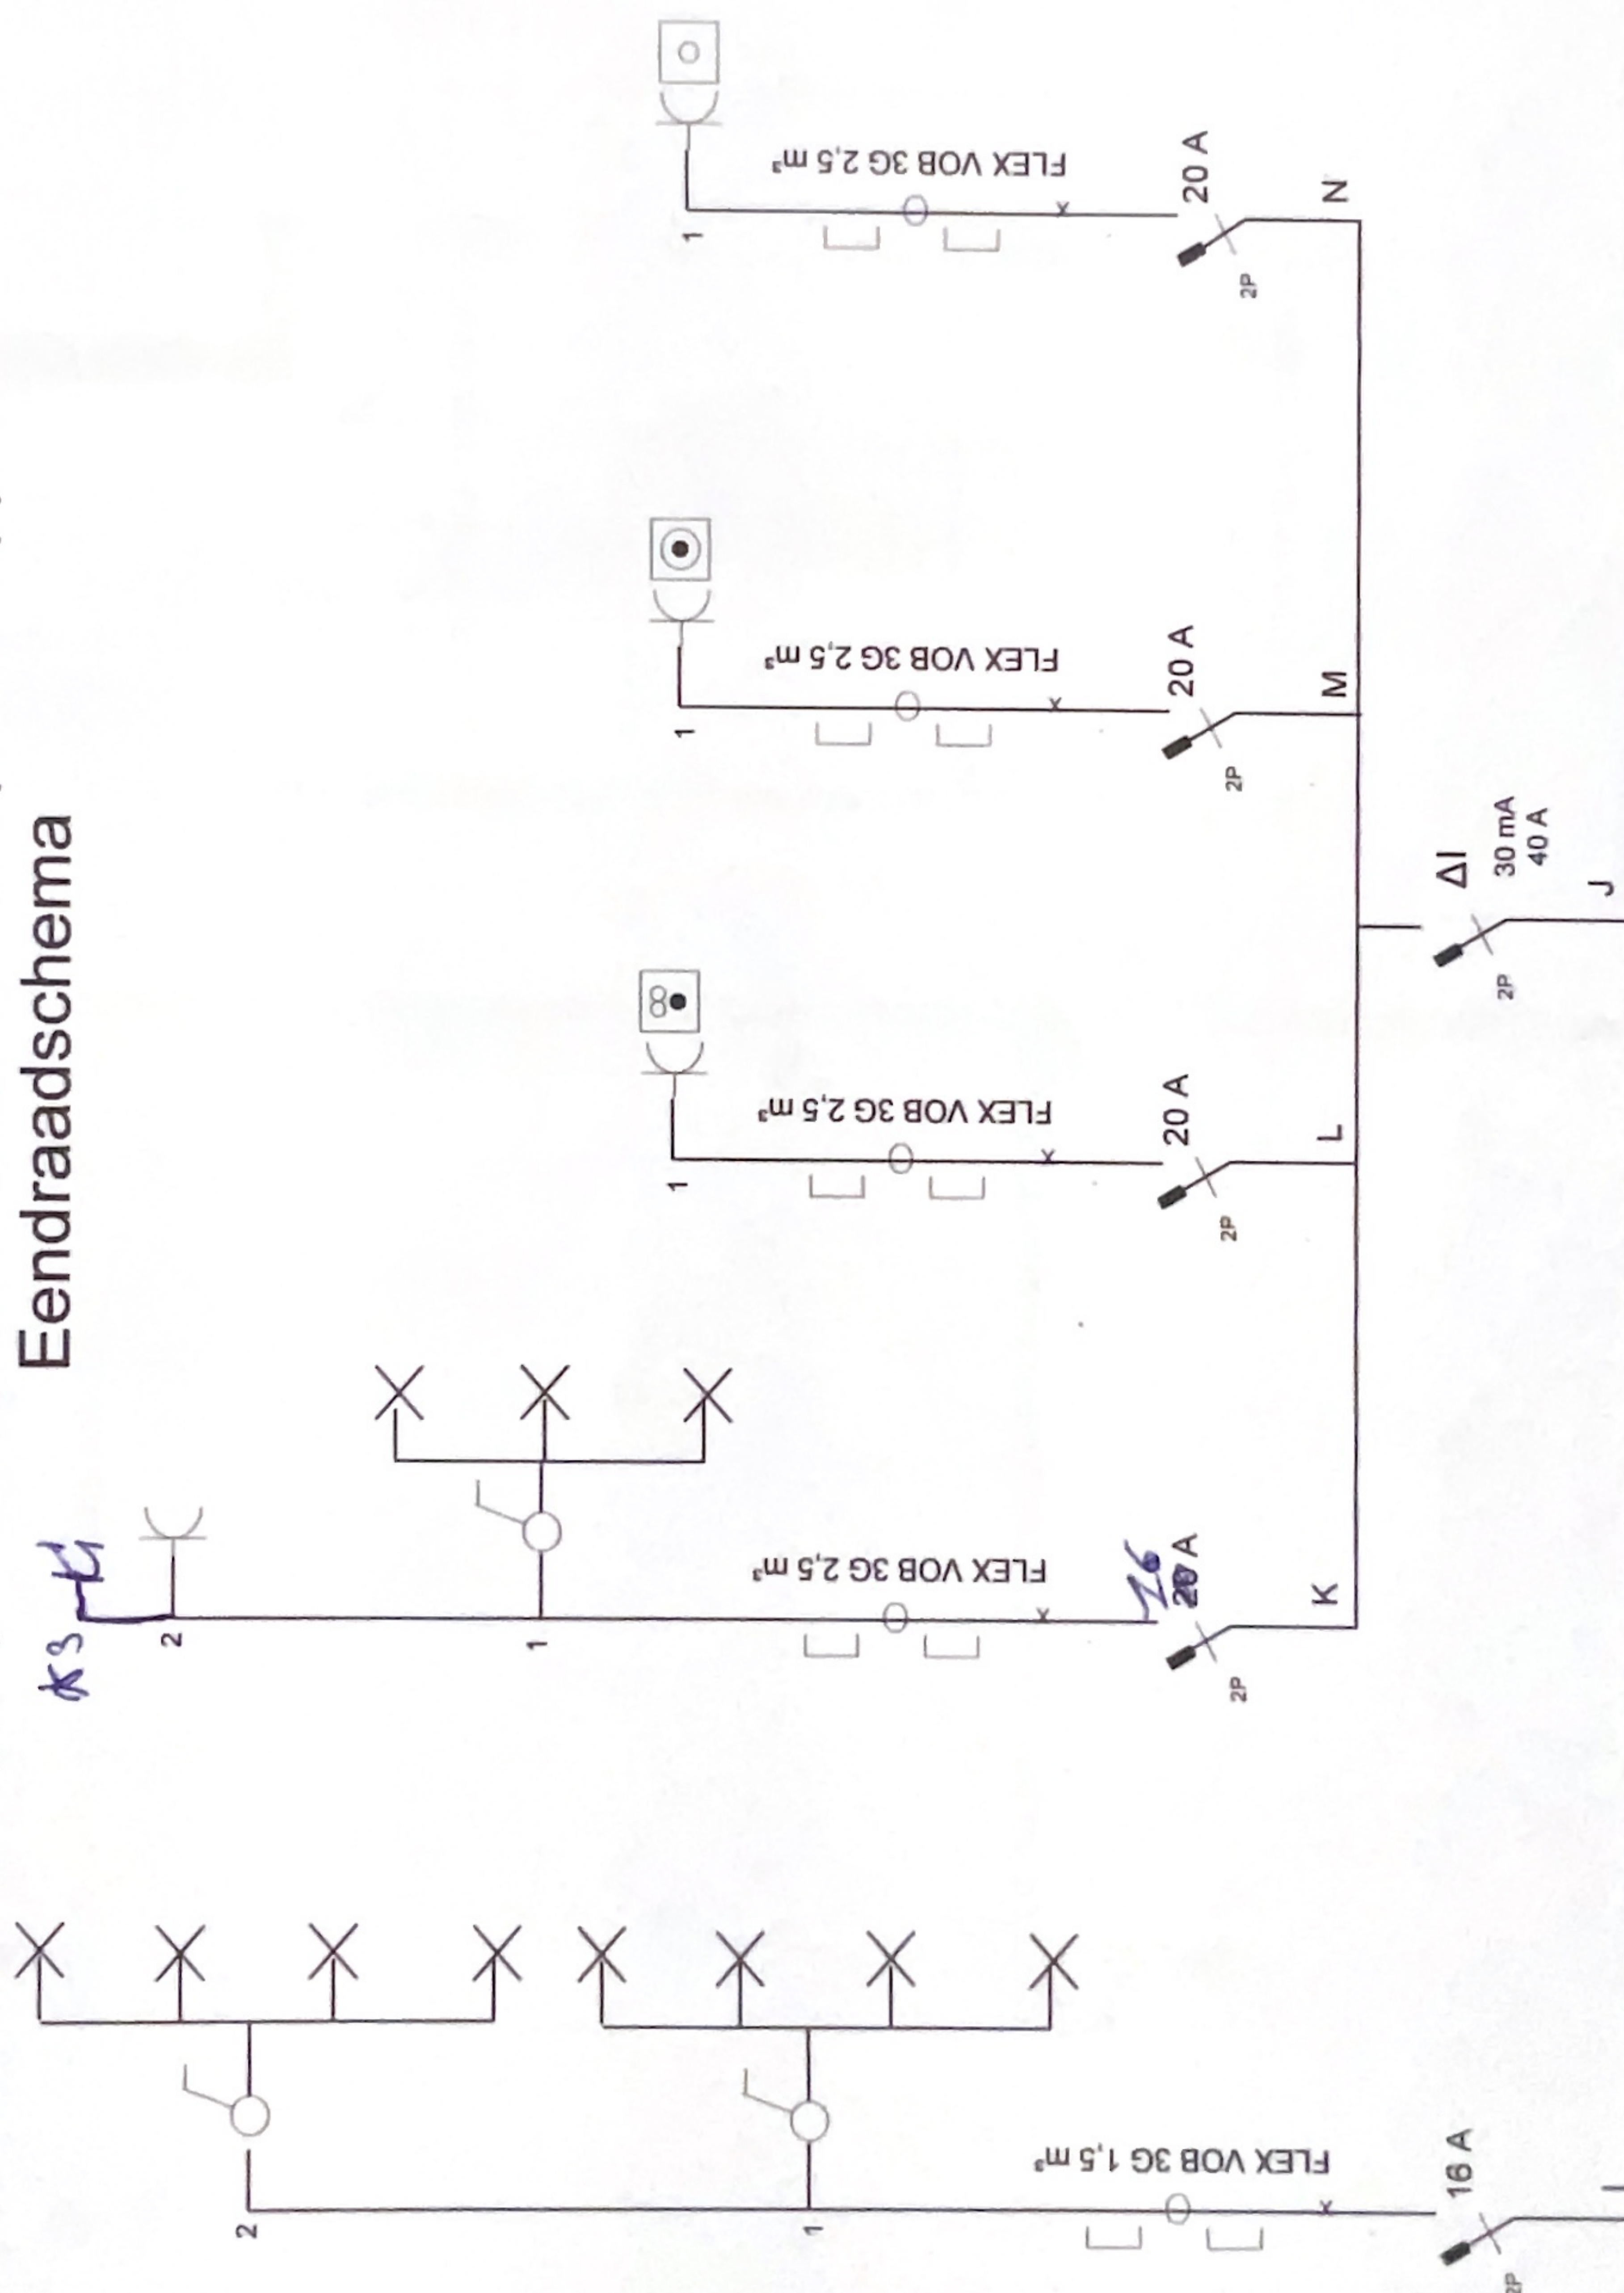

A-N

BLAD 2/2

Godfried Vervenne

inspecteur

GSM: 0496/29.01.05

Fax: 03.

godfried.vervenne@ocb.be

Résidence Moderne, Appartement 1D

Elektriciteit, NIEUW



Nr	Rij	Kring	Soort	Plaats
1	1	A	DIF	Diferentiaalschakelaar
2	1	B	S	Stopcontacten
3	1	C	S	Stopcontacten
4	1	D	S	Stopcontacten
5	1	E	S	Stopcontacten keuken + koelkast
6	1	F	V	Keuken, fornuis en dampkap
7	1	G	V	Verlichting gangen en wc
8	1	H	V	Verlichting living
9	1	I	V	Verlichting slaapkamers
10	2	J	DIF	Verlichting Keuken
11	2	K	SV	Diferentiaalschakelaar
12	2	L	S	Badkamer
13	2	M	S	Droogkast
14	2	N	S	Wasmachine
15	2	O	-	Vaatwasser
15	2	P	-	vrij
16	2	Q	-	vrij
				vrij

Artikel	DM Lights		
	Prijs	Aantal	Tot
Inbouwdoos Helia 5 cm	€ 0,53	12	€ 6,36
Geraard Stopcontact	€ 4,60	16	€ 73,60
Eenpolige Schakelaar	€ 3,78	6	€ 22,68
Tweepolige Schakelaar	€ 5,98	2	€ 11,96
Wisselschakelaar	€ 4,10	4	€ 16,40
Kruisschakelaar	€ 6,92	0	€ 0,00
Afdekplaat enkel	€ 1,07	18	€ 19,26
Afdekplaat dubbel	€ 2,25	8	€ 18,00
VOB 3G 1,5 m³	€ 0,59	75	€ 44,25
VOB 3G 2,5 m³	€ 0,83	75	€ 62,25
Zekeringenkast 36 mod	€ 56,28	1	€ 56,28
Automaat 2p 16 Amp	€ 6,06	4	€ 24,24
Automaat 2p 20 Amp	€ 6,06	8	€ 48,48
DIF 2p 40 A 30 mA	€ 46,12	1	€ 46,12
DIF 2p 40 A 300 mA	€ 45,20	1	€ 45,20
XVB 4G10 m³	€ 6,00	25	€ 150,00
Eandis meter	€ 350,00	1	€ 350,00
Nieuwe meterkast	€ 100,00	1	€ 100,00
Totaal met VOB		€ 1.095	

Materialenlijst						
	Kring	Omschrijving	Enkel	Dubbel	Totaal	
STOPCONTACTEN	B	Stopcontacten	4	0	4	
	C	Stopcontacten	0	0	0	
	D	Stopcontacten keuken + koelkast	1	2	5	
	E	Stopcontacten keuken + koelkast	2	0	2	
	K	Keuken, fornuis en dampkap	2	0	2	
	L	Badkamer	1	0	1	
	M	Droogkast	1	0	1	
	N	Wasmachine	1	0	1	
		Vaatwasser	12	2	16	
		Omschrijving	1polig	2polig	Wissel	Totaal
SCHAKELAARS	F	Verlichting gang + wc	0	0	4	4
	G	Verlichting living	2	0	0	2
	H	Verlichting slaapkamers	2	0	0	2
	I	Verlichting Keuken	1	0	0	1
	K	Verlichting badkamer	0	1	0	1
			5	1	4	10
