



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be



Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 10/03/2025

Inspecteur: Yoshi Van den Eynden

Mentor: -

Installateur: Elektriciteitswerken Noppe BVBA

ID-label: -

Klantreferentie: -

B.T.W. nr.: BE 0887 577 021

Merk en type meettoestel: Metrel ET61557

Serienummer: 19481297

Datum verslag: 10/03/2025

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Spillemansstraat
Huisnummer 61
Busnummer
Postcode 2140
Gemeente Borgerhout
Land België

Eigenaar

Naam Bobbel Loos
Straatnaam Spillemansstraat
Huisnummer 61
Busnummer
Postcode 2140
Gemeente Borgerhout
Land België

Installateur

Naam Elektriciteitswerken Noppe BVBA
BTW nr. BE 0887 577 021
Telefoonnummer +32 3 685 22 85
E-mail hilde@ewn.be

Type : woning

EAN : 541448820040076872

Teller Nr.: : 1SAG1100641312

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek:

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3.

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 1N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 1

Aantal kringen: 15

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Ri algemeen: 37.4 MΩ

RE: 25.2 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

Δ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	15	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	5	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
Zie schema	-	-		-	-
Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	OK		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 10/3/2050
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.
- Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 09:24 tot 10:00

De inspecteur Yoshi Van den Eynden



Yoshi Van den Eynden
ACEG VZW - #412


Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechte reeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.


Kwaliteit
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 10/3/2050	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.



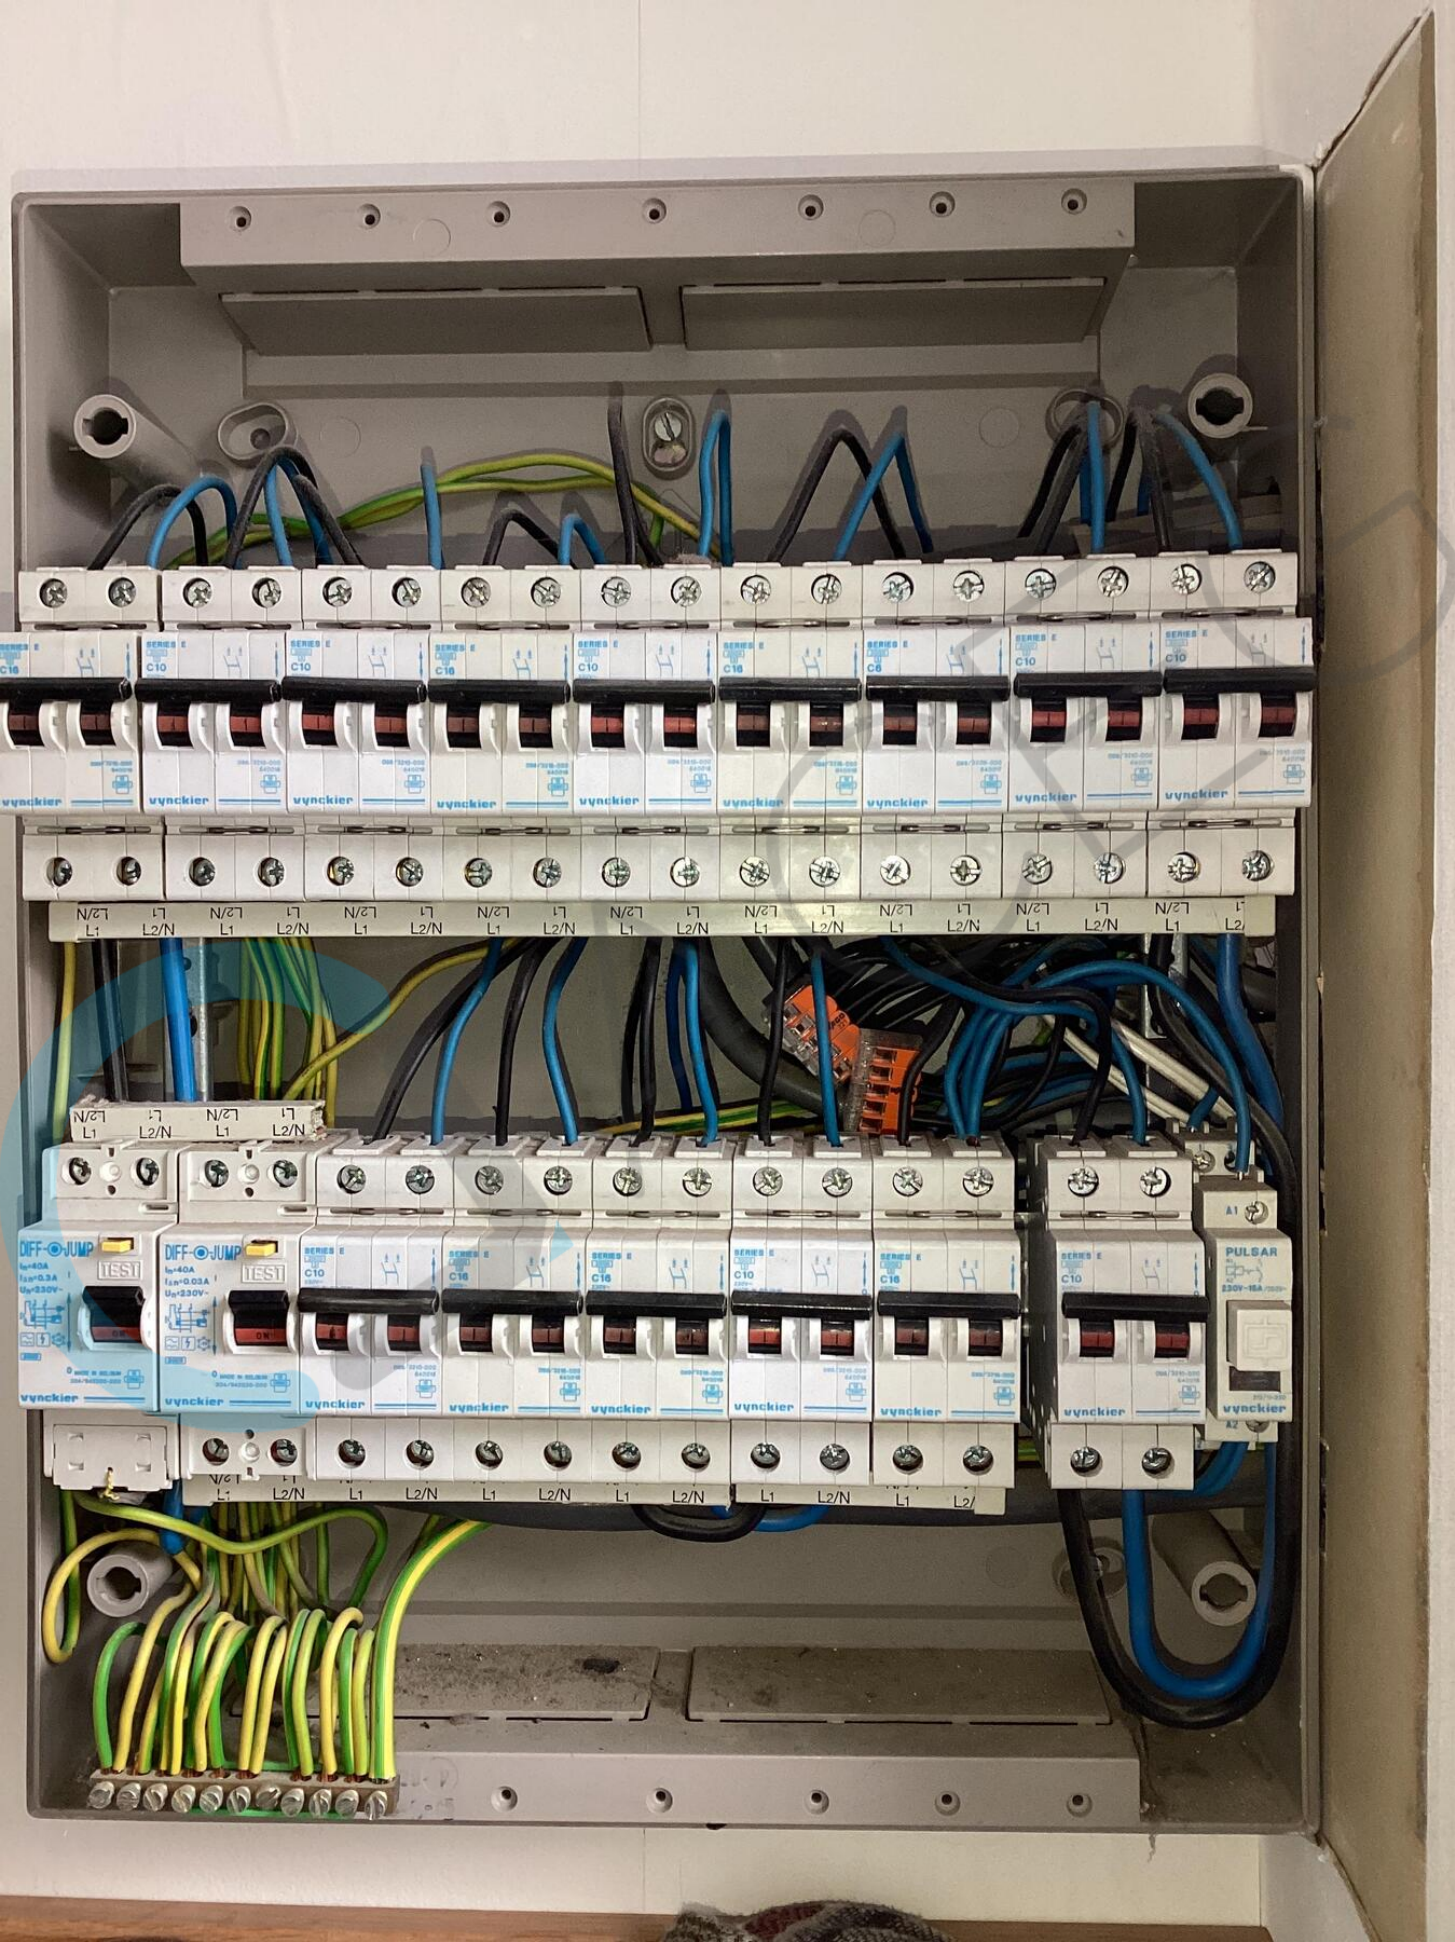

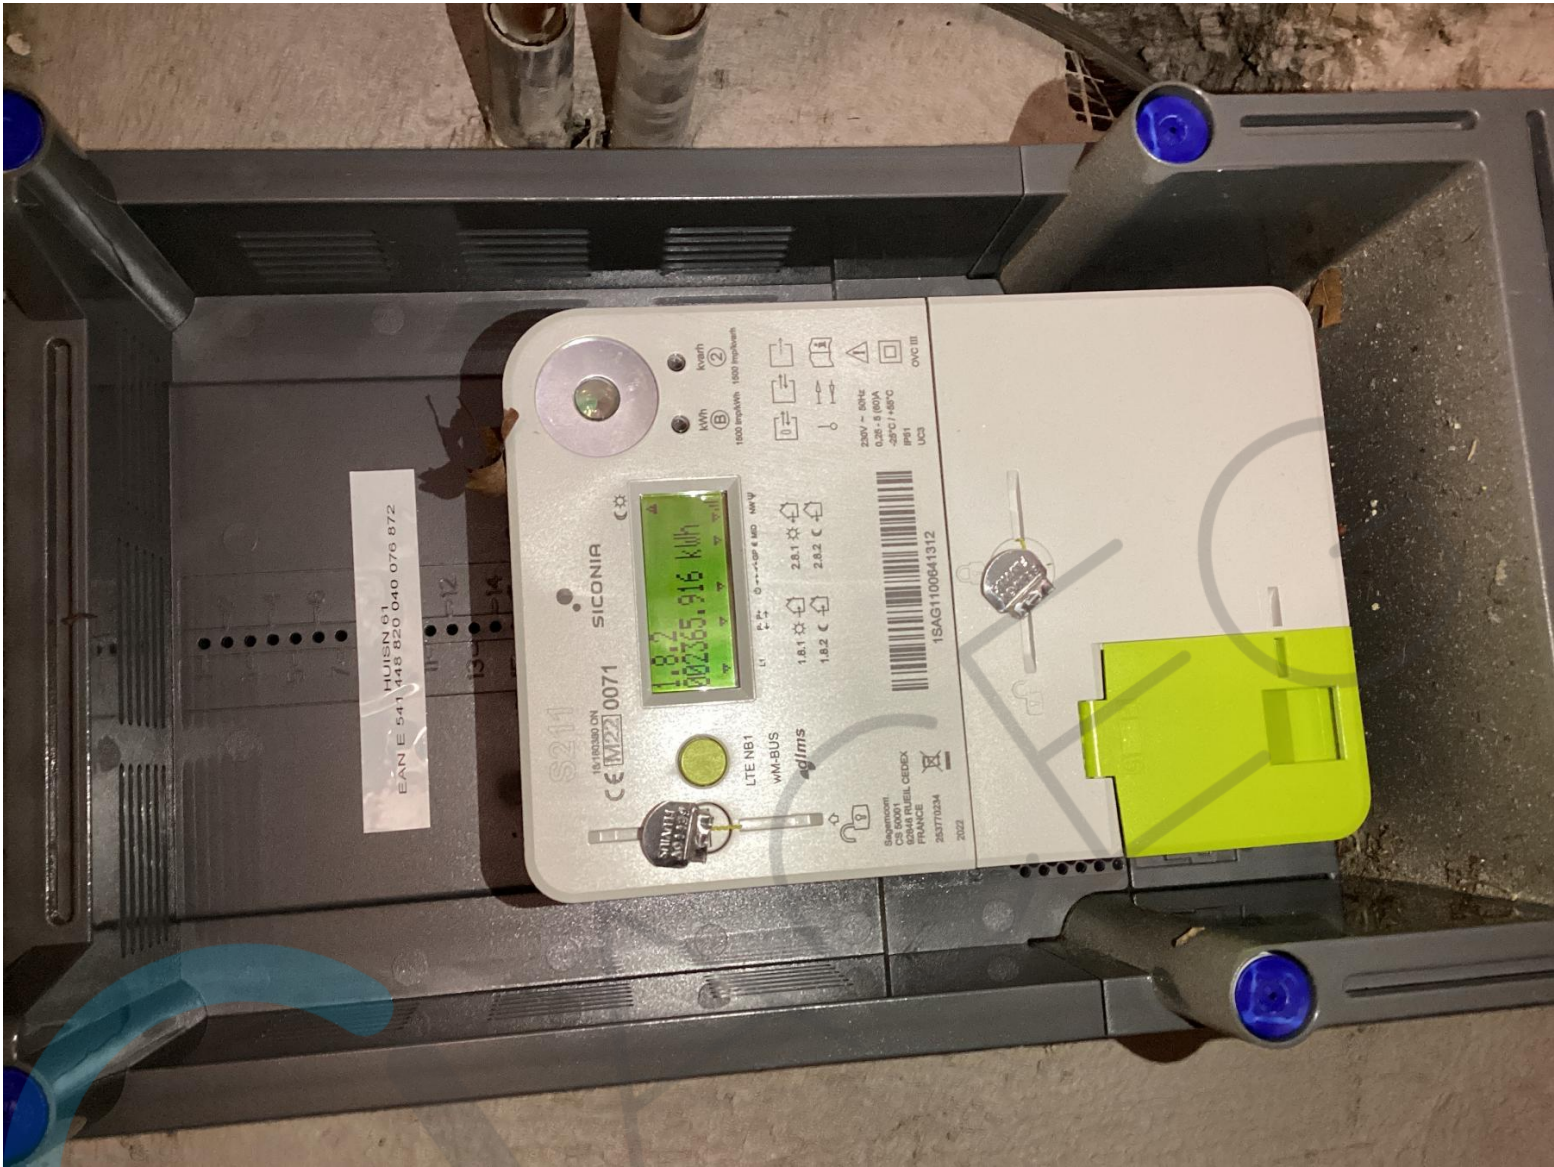

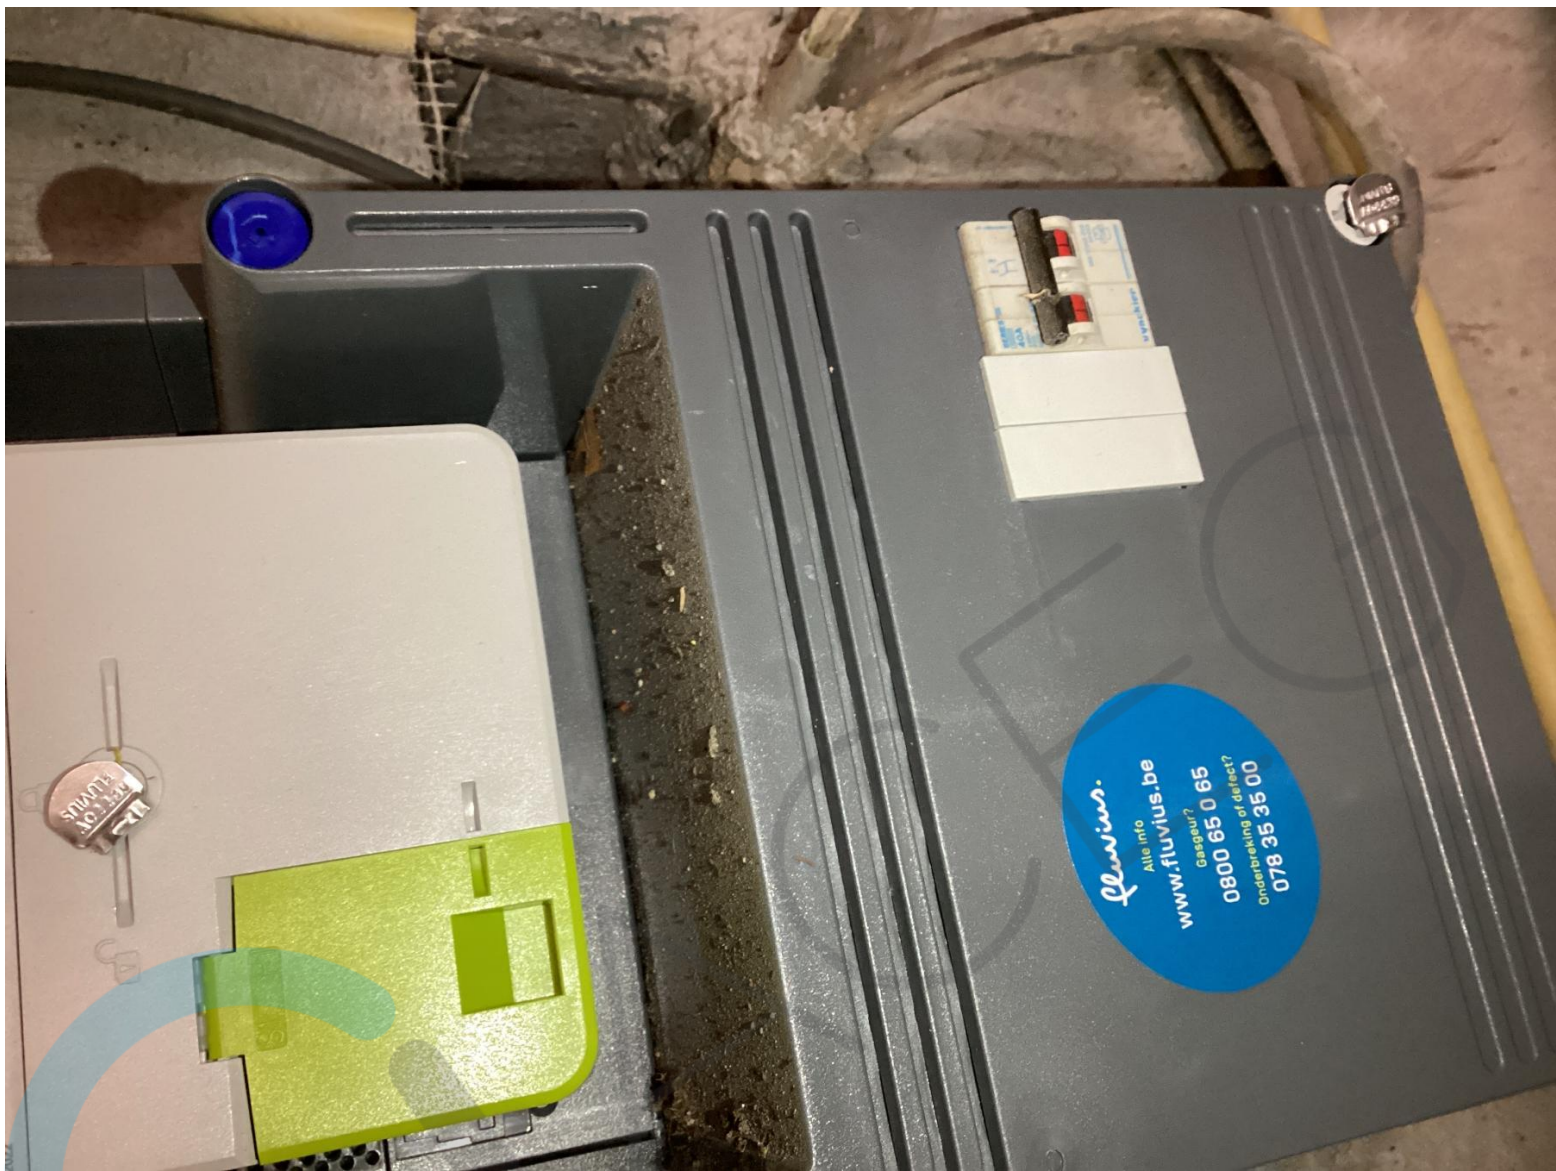











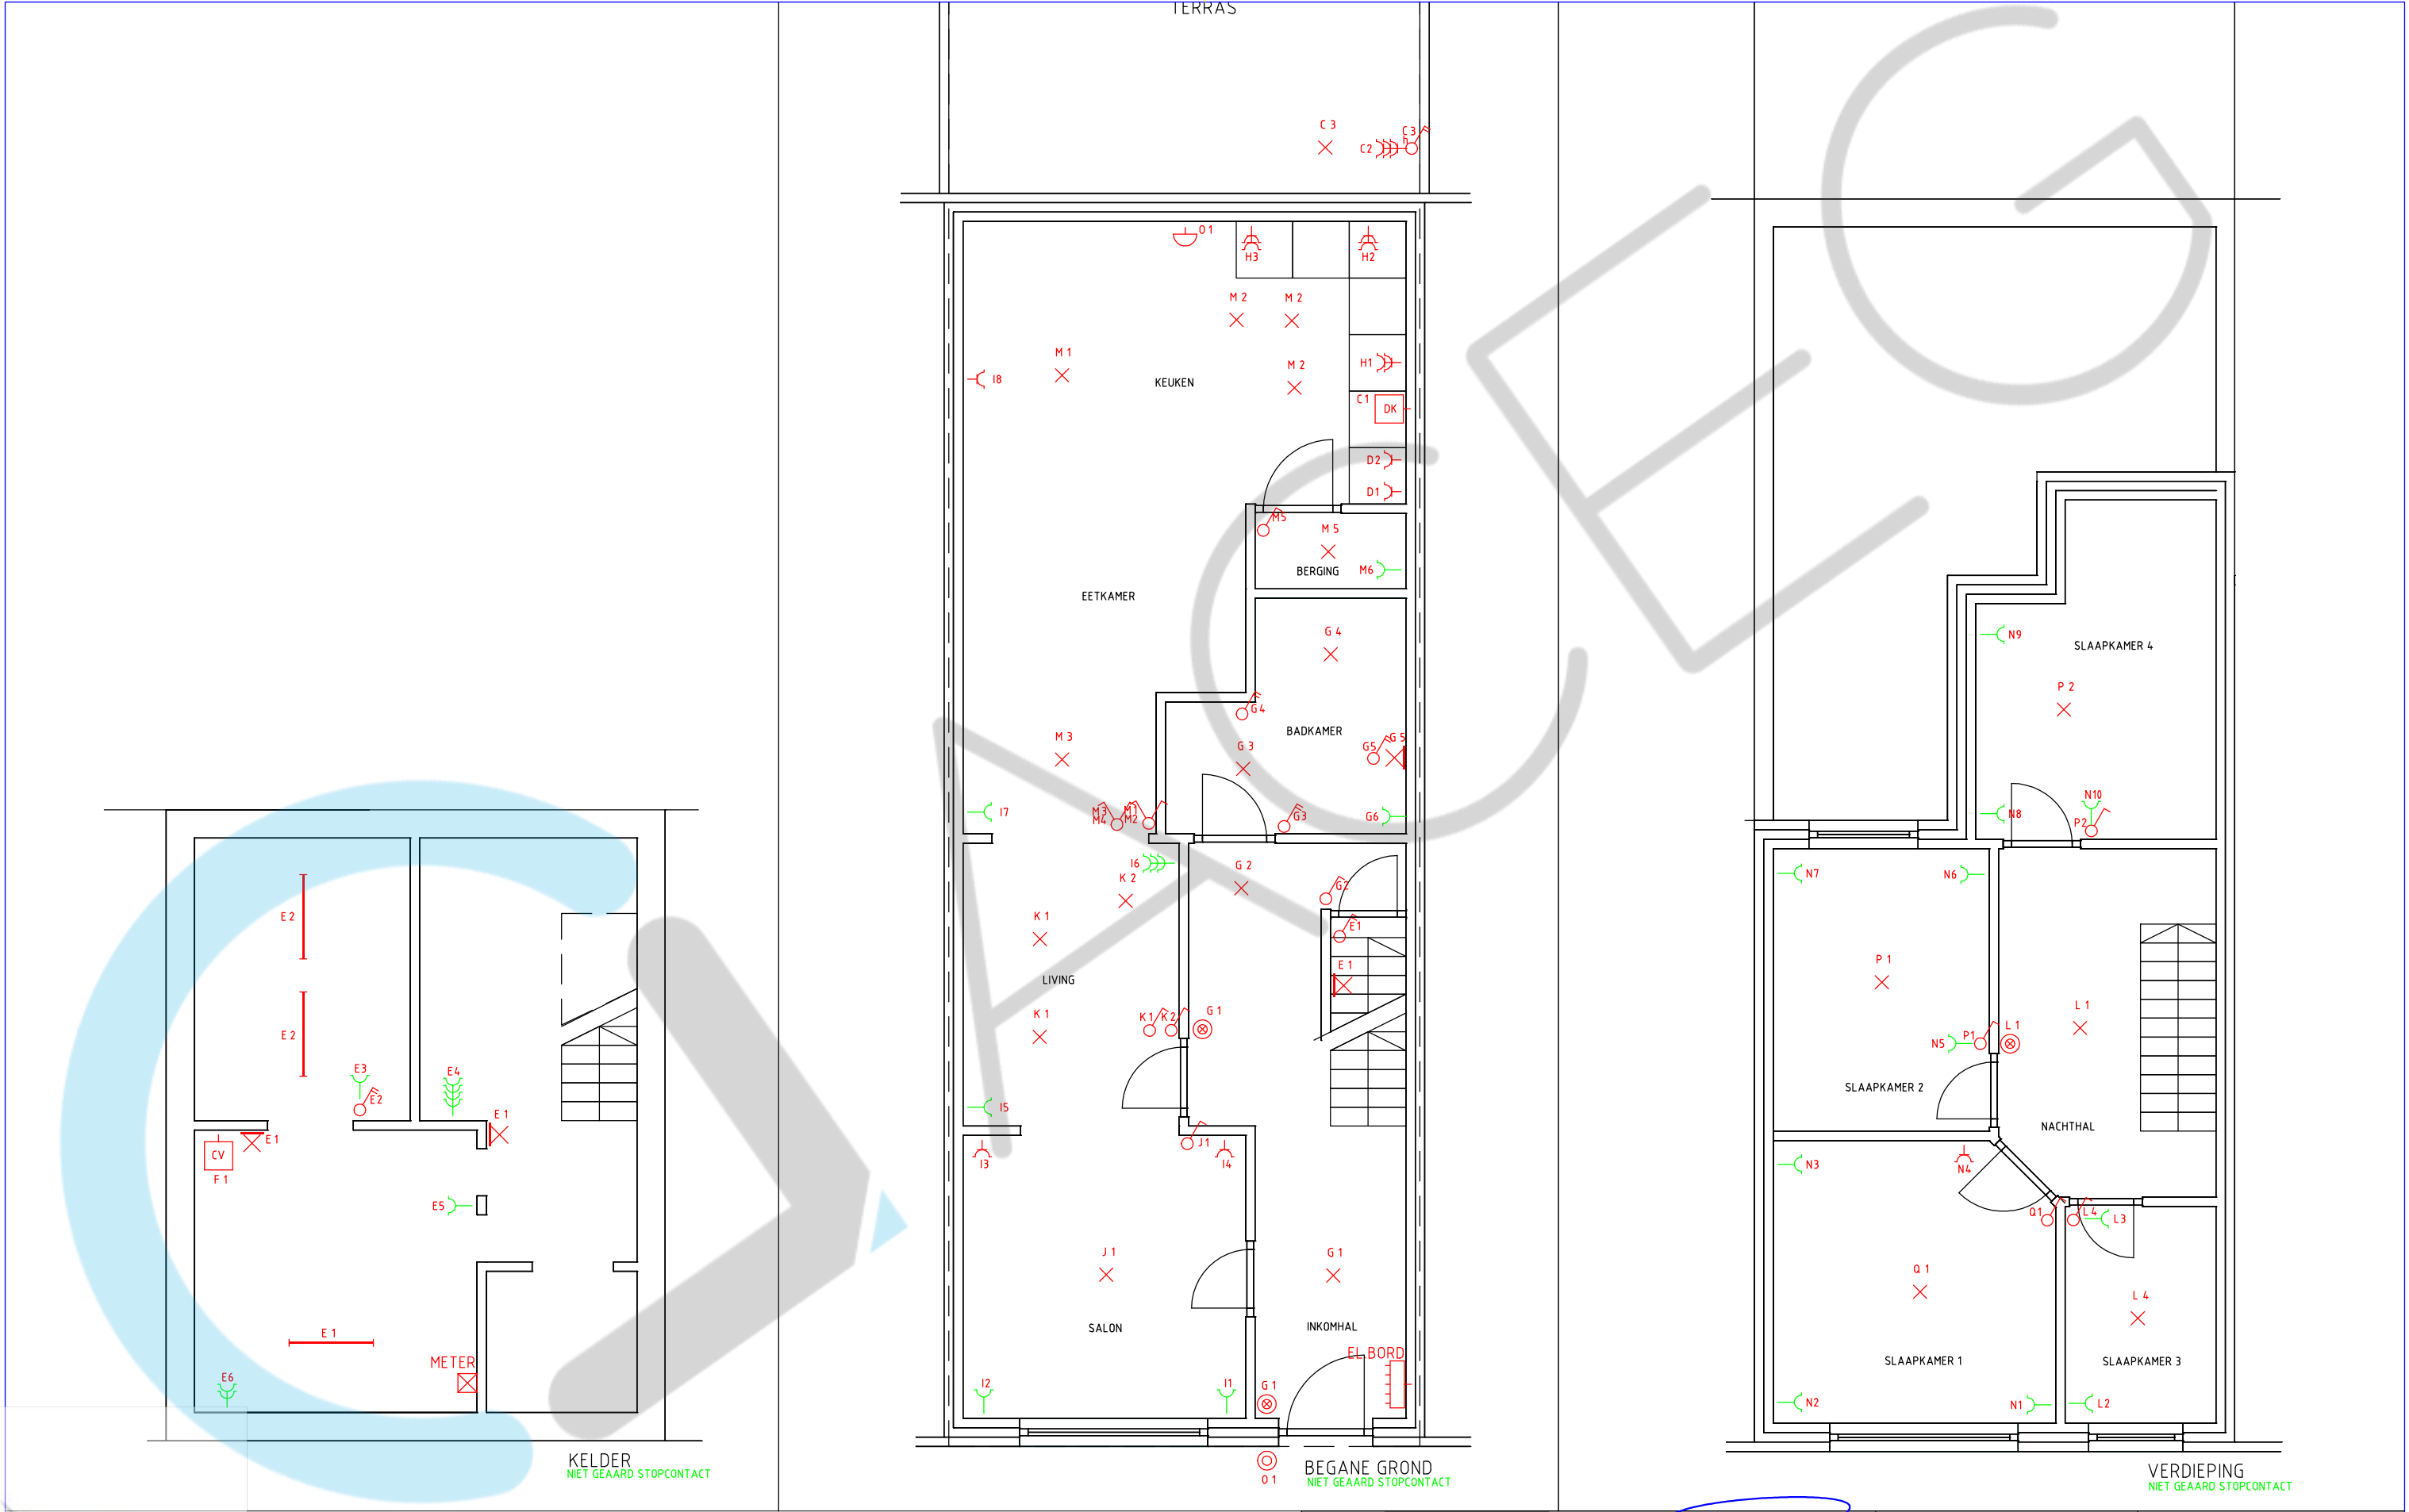



Yoshi Van den Eynden
ACEG VZW - #412

10/03/2025

Installateur:  Elektriciteitswerken N O P P E	Energelaan 26 bus 7 2950 Kapellen BTW: BE 0887.577.021 Tel: 0032 3 685 22 85	Klant: Naam: Bobber Loos Straat: Spillemansstraat 61 Gemeente: 2140 Borgerhout Projectnr: 2025055	Datum: 10/03/25
			Get. door: Hilde
			Aanpassing:
			Formaat: A3

EL.BORD

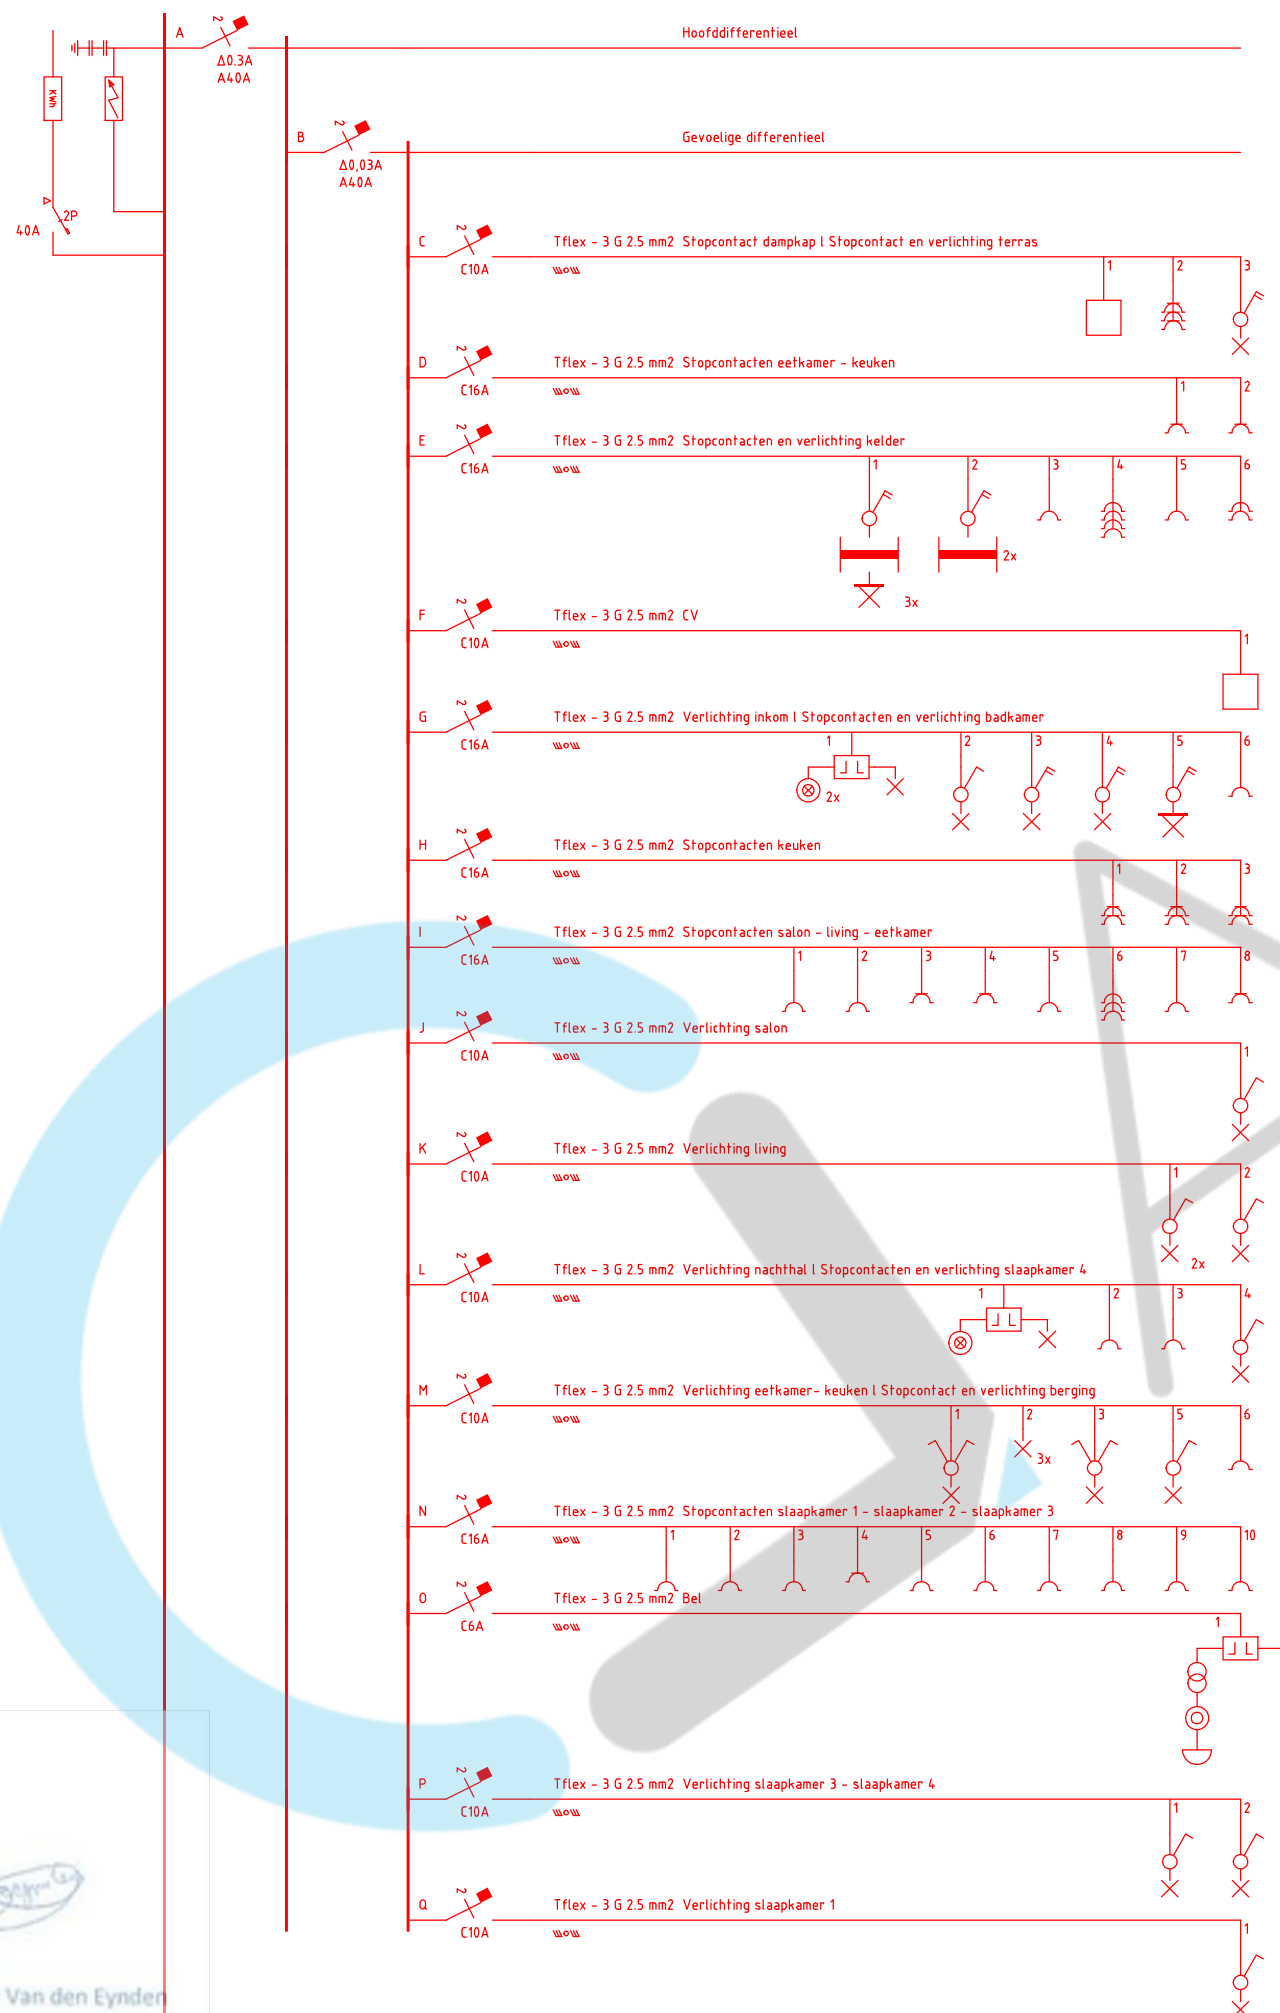

Installateur: Elektriciteitswerken N O P P E	Klant: Naam: Bobber Loos Straat: Spillemansstraat 61 Gemeente: 2140 Borgerhout Projectnr: 2025055	Datum: 10/03/25
		Get. door: Hilde
		Aanpassing: A3

Kringenverklaring

Spillemansstraat 61 - 2140 Borgerhout

EL.BORD

Kring	Omschrijving
A	Hoofddifferentieel
B	Gevoelige differentieel
C	Stopcontact dampkap Stopcontact en verlichting terras
D	Stopcontacten eetkamer - keuken
E	Stopcontacten en verlichting kelder
F	CV
G	Verlichting inkom Stopcontacten en verlichting badkamer
H	Stopcontacten keuken
I	Stopcontacten salon - living - eetkamer
J	Verlichting salon
K	Verlichting living
L	Verlichting nachthal Stopcontacten en verlichting slaapkamer 4
M	Verlichting eetkamer- keuken Stopcontact en verlichting berging
N	Stopcontacten slaapkamer 1 - slaapkamer 2 - slaapkamer 3
O	Bel
P	Verlichting slaapkamer 3 - slaapkamer 4
Q	Verlichting slaapkamer 1

