

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.:
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: tahamart@hotmail.com



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 4640000
Voorl. verslagnr.:
Datum: 25/02/2016

Klant / Opdrachtgever:
EI Allaoui El Hassan
De Gyspeestraat 116
2100 DEURNE (ANTWERPEN)

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: Aard installatie:: nieuwe Type lokalen: woning
Plaats onderzoek: De Gyspeestraat 116 DEURNE (ANTWERPEN) 2100
Aard onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek Volgens AREI Art.: 270
Datum onderzoek: 25/02/2016 Volgende binnen 300 maand of vóór 28/02/2041 Onderzoeker: AKCAOGLU ATILLA
Eigendom van: EI Allaoui El Hassan
Installateur: -
B.T.W.: - ID-kaart: - Uitgereikt te: - Datum: -

BESCHRIJVING

EAN nr.: - Teller nr.: - Stand I: - Stand II: -
Aansluiting: bovengronds Wachtbuis: geplaatst Isolatieplaat: niet aanwezig
Dienstspanning: 1 x 220V Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: aut. 2p 40A Schak.: aut.maatsch.
Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: XVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Aardelektrode: type: pennen sectie: 16 mm² spreidingswaarde: 16,0 Ohm
Diff. schak.: algemene: 2p 40A/300mA is verzegeld met loodje: in orde bijkomende dif.: 2p 40A/30mA
Werking testknop: in orde Controle foutlus: in orde Algemene isolatieweerstand: > 1 MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrisch materieel: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: in orde
Beschrijving installatie - toestellen: zie schema in bijlage één draadschema en situatieschema werd voor gezien getekend
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 12

Zie schema's in bijlage

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

GEEN

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op hoger vermelde datum, zoals voorzien door art. 271 van het AREI,
alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.


Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker

EL ALLAoui EL HASSAN


DE GRYS PEERSTRAAT 116
2100 Durne


DE GRYS PEERSTRAAT 116
2100 DEURNE

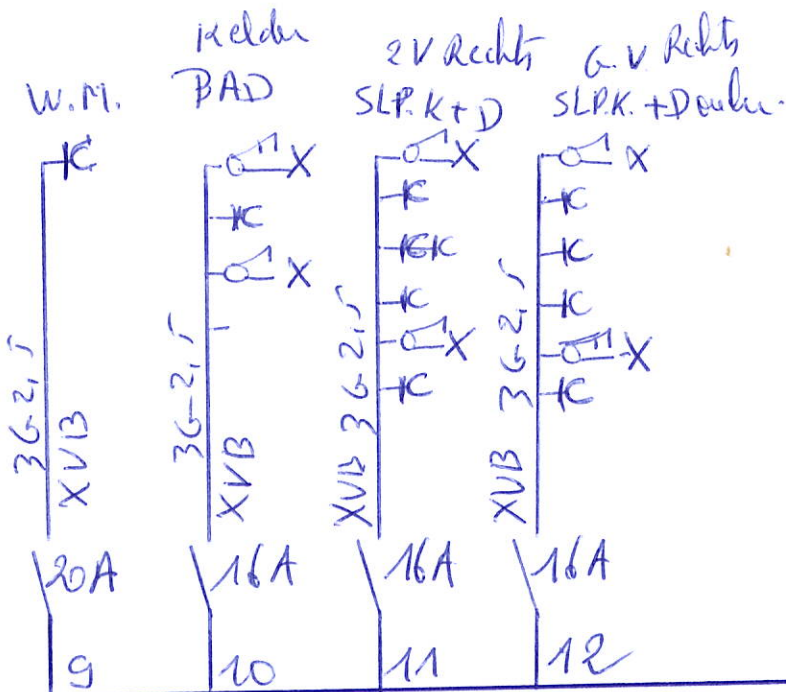

AKCAOGLU Atilla
GSM: 0498/246.132
atilla.akcaoglu@eeb.be

25-02-2016
RP: 6640000

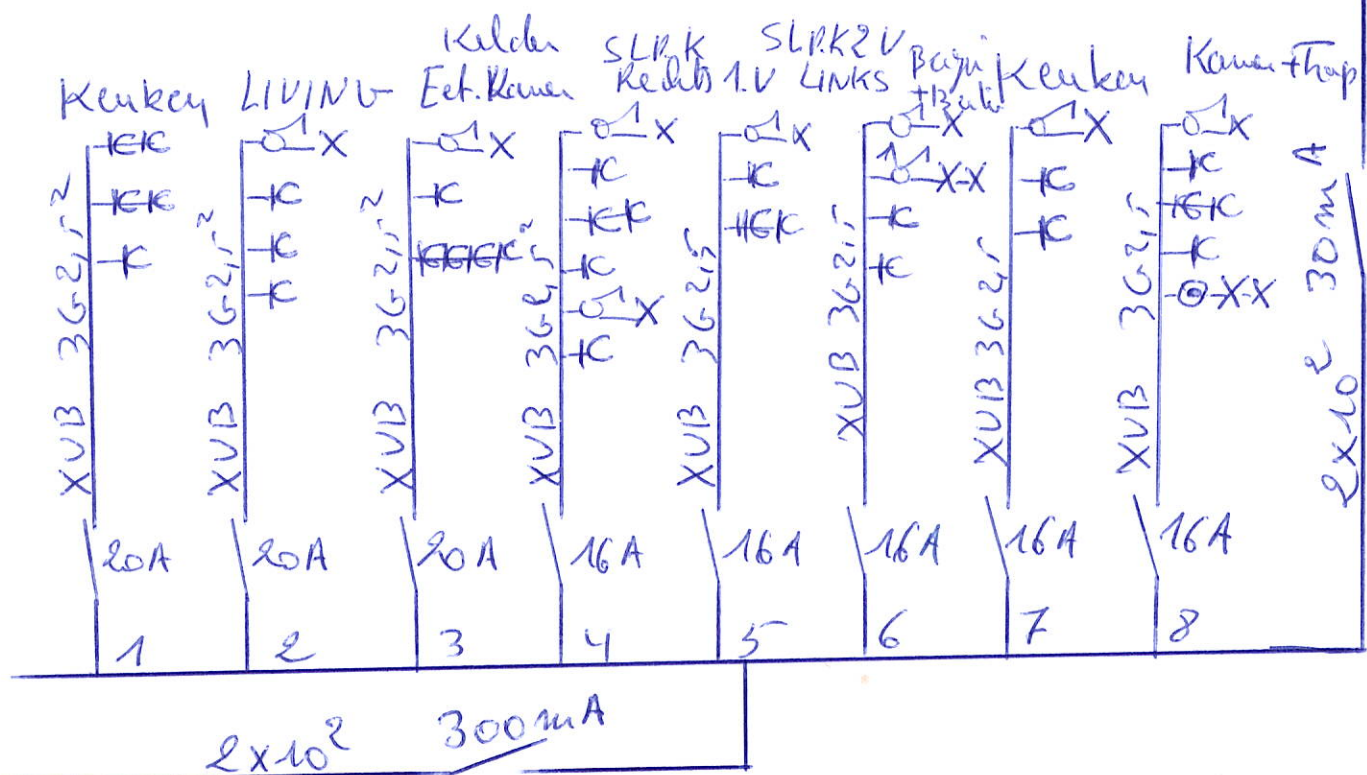

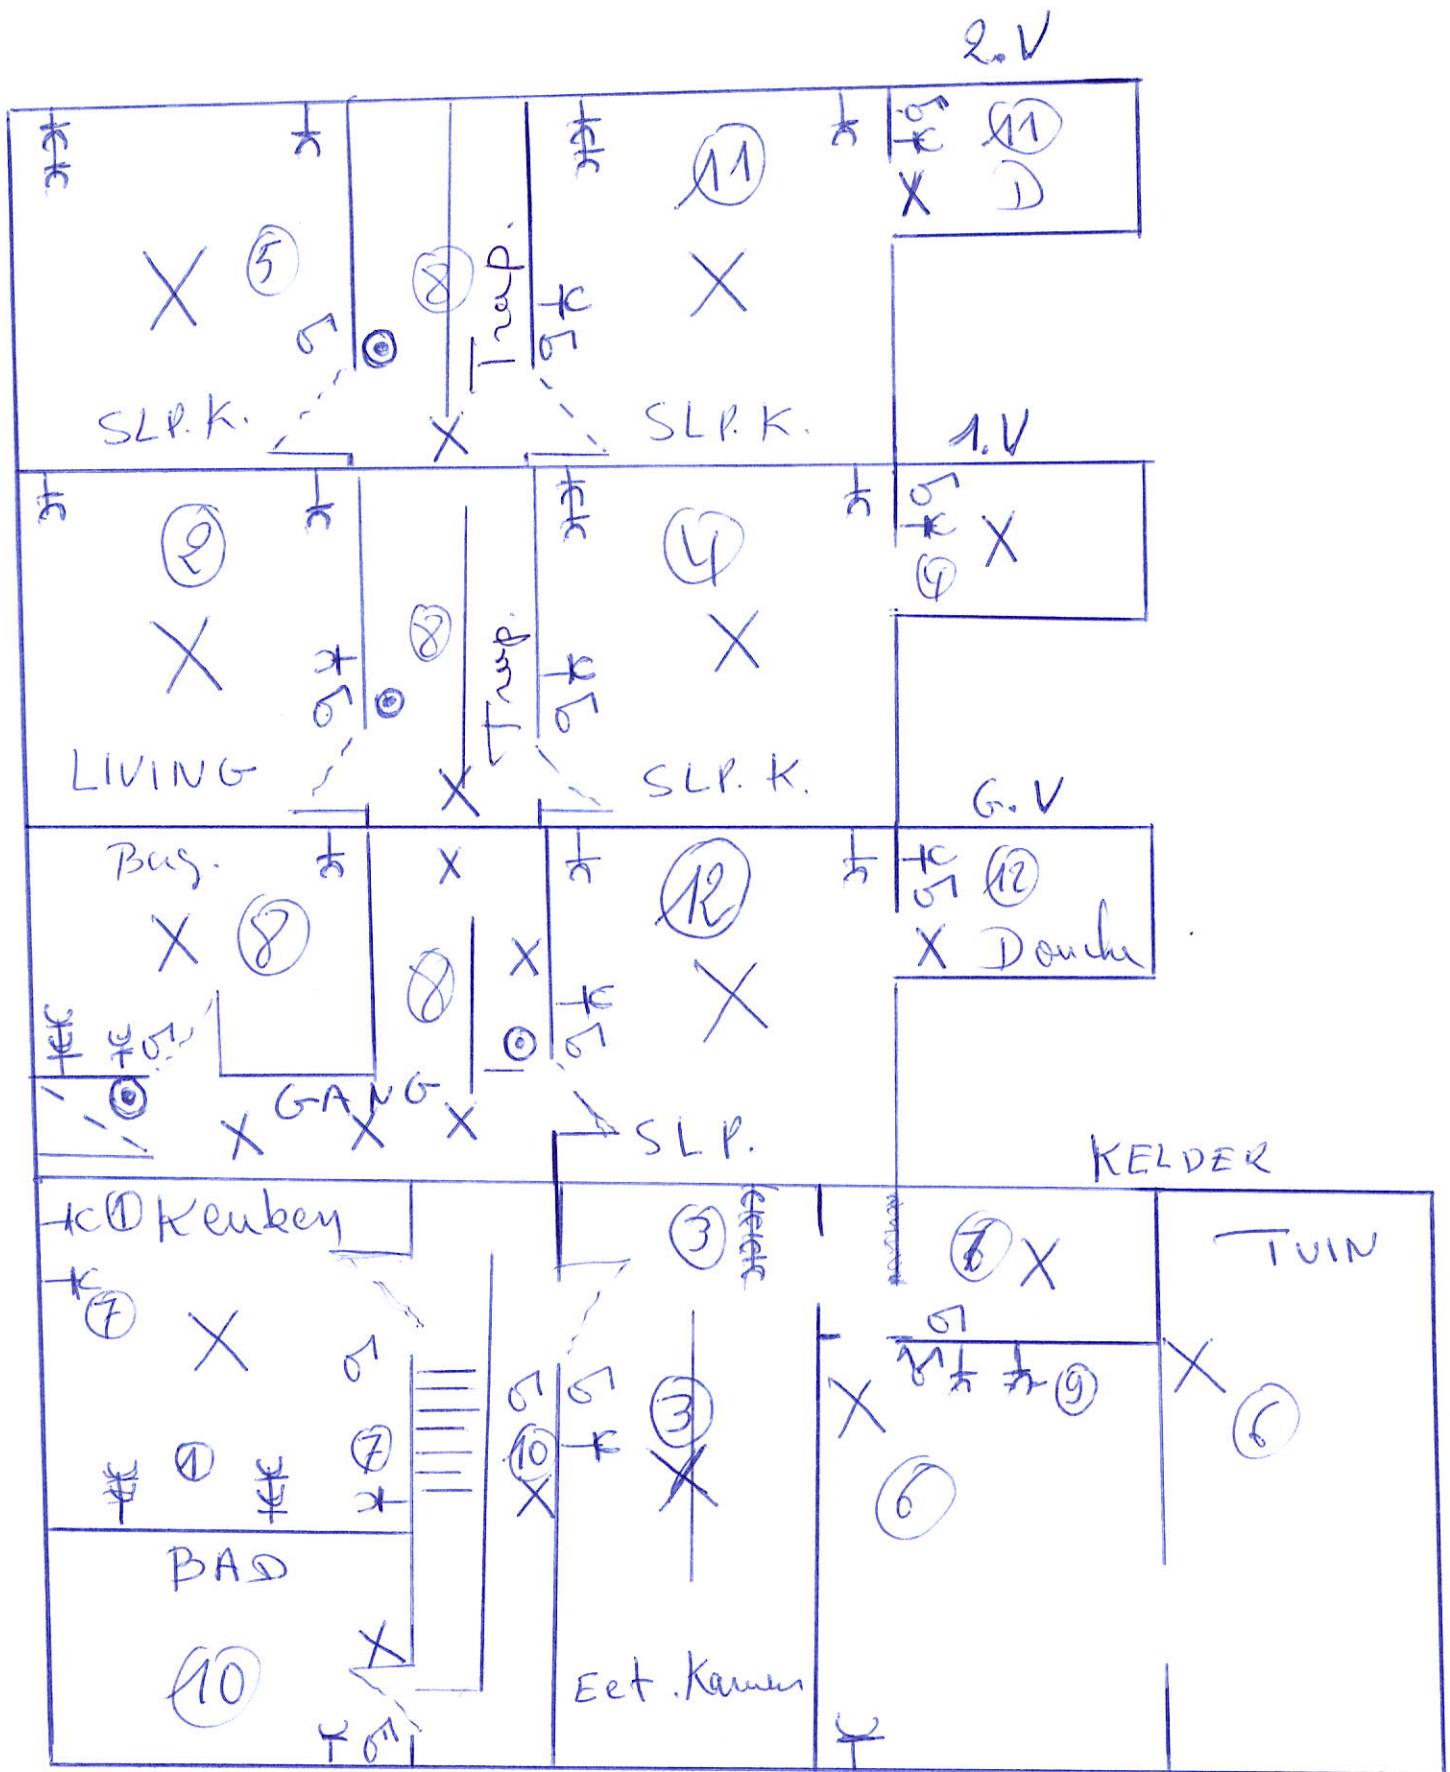

DE GRYS PEERSTRAAT 16
2100 DEURNE

ELALLAOUI ELHASSAN

AKCAOGLU Atilla
GSM: 0493/246.132
atilla.akcaoglu@ocb.be
