



Beter gekeurd
Bien vérifié

PROCES-VERBAAL VAN HET ONDERZOEK VAN
EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

DE INSTALLATIE IS CONFORM

Het onderzoek gebeurt volgens werkinstructie 10le006 of 10le008 op basis van de hieronder vermelde voorschriften.

Uw controle werd uitgevoerd door BTV VZW, kantoor BTV Antwerpen, Noorderlaan 109 bus 5, 2030 ANTWERPEN
T: 03 216 28 90, E: btv.antwerpen@btvcontrol.be

Verslagnummer: 0344-190902-07

Datum van het onderzoek : 02/09/19

Extra controle datums:

ALGEMENE GEGEVENS:


ADRES INSTALLATIE : Hofman
DRABSTRAAT 2 glv
2640 MORTSEL

EIGENAAR : Hofman
Adres : DRABSTRAAT 2 glv
2640 MORTSEL

OPDRACHTGEVER : BELGAELECTRIC
Adres : RAAFSTRAAT 11
2018 ANTWERPEN

INSTALLATEUR : BELGAELECTRIC
Adres : RAAFSTRAAT 11
2018 ANTWERPEN

Visualisatie van de installatie

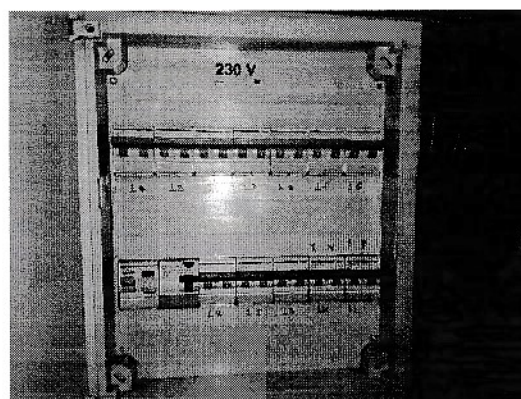

BTW of IK :

EAN :

Teller nr.

6127655

Index :

ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN:

Aard installatie :	Wijziging /	Type der Lokalen :	Appartement
Begin werken fundering:	Voor 01/10/81	Elektrische installatie :	Na 01/10/81
Aansluiting spanning :	Mono 230V	AREI art. :	86
Voedingskabel hoofdbord :	4 x 10 mm ²	Bescherming van de aansluiting :	63 A
Type van de aardelektrode:	Pennen	Alg. schakelaar: type :	4p 63A/300mA
Aantal borden :	1	Aantal eindstroombanen :	17
Uitwendige invloedsfactoren :		Schema :	TT

ONDERZOEK:

Controlebezoek volgens : AREI art. 271,

VMA - 48.5

MA-LS-02/2015



1 / 3



Beter gekeurd
Bien vérifié

PROCES-VERBAAL VAN HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Aard van het onderzoek : Controlebezoek

METINGEN:

RA: 15 Ohm RI tot >1 MOhm

BESCHRIJVING:

Zie eendraadsschema en situatieschema.

FASTGESTELDE INBREUKEN

Geen

NOTA'S

Geen

BESLUIT

De installatie is conform.

De ééndraads - en situatieschema's werden voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 2/9/2044 (art. 271 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De agent-onderzoeker,
0344 LUDO DE GROOTE

voor De Directeur,



UITGEVOERDE CONTROLES

Tijdens het controleonderzoek van huishoudelijke installaties (art. 271)

- a) de controle van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's;
 - b) de controle van de staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrisch materieel in het bijzonder wat betreft de schakelaars, de stopcontactdozen, de aansluitingen in de verdeelborden,...;
 - c) de controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking;
 - d) de controle van de werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting;
 - e) de controle van de foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom van minimum 2,5 maal de gevoeligheid van het apparaat;
 - f) de controle van de continuïteit van de equipotentiële verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse 1
 - g) de visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen;
 - h) de visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
- Behoudens inbreuken, wordt de overeenstemming bevestigd tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS, HUURDERS

- a) de verplichting het proces-verbaal van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie samen met de ééndraadschema's en de situatieplannen;
- b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden;
- c) de verplichting de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit;
- d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

Betekenis van de nota's: betreffen gebreken die geen invloed hebben op de besluitvorming, vaststellingen die buiten het kader van onderzoek vallen maar een gevaar inhouden voor de veiligheid, of organisatorische gegevens.

VMA - 48.5

Verslagnummer 0344-190902-07



2 / 3



Beter gekeurd
Bien vérifié

PROCES-VERBAAL VAN HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

WELKE STAPPEN NEMEN ALS INSTALLATIE CONFORM IS

STAP 1

Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's.

STAP 2


Bij belangrijke uitbreidingen van de installatie, laat opnieuw controleren.

STAP 3

Een herkeuring van de installatie is verplicht voor 2/9/2044.

STAP 4

BTV Antwerpen staat tot uw dienst voor de noodzakelijke keuringen.

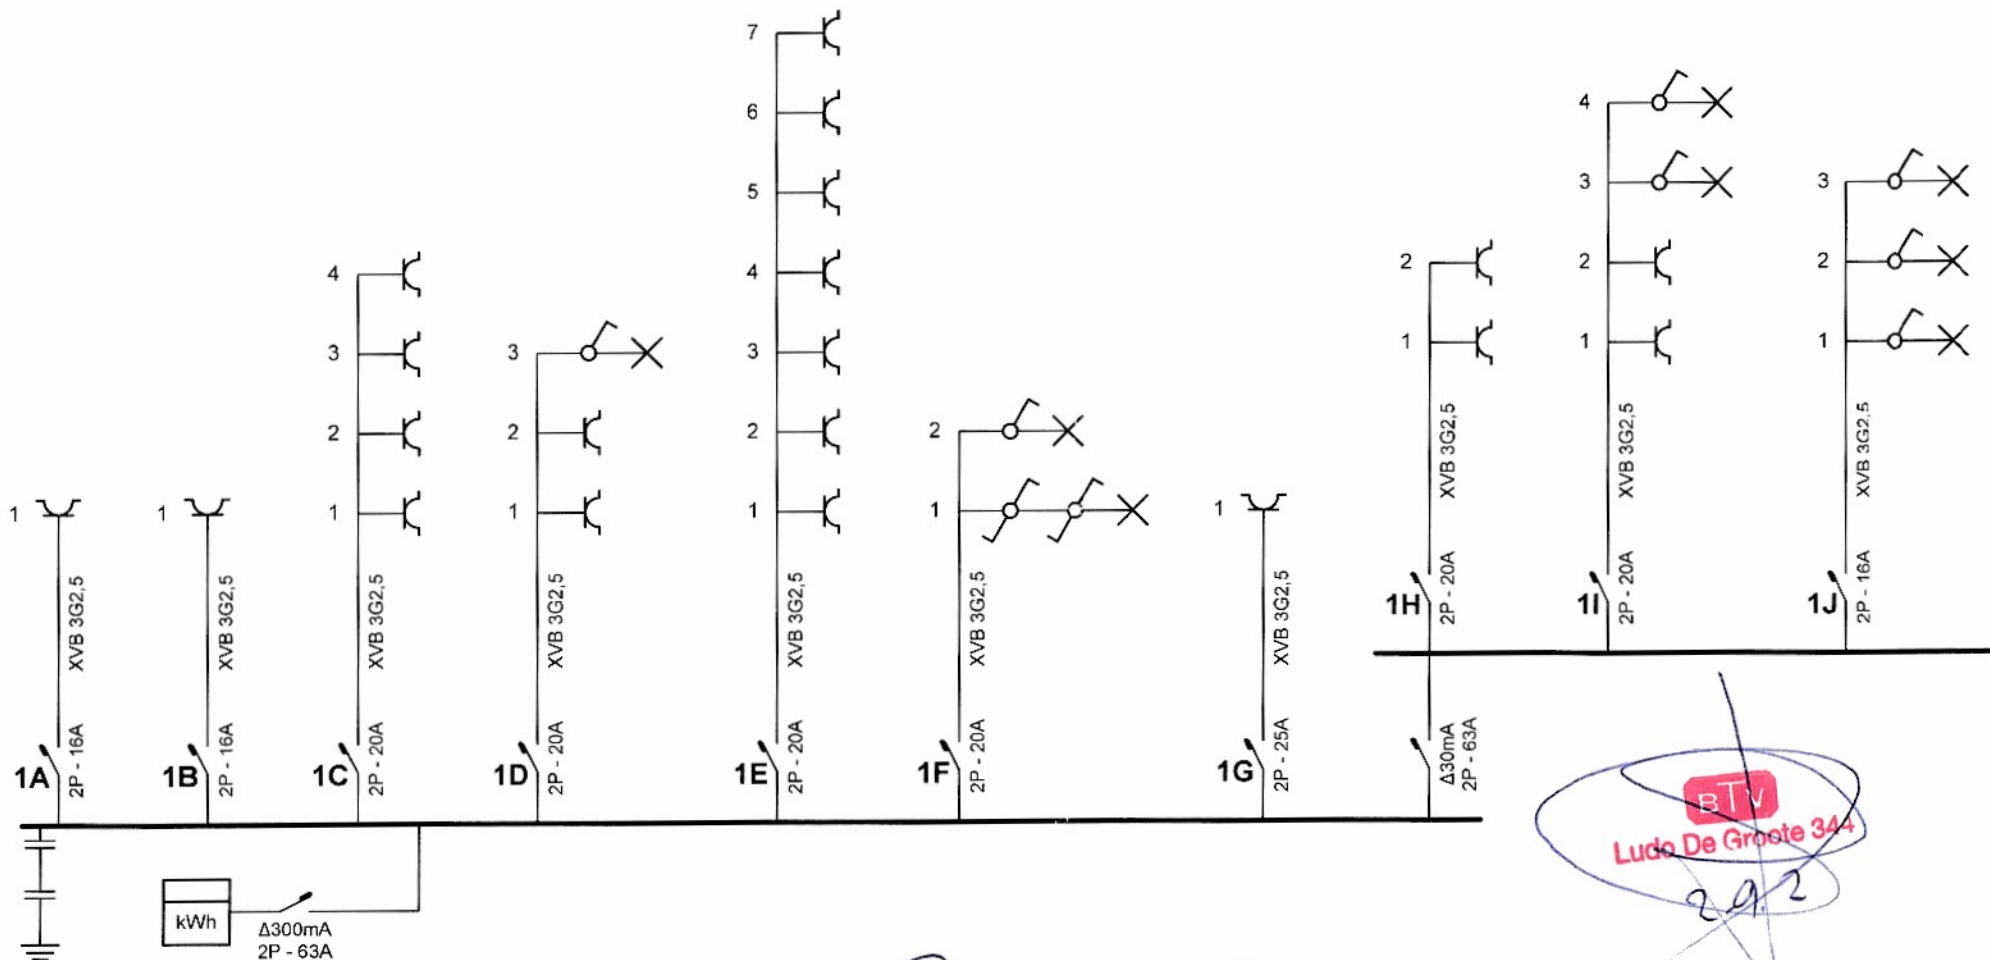

Plaats van de elektrische installatie
Joseph Hoffman
Drabstraat 2 Bus GV
2640 Mortsel


Installateur
Belgaelectric bvba
Raafstraat 11
2018 Antwerpen
e-mail: www.belgaelectric.be
BE 0696.965.784

p. 1/5
Eendraadschema

Datum: 02/09/2019

2 x 230V ~ 50Hz

Schema's getekend door: Belgaelectric bvba Belgaelectric - BTW BE 0841.991.474

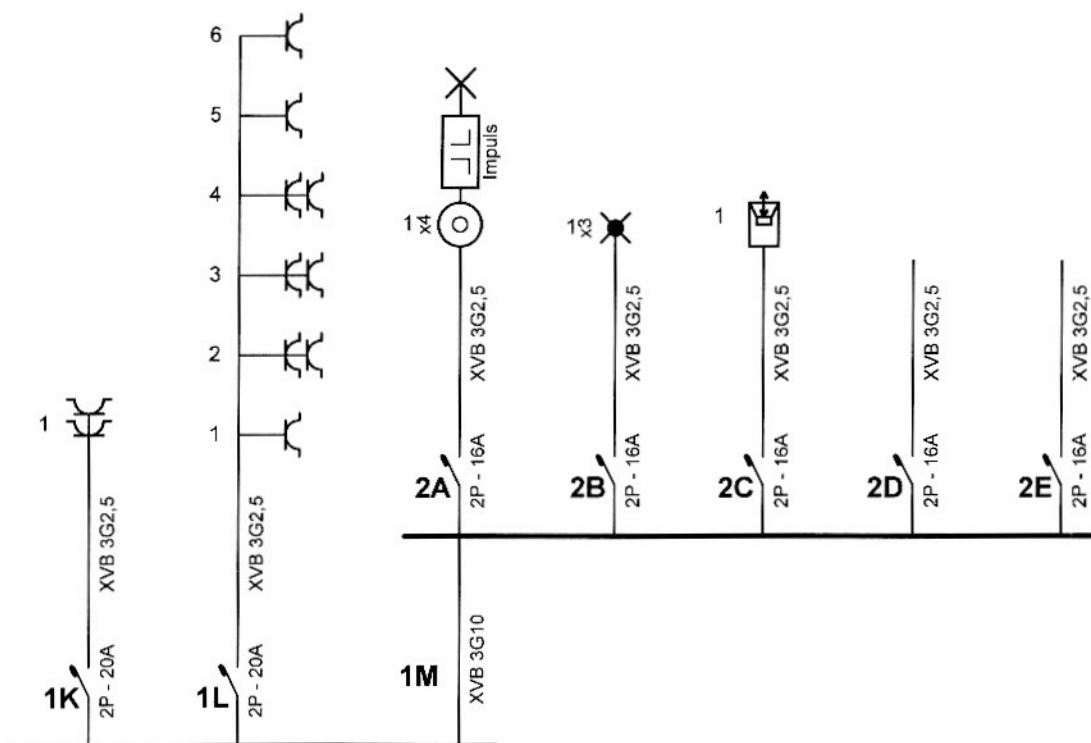

BTW
Ludo De Groot 344

Plaats van de elektrische installatie
Joseph Hoffman
Drabstraat 7 Bus GV
2640 Mortsel

Installateur
Belgaelectric bvba
Raafstraat 11
2018 Antwerpen
e-mail: www.belgaelectric.be
BE 0696.965.784

02

p. 2/5
Eendraadschema

Datum: 02/09/2019

2 x 230V ~ 50Hz




che installate



2 x 230V ~ 50Hz

Schema's getekend door: Belgaelectric bvba Belgaelectric - BTW BE 0841.991.474

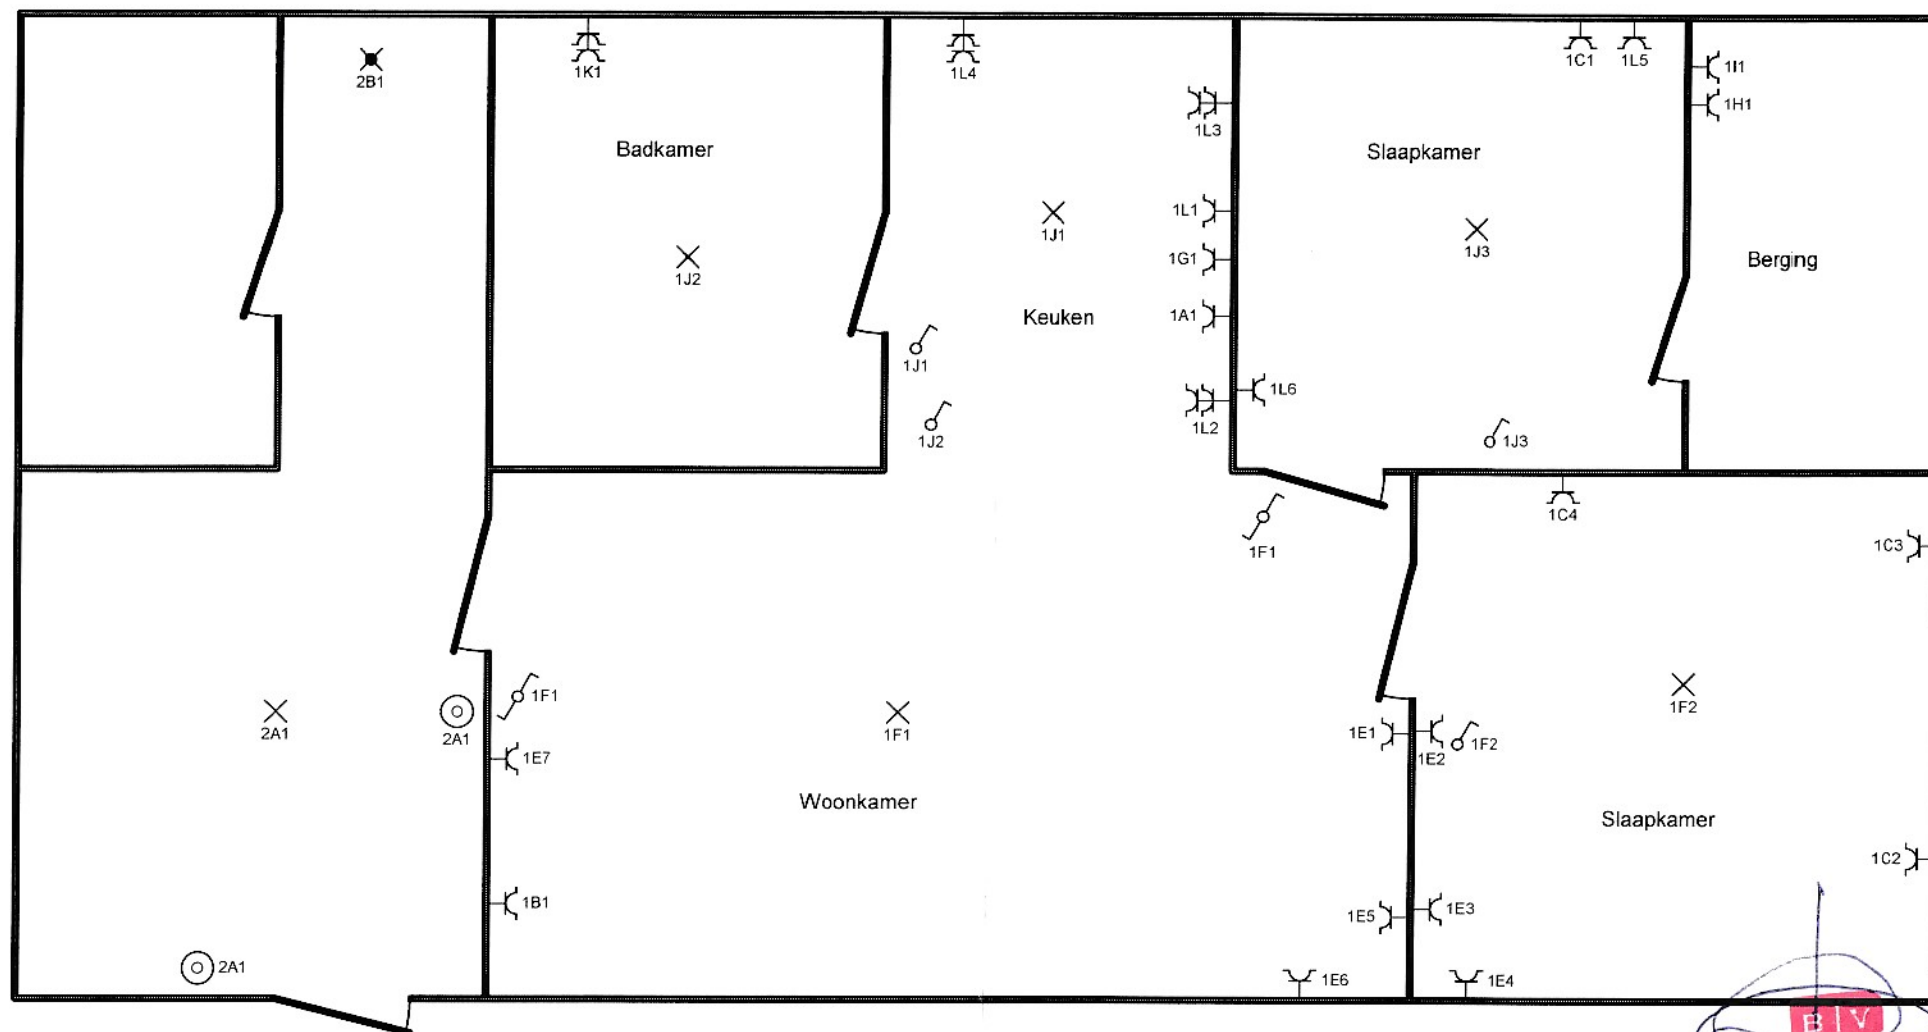

Gelijkvloers

BIV
Ludo De Groot 344

Plaats van de elektrische installatie
Joseph Hoffman
Drabstraat 2 Bus GV
2640 Mortsel

Installateur
Belgaelectric bvba
Raafstraat 11
2018 Antwerpen
e-mail: www.belgaelectric.be
BE 0696.965.784

p. 4/5
Situatieschema

Datum: 02/09/2019

2 x 230V ~ 50Hz

Schema's getekend door: Belgaelectric bvba Belgaelectric - BTW BE 0841.991.474

- 1A OVEN
- 1B stopcontact living
- 1C stopcontact slaapkamer
- 1D Garage
- 1E stopcontact living en slaapkamer
- 1F verlichting living en slaapkamer
- 1G KOOKPLATE
- 1H WASMACHINE
- 1I BOILER
- 1J BADKAMER, KEUKEN, ACHTER KAMER
- 1K BADKAMER
- 1L KEUKEN STOPCONTACT
- 1M
- 2A TRAPAUTOMAAT
- 2B NOODVERLICHTING
- 2C PARLOFONIE
- 2D reserve
- 2E reserve

Plaats van de elektrische installatie
Joseph Hoffman
Drabstraat 2 Bus GV
2640 Mortsel

Installateur
Belgaelectric bvba
Raafstraat 11
2018 Antwerpen
e-mail: www.belgaelectric.be
BE 0696.965.784

p. 5/5
Lijst Kringen

Datum: 02/09/2019

2 x 230V ~ 50Hz

Schema's getekend door: Belgaelectric bvba Belgaelectric - BTW BE 0841.991.474
