


Adres- en onderzoeksgegevens

Adres installatie Steenweg Deinze 106A, 9810 Nazareth
 Naam eigenaar The Ponderosa
 Adres eigenaar .
 Type object Winkel + Atelier
 EAN-code niet beschikbaar
 Aard installatie bestaand
 Doel onderzoek herkeuring



Het onderzoek is verricht op 31/10/2019 volgens artikel art 271 van het ARB en onze procedure(s) TP02.

Installatiegegevens

Spanning (V)	3N400 (3f + N)	In hoofdschakelaar (A)	80 en 63 en 40
Type elektrode	pen	ΔI differentiële schakelaar(s) (mA)	300 en 30
Ø voedingsleiding (mm ²)	25	Aantal verdeelborden	8
In hoofdbeveiliging (A)	80	Aantal stroombanen per verdeelbord	43, 9, 11, 9, 28, 5, 6 en 7

Metingen

Ra / Zs (Ω)	21,70 / --	Werking differentiële schakelaar(s)	goed
Continuïteitsmeting	goed	Isolatiweerstand van de installatie (M Ω)	>0,5

Inbreuken

ADS: Automatische differentiële schakelaar

Opmerking: Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / goten etc. zijn niet losgemaakt. Indien er tijdens de keuring geen schema's aanwezig waren is het mogelijk dat er bepaalde delen van de installatie niet werden vastgesteld.

Opmerkingen

Onwille van de noodzaak aan bedrijfscontinuïteit kon geen algemene beveiligingsmeting worden uitgevoerd. Ook de werking van de automatische schakelaar kon niet worden getest. Bijgevoeg was het ook niet mogelijk te controleren of de juiste limieten bestaen worden bevestigd door een differentiële schakelaar van 30mA.
 De inbreuken/opmerkingen van rapport RAP1001.012.4634558.REV0 werden aangepast en gecontroleerd.

Besluit

De installatie is conform het ARB. Het onderhoud- en situatierichtlijn is werd niet gezien getoetst. De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk 31/10/2024 (art. 271 ARB) alsook voor ingebruikname van elke belangrijke wijziging of aanzienlijke uitbreiding uitgevoerd voor deze datum.

Voor de directeur, op 31/10/2019


Naam agentonderzoeker: Thomas Neiryck

Handtekening:

Raadgevingen

- Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie.
- In het dossier dient elke wijziging aan de elektrische installatie vermeld te worden.
- Bij elk ongeluk aan personen overkomen, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, dient de Minister van Economische Zaken, Directie Elektrische Energie, te worden gewaarschuwd.
- Wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het onderzoek, dient men een nieuw controlebezoek te laten verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

Bord 5 DUREEL 1E1111

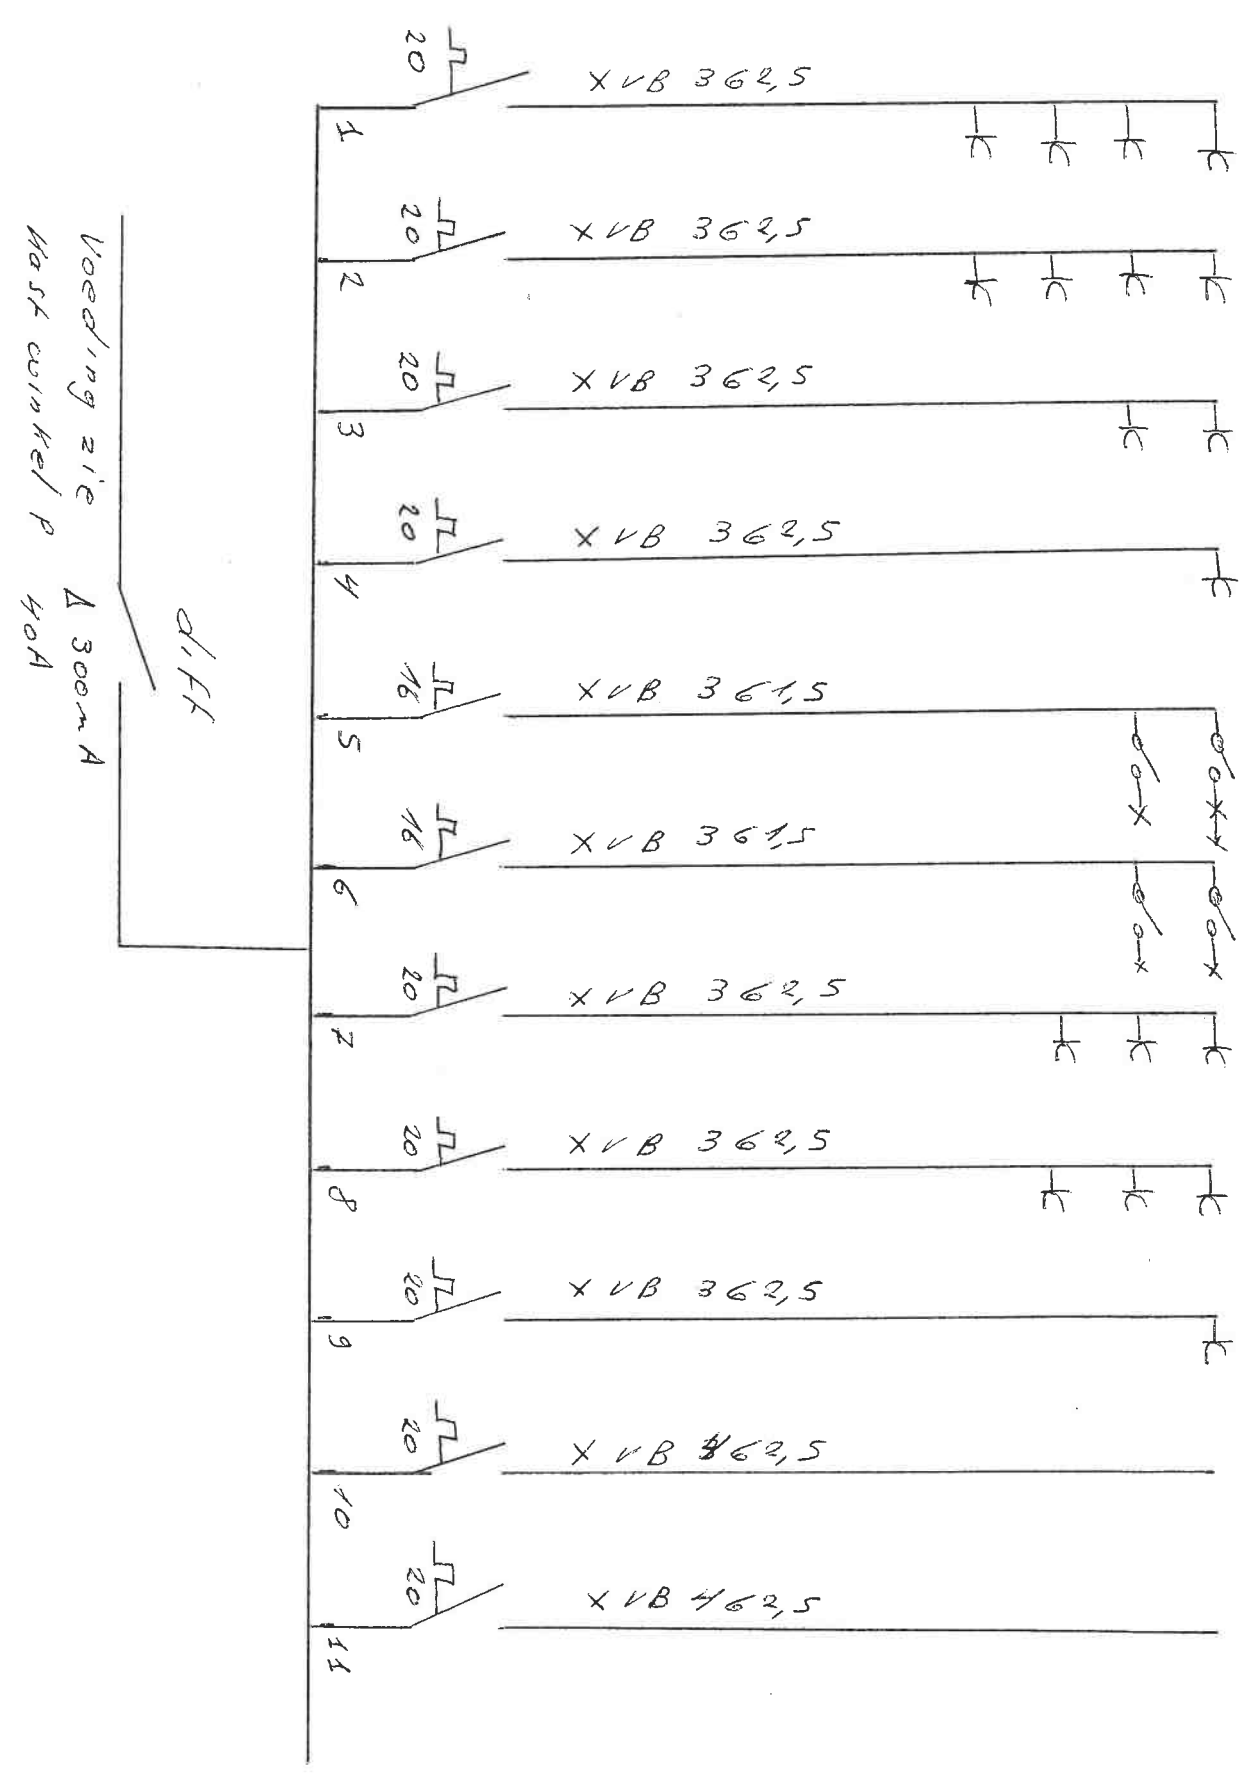

Zekeringskast winkel

1. Sturing teleruytors
2. Deurbel huis beneden
3. Voeding telefooncentrale
4. Voeding klok buitenverlichting
5. Verlichting achterste gedeelte winkel
6. Verlichting achterste gedeelte winkel
7. Verlichting bureel boven
8. Verlichting winkel (gang aan zekeringskast + 1^e deel)
9. Verlichting spots
10. Verlichting winkel
11. Verlichting winkel (rekken werkmateriaal)
12. Verlichting winkel
13. Reserve
14. Reserve
15. Reserve
16. Reserve
17. Reserve
18. Stopcontacten onder zekeringskast
19. Voeding brandalarm
20. Voeding inbraakalarm
21. Stopcontacten winkel
22. Stopcontacten winkel
23. Stopcontacten winkel
24. Stopcontacten winkel
25. Voeding zekeringskast (huis en magazijn boven)
26. Voeding atelier
27. Voeding zekeringskast winkel (hier)
28. Voeding zekeringskast bureel (Peter)
- A. Verliesstroomschakelaar winkel (hier)
- B. Verliesstroomschakelaar voor 1 -2 – 3 – 4
- C. Verliesstroomschakelaar voor zekeringskast bureel (Peter)

37. Voeding kosten met stopcontacten in werkplaats
38. Voeding kosten met stopcontacten in werkplaats
39. Voeding kosten met stopcontacten in werkplaats
40. Voeding kosten met stopcontacten in werkplaats
41. Voeding kosten met stopcontacten in werkplaats
42. Voeding kosten met stopcontacten in werkplaats
43. Verliesstroomschakelaar voor 44-45-46
44. Verlichting wc/wasplaats
45. Boiler
46. Waterpomp
