



DE INSTALLATIE IS CONFORM

Datum(s) van controle: 23/05/2022
Verslagnummer: 0544-220523-05

Uitgiftedatum verslag: 23/05/2022

Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Technisch Bureau Verbrugghen
Adres: Neerveldstraat 109 bus 6, 1200 Brussel
T: 016 63 47 45 **E:** btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be **Ondernemingsnummer:** 0406.486.616
De agent-bezoeker: nummer 0544

Identificatie van derden:

Opdrachtgever: DUMONT SIMON
Adres: TIENSESTEENWEG 214, 3360 BIERBEEK
Naam eigenaar, uitbater of beheerder: -
Adres: NEERVELPSESTRAAT 23, 3360 BIERBEEK
Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: DUMONT SIMON
Adres: TIENSESTEENWEG 214, 3360 BIERBEEK
BTW-nummer: 0506957335

Identificatie van de elektrische installatie:

Naam: -
Adres: NEERVELPSESTRAAT 23, 3360 BIERBEEK
EAN- code:
Nummer teller: 4278334
Private hoogspanningscabine: Nee
Type installatie: Wooneenheid

Gegevens van de controle:

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019: Controlebezoek (6.5)
Datum uitvoering van de installatie: Vanaf 01/10/1981 tot 01/06/2020

Informatie inhoud controle: Geen

Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: toegepast
Ander(e) wettelijk(e) kader(s): n.v.t.

RE06_01-08_01 09-21
Verslagnummer 0544-220523-05



Gegevens van de elektrische installatie:

Spanning en aard van de stroom: 3 x 400V + N
 Voedingsleiding hoofdbord: Type: XVB - Doorsnede: 4 x 10 mm²
 Type aardelektrode: Aardingspen
 Aantal borden: 3

Nominale waarde bescherming aansluiting: 20A
 Type algemene schakelaar: 4P 40A/300mA
 Type aardverbindingssysteem: TT
 Aantal stroombanen: 14+8+21 (reserve inbegrepen)


BESCHRIJVING:

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 300 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 30 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's

Zie stroombaanschema's en situatieplannen

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 30 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's

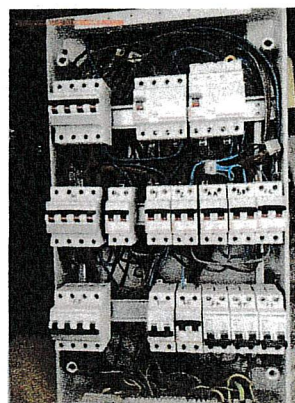

Ref. verslag gelijkvormigheidscontrole: n.v.t.

Plaatsaanduiding ondergrondse leidingen: n.v.t.

Resultaten van de controle:

Metingen en beproevingen:

Spreadingsweerstand van de aardverbinding: 11 Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: 50 MOhm
 Test van de differentieelstroominrichtingen via testknop: OK
 Test van differentieelstroominrichtingen via opwekken foutlus: OK
 Continuïteit van de beschermingsgeleiders: OK

Vastgestelde inbreuken:

Geen

Opmerkingen:

Geen

Besluit van de controle:

1. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 23/05/2047
 - De ééndraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.



RE06_01-08_01 09-21

Verslagnummer 0544-220523-05
