

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

Datum keuring: 01/09/2015

Inspecteur: Jamo Van Gansen

Installateur: -

Datum verslag: 01/09/2015

B.T.W. nr.:-

IK. nr.:-

Merk en type meettoestel: Fluke 1653B

Serie Nr.: 1775063

Toestel mag gebruikt worden tot: 16/01/2016

Plaats van het onderzoek:

Straatnaam	Kruiningenstraat
Huisnummer	159
Postcode	2900
Gemeente	Schoten
Type	woning

Eigenaar:

Naam	Pawel Falowski
Straatnaam	Kruiningenstraat
Huisnummer	159
Postcode	2900
Gemeente	Schoten

EAN : 54

Teller Nr.: : 32767836

Aard onderzoek:

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens AREI artikels 271, 271bis en 86.

Netbeheerder: EANDIS

Spanning: 1~230V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 1

Aantal kringen: 16

Aardelektrode: Pen pen weerstand: 14,8 Ω Isolatie: 6.2 M Ω **DIFFERENTIEELSCHAKELAAR**

I_{Δ}	I_n	$I_{\Delta t}$	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300 mA	40 A	22,5kA2s (3000A)	A	16	Ok	Ok
30 mA	40 A	22,5kA2s (3000A)	A	8	Ok	Ok
mA	A			-	-	-

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Bescherming	Sectie	Aantal kringen	Bescherming	Sectie
Curve	IN	P	Curve	IN	P
		mm ²			mm ²
		mm ²			mm ²
		mm ²			mm ²
		mm ²			mm ²

Visueel nazicht
(algemeen)☒ OK ☐ NOK

Directe aanraking

☒ OK ☐ NOK

Indirecte aanraking

☒ OK ☐ NOK

Aansluitingen

☒ OK ☐ NOK

Correcte schema's

☒ OK ☐ NOKschema in bijlage door Aceg vzw ☐Equipotentiale
verbindingen☒ OK ☐ NOK☐ niet van toepassing☐ in afwachting

Continuïteit

☒ OK ☐ NOKVerlichting /
toestellen☐ OK ☐ NOK ☒ NVT**OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S**

CONCLUSIE


- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI. De volgende periodieke keuring is te voorzien voor 01/09/2040
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.
- ☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Datum:
- ☐ Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het AREI, moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VOOR DE TECHNISCH DIRECTEUR ELEKTRICITEIT

Jamo Van Gansen

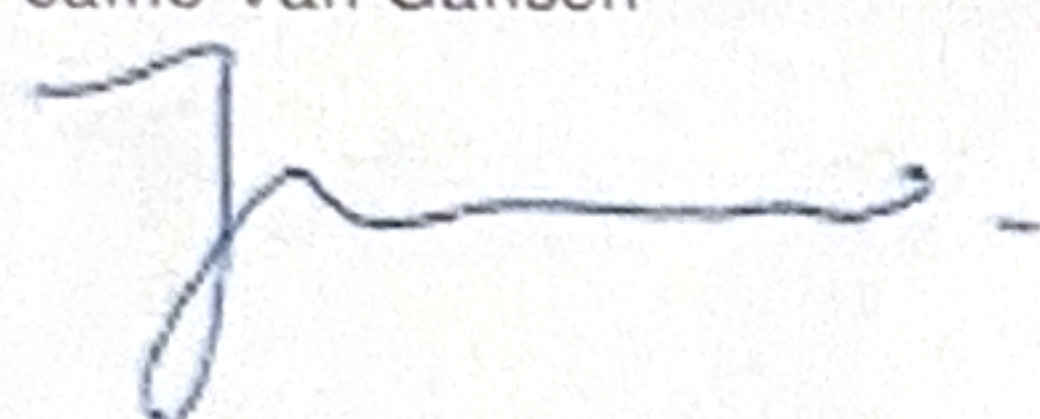

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtevreeks of onrechtvreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de FOD economie, KMO, middenstand en Energie – algemene directie energie, afdeling gas – elektriciteit

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

www.aceg.be

02 / 880.88.90

BE06 7340 3288 4322 - BTW BE0839 866 481
