




ZETEL ANTWERPEN  
Van der Sweepstraat 3 bus 44  
2000 Antwerpen  
Tel. 03 216 28 90  
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL  
Clovislaan 15  
1000 Brussel  
Tel. 02 230 81 82  
Fax 02 230 80 08



O. ref.:

U. ref.:

38/07019/04 VERSLAG NR. :

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES:

EIGEN

Adres:

OPDR

Adres:

INSTALLATEUR:

Adres:

BTW of IK:

Immo Roe  
Heustal

STROOMLEVERANCIER:

Intuelectra

Ref.:

Teller nr.

Index:

Datum van het onderzoek: 19/11/07 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art.262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.)

Aard installatie: Nieuwe - ~~Uitbreiding~~ - ~~Wijziging~~ - ~~Voorlopig~~ - ~~Verzwaren~~: Type der lokalen: HHZ opp

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting Max 63 A

Voedingskabel hoofdbord: 2 x 16 mm<sup>2</sup> Alg. schakelaar: type diff 63A/300mA

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 11; RA: 14,8 Ohm; RI tot 720 MOhm

BESCHRIJVING:

Zie bijgevoegde schema's

Vastgestelde inbreuken en/of nota's:

Geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op
de aangestelde van de stroomverdelers
naam:
handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT

- De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de einddraads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 19/11/2032 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- De installatie is niet conform.
- De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op \_\_\_\_\_

DE AGENT-ONDERZOEKER: nr. + naam + handtekening

36 Leenders JP

De directeur,

INSTALLATION  
**IMMO ROC** SPRL  
 Rue Louis Demousse 31 4040 HERSTAL  
 Tel: 04/2402792 Fax: 04/2402213  
 www.immoroc.be


PROPRIETAIRE

MAASMECHELEN

app T N° 3/1

RDC G

*Handwritten signature*

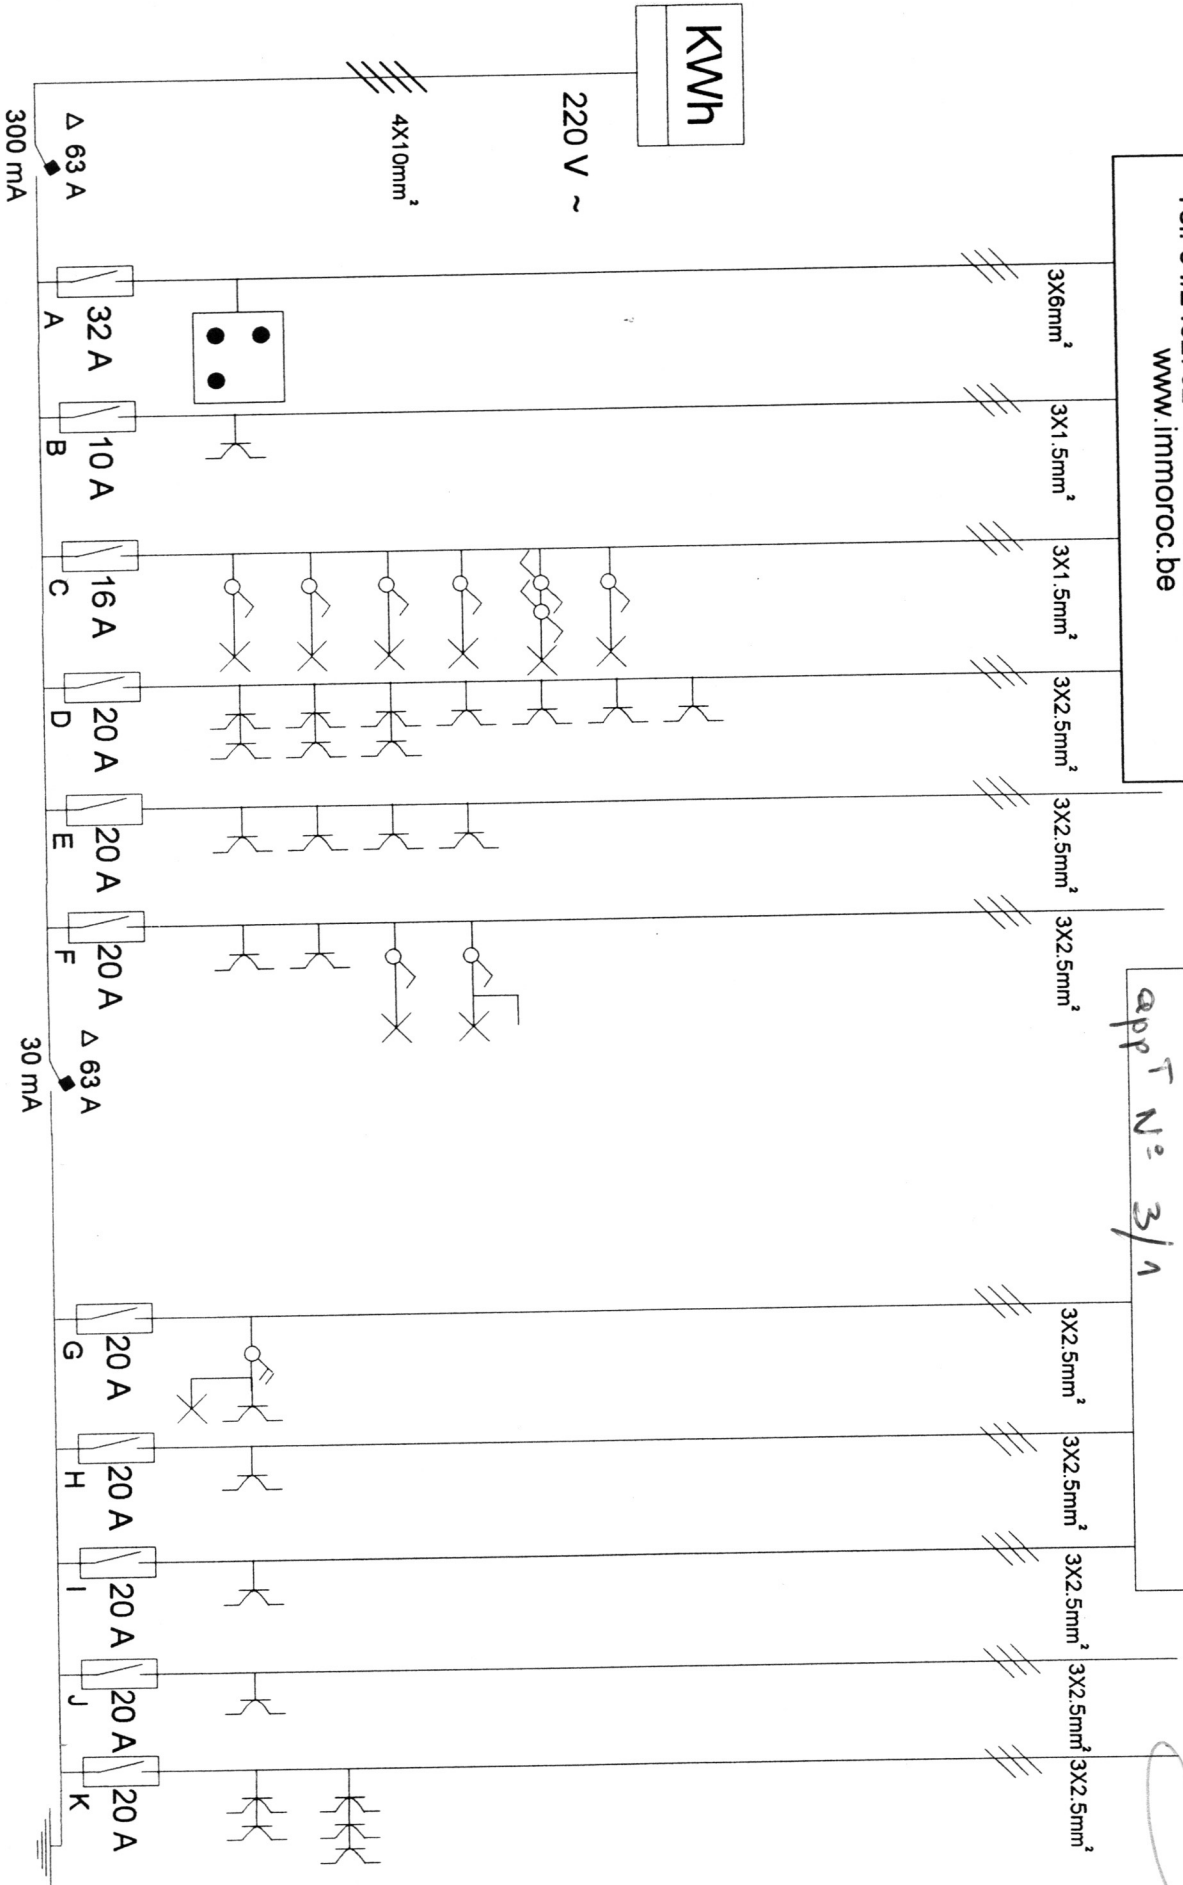

KWh

220 V ~

4x10mm²

300 mA Δ 63 A

3x6mm²

3x1.5mm²

3x1.5mm²

3x2.5mm²

3x2.5mm²

3x2.5mm²

3x2.5mm²

3x2.5mm²

3x2.5mm²

3x2.5mm²

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

32 A

10 A

16 A

20 A

20 A

20 A

20 A

20 A

20 A

20 A

20 A

20 A

30 mA Δ 63 A

