

CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 04/2026/80357/C01:1

DATE DU CONTRÔLE 20/08/2026

AGENT VISITEUR

Mathieu Laixhay

ADRESSE DU CONTRÔLE Rue de Libersart 75 - 1457 Walhain

AGRÈMENT RÉGION WALLONNE

AGRW. TUS-145/A/02 expire le 19/01/2028



COORDONNÉES DE L'EXPLOITANT DE LA CITERNE

Propriétaire Boucher
#TVA non communiqué
Adresse Rue de Libersart 75 - 1457 Walhain

SITUATION DU RÉSERVOIR ET DE SES ACCESSOIRES

Plan d'implantation Non
Situation du réservoir Devant maison
Localisation du dépôtage Sur le réservoir

RÉSERVOIR

Autorisation d'exploitation	Oui	Date d'émission, échéance & numéro	Voir annexe
Capacité autorisée et/ou réelle (litres)	3300	Année d'installation	non communiqué
Origine du réservoir et n° de fabrication	non communiqué	Certificat d'étanchéité antérieur	Non
Dimensions du réservoir	1,3		
Type de réservoir	Cylindrique - Enterré - Simple paroi - Métallique		

CONTRÔLE

Système de chauffage	Chaudière	Fonctionnement du système de chauffage	Fonctionne
Type de raccordement au système de chauffage	Mono-tube	Contrôle des tuyauteries visibles du réservoir au système de chauffage	Conforme
Soutirage	Par le haut - Conforme	Conduite de remplissage	Conforme
Conduite de ventilation	Conforme	Système anti-débordement	sifflet 95% - test OK - hauteur de la tige OK
Système de mesure de niveau	pas présent	Trou d'homme	Conforme
Pollution en dehors du réservoir	non vérifiable	Trou d'homme : étanchéité et fixation couvercle :	OK

TEST AUX ULTRASONS

Hauteur de produit avant le test (cm)	38	Test étanchéité chaîne de mesure	OK
Test de bon fonctionnement avant contrôle de la sonde N (gazeux)	Ok	Test de bon fonctionnement avant contrôle de la sonde R (liquide)	OK
Valeur de référence valeur phase gazeuse :	-5,5	Valeur de référence phase liquide :	-3,1
Dépression atteinte (mbar) :	-250	Résultat de l'épreuve d'étanchéité - Valeur phase gazeuse :	-5
Résultat de l'épreuve d'étanchéité - Valeur en phase liquide :	-3,1	Hauteur de produit après le test (cm)	38
Résultat du test accoustique	Conforme	Durée du test (minutes):	60

Appareil SDT 340 référencé «284220030» et vérifié le 11/06/2026 selon nos procédures internes.

Conclusion : Le réservoir est étanche et peut rester en service. Une prochaine visite doit avoir lieu avant le 20/08/2029



Une plaquette verte a été fixée et scellée sur la conduite de remplissage du réservoir le jour même du contrôle.

Le réservoir a fait l'objet d'un contrôle conformément aux prescriptions de :

- 30 novembre 2000 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Titre III du règlement général pour la protection du travail en ce qui concerne les contrôles des dépôts de liquides inflammables et l'implantation et l'exploitation des stations - service (M.B. 17.01.2001)
- 8 mai 2003 - Arrêté ministériel dérogeant aux dispositions de l'article 590 du titre III du RGPT portant sur le contrôle d'étanchéité des dépôts de liquides inflammables en insérant une nouvelle technique de contrôle: le test en dépression (M.B. 19.03.2004)
- 17 juillet 2003 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations - service
- 24 juillet 2008 - Arrêté du Gouvernement wallon du modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations - service.

Fait à : Walhain

Signature du technicien

CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 04/2026/80357/C01:1

ANNEXES

Système de chauffage



Listing test d'étanchéité de la chaîne de mesure avant contrôle



CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

EXEMPLAIRE ORIGINAL


RÉF. 04/2026/80357/C01:1

ANNEXES

Listing test d'étanchéité de la chaîne de mesure avant contrôle



Listing test d'étanchéité du réservoir

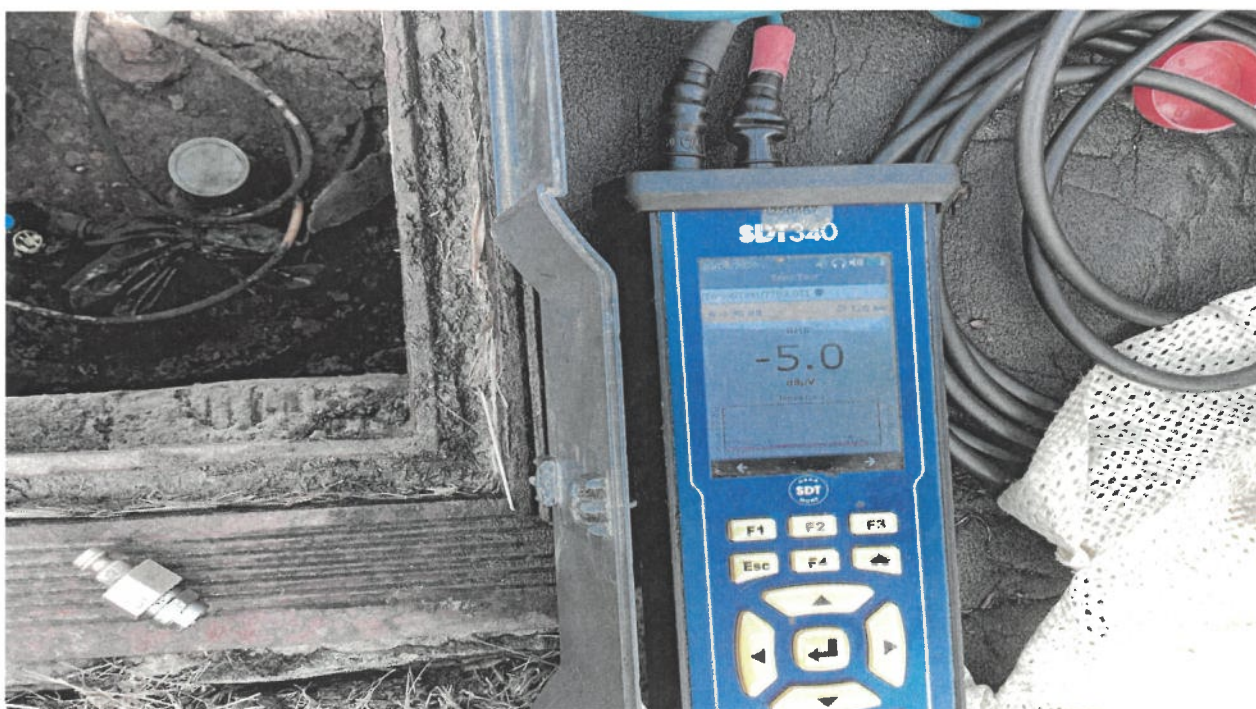


CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 04/2026/80357/C01:1

> ANNEXES

Listings test d'étanchéité du réservoir

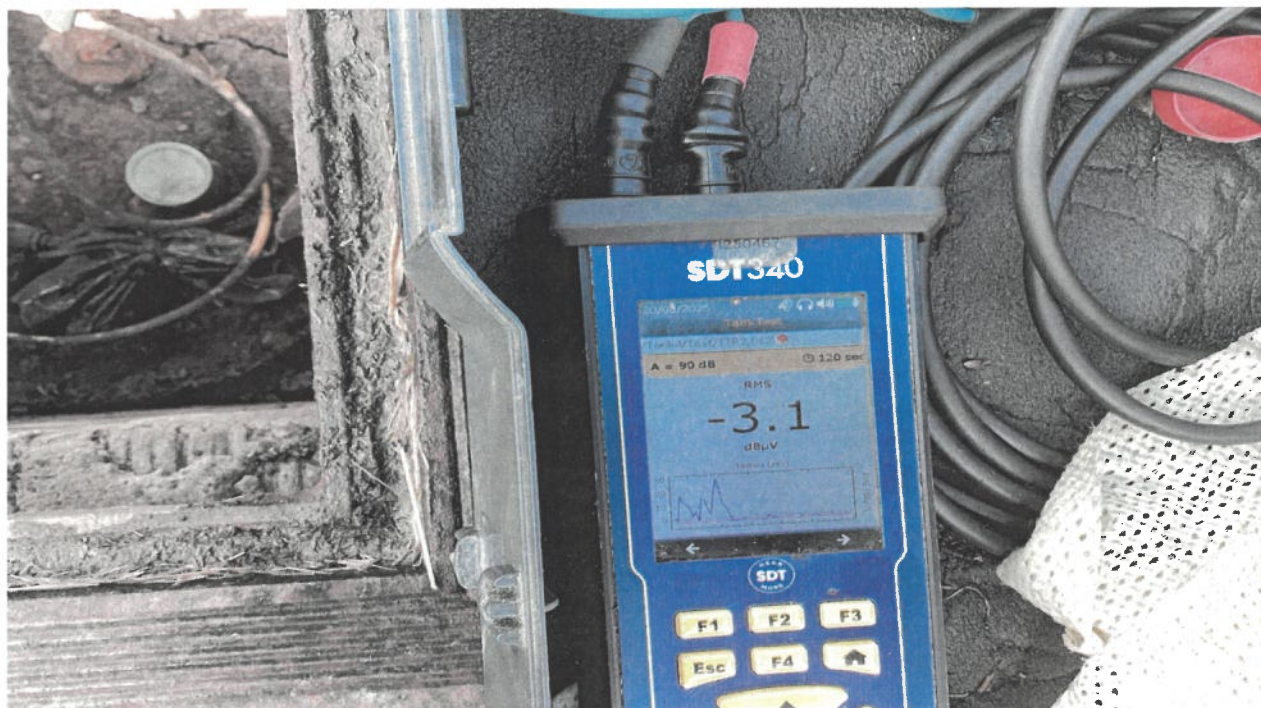

Enregistrement des capteurs avec la fuite calibrée



CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 04/2026/80357/C01:1

ANNEXES

Enregistrement des capteurs avec la fuite calibrée



Autorisation d'exploitation

1. **Données de l'exploitant**

Nom: **Dominique Boucher**

De: **Cassandra Lige <cassandra.lige@walhain.be>**

Envoyé: **mardi 18 août 2026 13:31**

A: **Dominique Boucher**

Objet: **déclaration environnementale - 2026/CL3/047**

Pièces jointes: **1186663-724991.pdf**

Bonjour,

J'ai bien reçu votre déclaration environnementale. Cependant, il manque la capacité de la citerne ainsi que la précision indiquant si celle-ci est aérée ou enterrée.

Cordialement,

Cassandra Lige
Agent Administratif
Service urbanisme
Tél: 010/65.33.93

WALHAIN
Centre de gestion des déchets

En Trottinette les déchets de votre ville
Courriel: **place.commune@walhain.be**
Bureau: **Champs du Ferri, 81 1457 Walhain**
Email du service: **urbanisme@walhain.be**

CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 04/2026/80357/C01:1

ANNEXES

Chambre de visite et accessoires

