Rapport nr.: 3050042
Elekt. Mij. Klant Nr. : Iveka
Teller nr. :
Stand I :
Stand II :

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	

O.C.B.
Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

app. 2.1.

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN ~~WERF- OF TIJDELIJKE AANSLUITING~~ - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / ~~controlebezoek~~ op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001
volgens : AREI art. 270 / ~~AREI art. 271~~ / ~~AREI art. 276~~ /
Aanvulling verslag nr.
Aard installatie : ~~Nieuwe / Uitbreiding / Wijziging / Voorlopig / Bestaande / Verzwaring / Splitsing meter / Spanningswijziging~~
Type der lokalen : huishoudelijk
Plaats van onderzoek : Otterstr. 192 Turnhout
Eigendom van :
Opdrachtgever : Wauters Elektro Arendonk
Installateur : idem
BTW : ID-kaart : Uitgereikt te : Datum :
Onderzoeker : J. Bertels Datum van onderzoek : 5/5/6

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V ~~3 x 230 V~~ ~~3 x 380 V + N~~ Max. Beveiliging : 40A Omschakelaar: stand :
Hoofdbeveiliging : Zek. : aut. maatschappij Schak. :
Meter-bordverbinding : kabeltype : XVB aantal geleiders : 4 doorsnede : 10 mm²
Voedingsbekabeling : kabeltype : aantal geleiders : doorsnede : mm²
~~Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net~~/ondergronds net - Wachtbuis : ~~geplaatst/niet geplaatst~~ - Isolatieplaat : ~~aanwezig/niet aanwezig~~

Aardelektrode : Type : lus / ~~baren / pennen / horizontale geleiders~~ Sectie : 35 mm² Spreidingswaarde : 17 Ω
Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 10 Algemene isolatieweerstand : >10 MΩ
Diff. schak. : algemene : 2p 40A-300 mA bijkomende : 2p 40A-30 mA

Beschrijving : zie schema's in bijlage

NOTA'S

Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotiale verbinding nog niet aangesloten.
Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.

INBREUKEN

Geen

BESLUIT

De installatie is conform / ~~niet conform~~ met het AREI.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.
Het (de) eendraads- en situatieschema('s) werd(en) voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op : 5/5/31, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag / ~~mag niet~~ in dienst gesteld worden / blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde ~~inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.~~

vr. de directeur,
de onderzoeker

NOTA ONDERNEMINGEN : krachtens art. 838 Tb v/h AHAB moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité voor Veiligheid, Gezondheid en verfraaiing der Werkplaatsen, tijdens de eerstvolgende vergadering.
NOTA HUURDERS, EIGENAARS : Krachten het AREI bent U verplicht : 1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie; 2) elke wijzigingen aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier;
3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directie elektrische energie in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.
03/005N/09/05/100

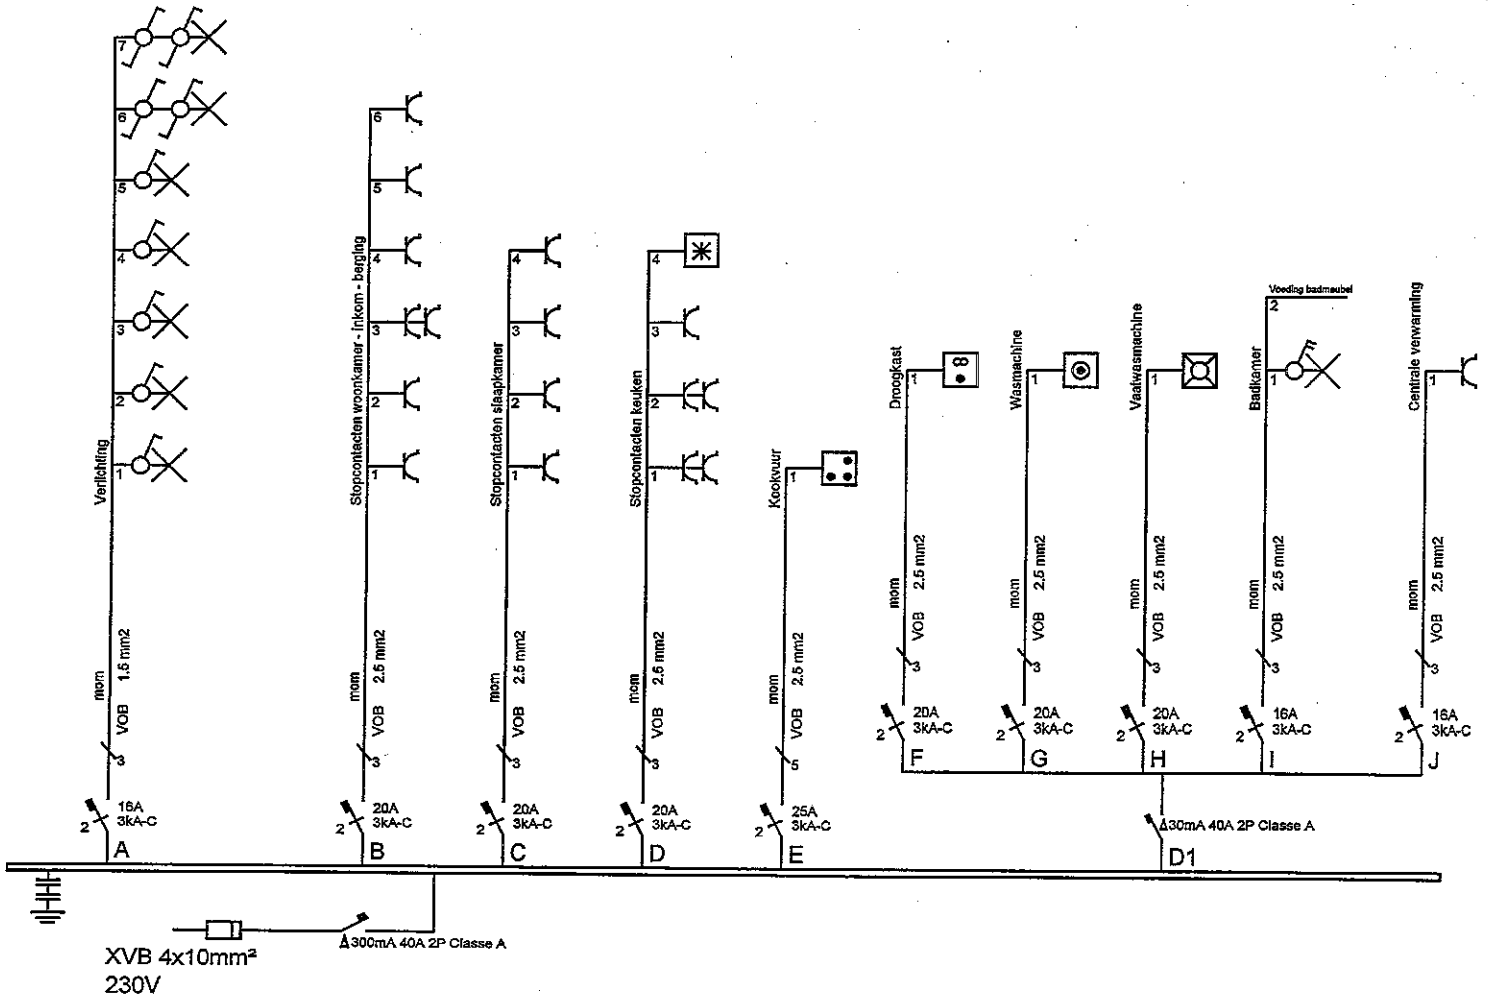

Afgev. erkend organisme OCB BT 5/6/6	Appartement 2.1 Otterstraat 192 2300 Turnhout	Verantw. uitvoering 08 / 03 / 2006	Wauters Elektro bvba Heikant 34A 2370 Arendonk tel: 014 / 672070 fax: 014 / 672135 e-mail: info@wauterselektro.be

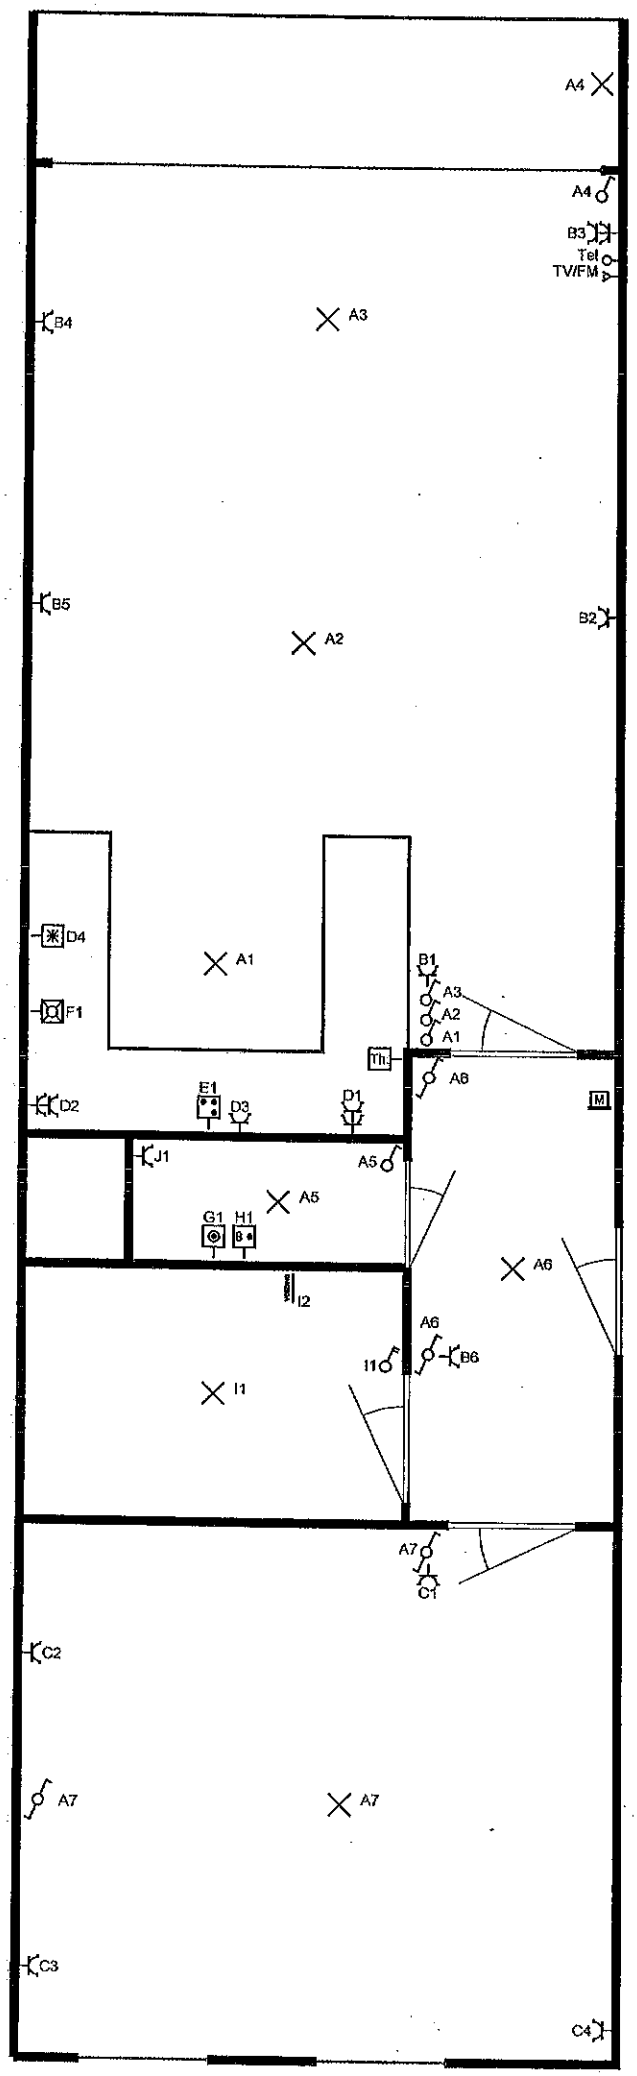
A4
A4
B3
Tel
TV/FM
B4
A3
B5
A2
B2
D4
A1
B1
A3
A2
A1
F1
Th
A8
M
D2
E1
D3
D1
J1
A5
A5
G1
H1
A6
I2
A6
I1
B6
I1
A7
C1
C2
A7
A7
C3
C4
