ACEG vzw
Erkend keuringsorganisme

Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

BELAC 522-INSP
ISO/IEC 17020

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 07/06/2023 **Inspecteur:** Younes Harrouch **Mentor:** **Installateur:** -
ID-label: **Klantreferentie:**

B.T.W. nr.:-

Merk en type meettoestel: Metrel MI3155 Serienummer: 21251251

Datum verslag: 07/06/2023

Plaats van het onderzoek

Straatnaam	Kouterstraat
Huisnummer	12
Busnummer	
Postcode	9130
Gemeente	Kieldrecht
Land	België

Eigenaar

Naam	Johnny Van Den Houdt
Straatnaam	Kouterstraat
Huisnummer	12
Busnummer	
Postcode	9130
Gemeente	Kieldrecht
Land	België

Installateur

Naam	-
BTW nr.	-
Telefoonnummer	-
E-mail	-

Type : woning **EAN** : 54 **Teller Nr.:** : 35462884

☑ **Niet meegedeeld**

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek: Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3.

Netbeheerder: FLUVIUS Spanning: 1N400V Meter / bord verbinding: 10 mm² Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 1 Aantal kringen: 17

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Ri algemeen: 104.0 MΩ

OK



RE: 17.18 Ω

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

$I\Delta$ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I^2t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	17	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	7	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm^2)
1	C	16		2	2,5
1	C	16		2	1,5
14	C	20		2	2,5
1	C	32		2	6

Visueel nazicht (algemeen)	OK	**Directe aanraking**	OK	**Indirecte aanraking**	OK
Aansluitingen	OK	**schema in bijlage door Aceg vzw**	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	**Doorsnede geleiders**	OK		
Continuiteit	OK	**Verlichting / toestellen**	NVT		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

nota/note 2 Geen inbreuken vastgesteld.

nota/note 27 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tijdens onze rondgang.

nota/note 5 De verlichting is nog niet definitief geplaatst.

nota/note 9 Badkamer is nog niet volledig afgewerkt. Bad en/of douche dient nog geplaatst te worden.

BESLUIT

☑ **De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1.** Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 7/6/2048

☑ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.

☑ Het (de) eendraadsschema('s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 10

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Younes Harrouch



Younes Harrouch
ACEG VZW - #248

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

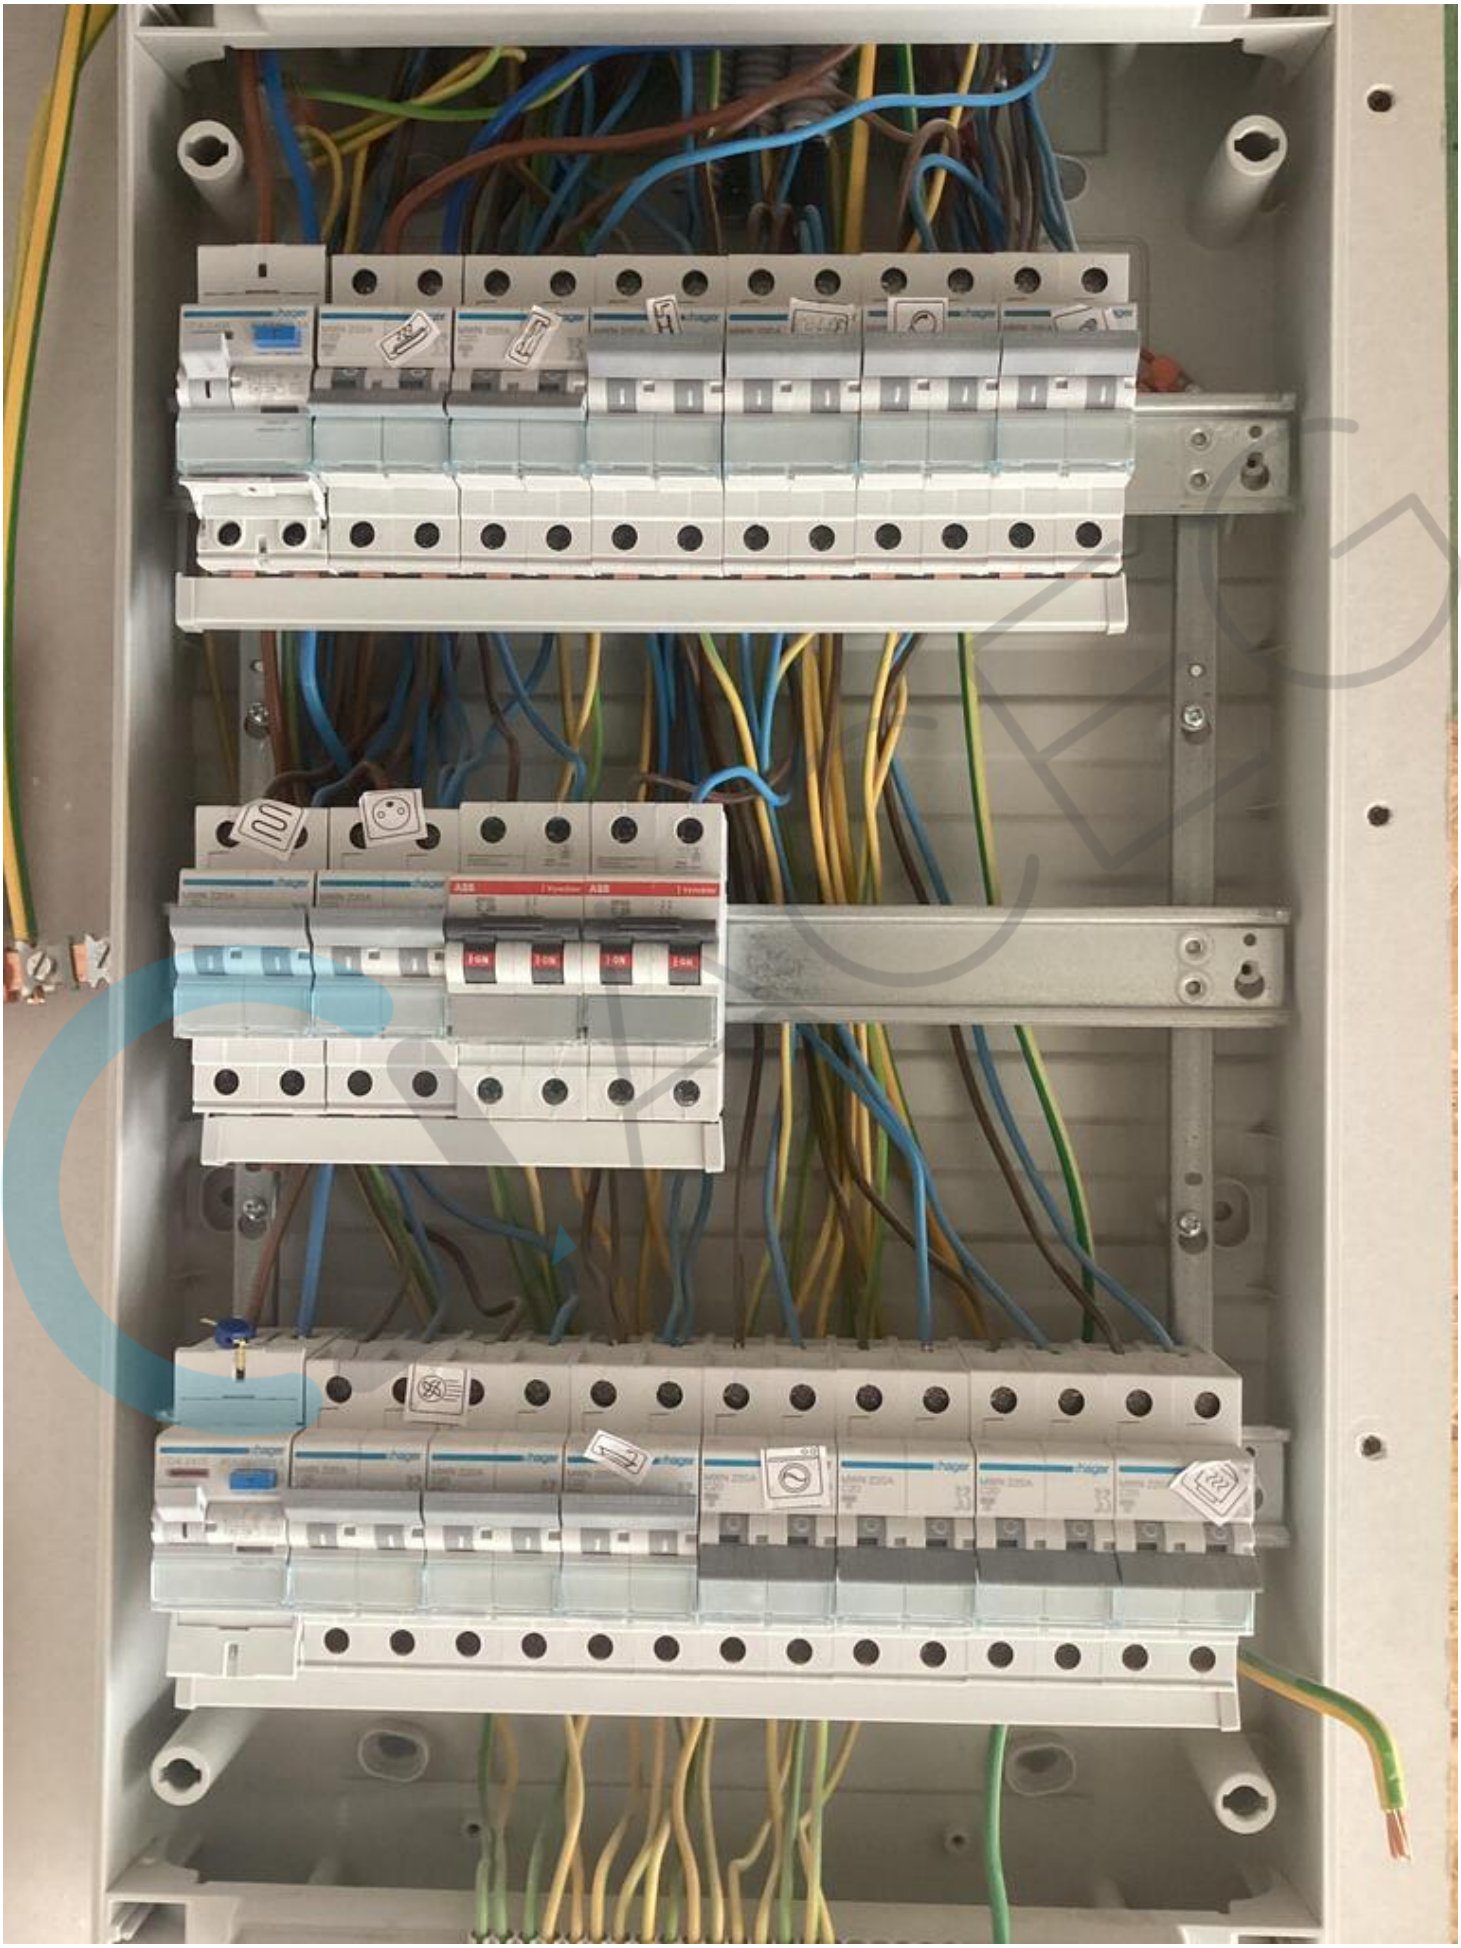
Kwaliteit

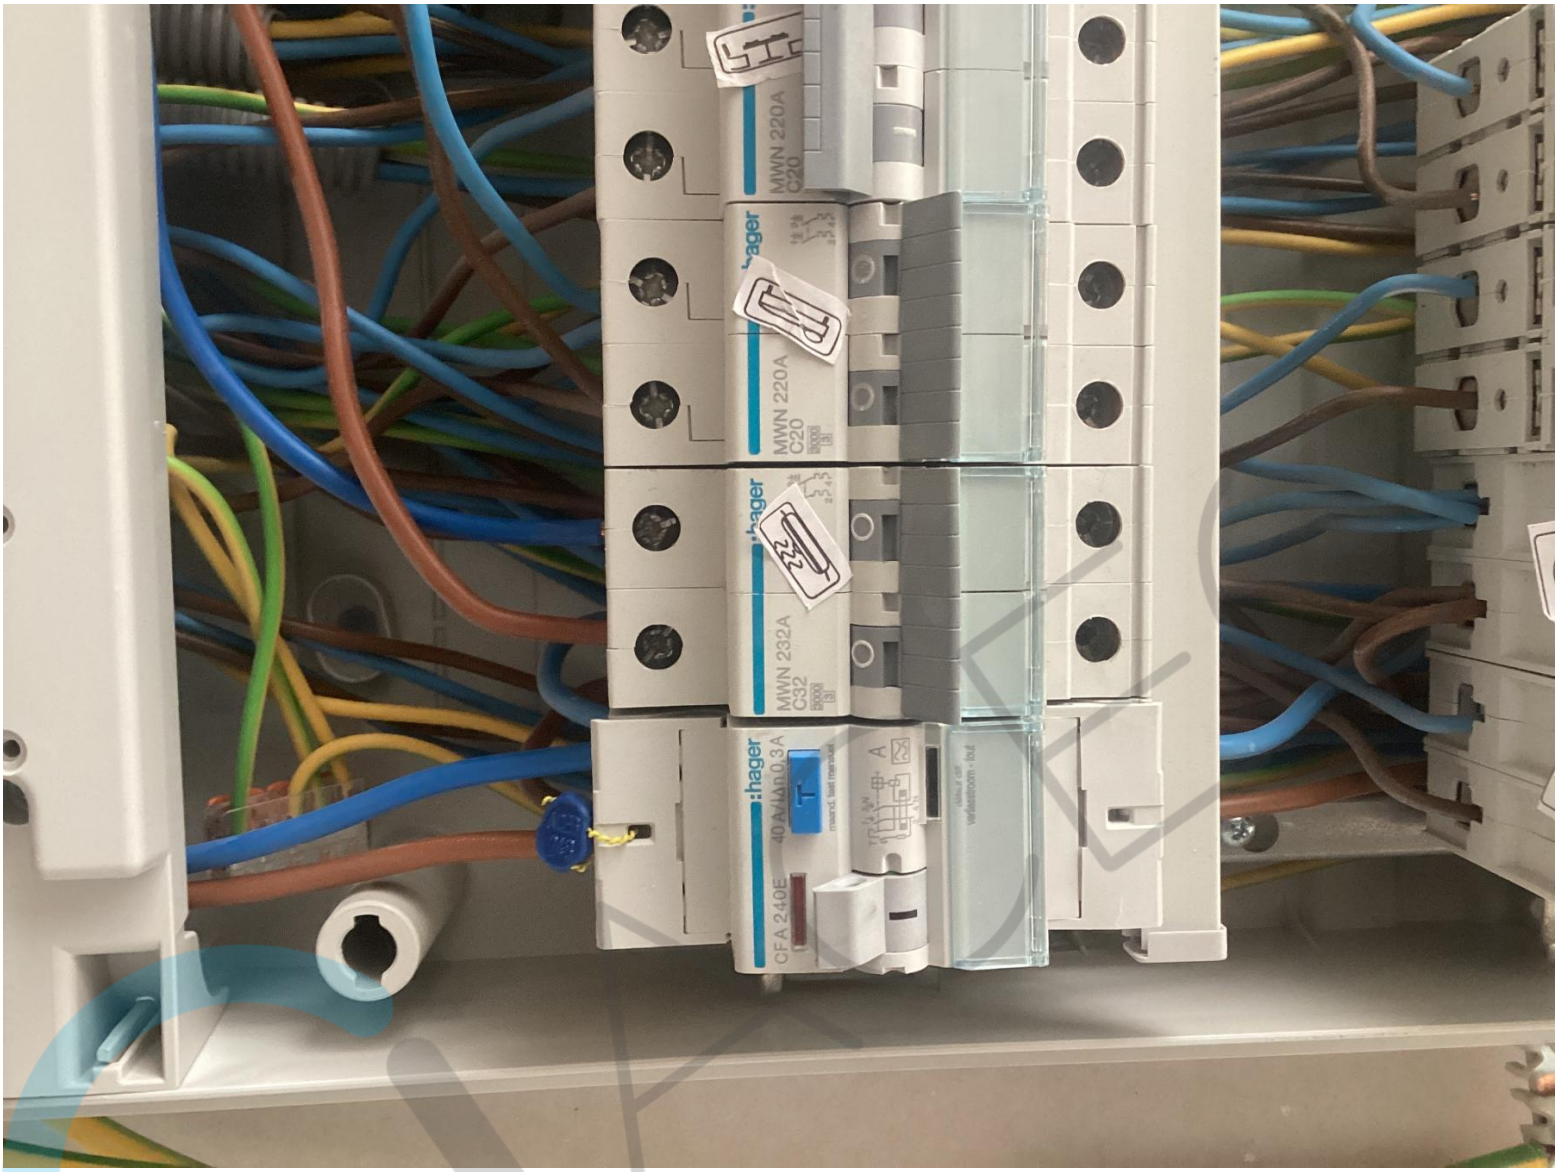
- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

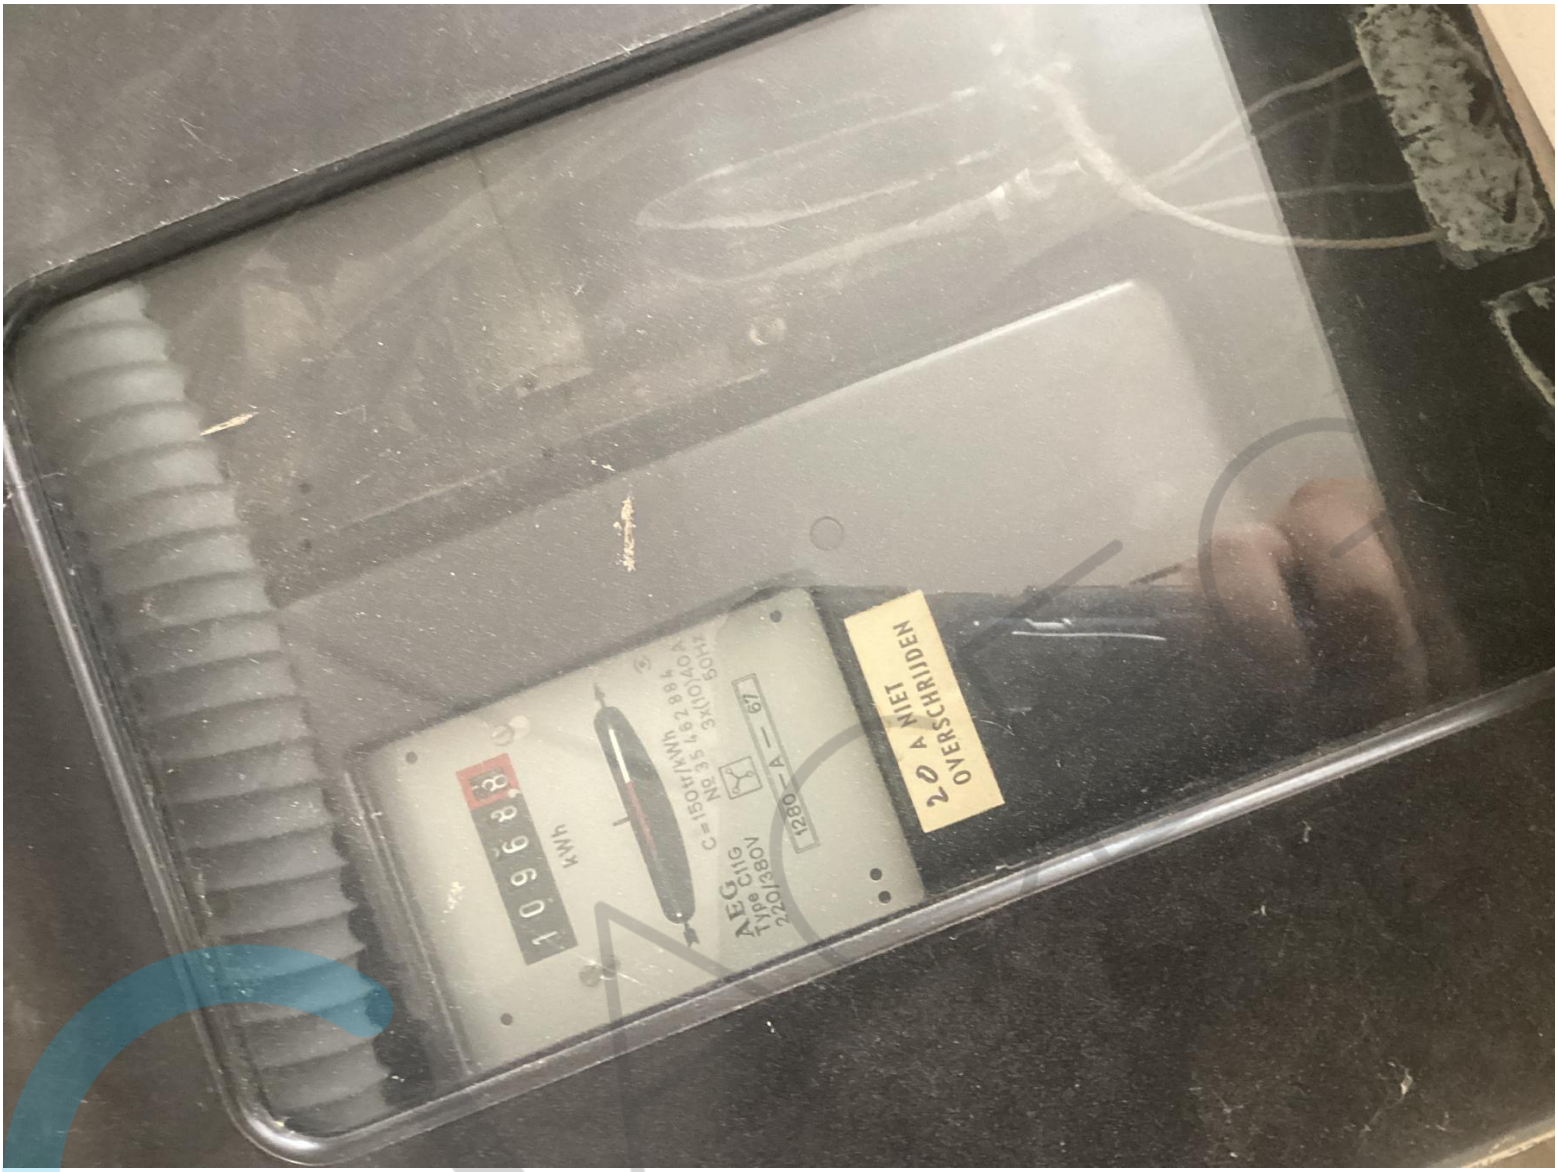
Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	**Stap 2**	**Stap 3**	**Stap 4**
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 7/6/2048	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

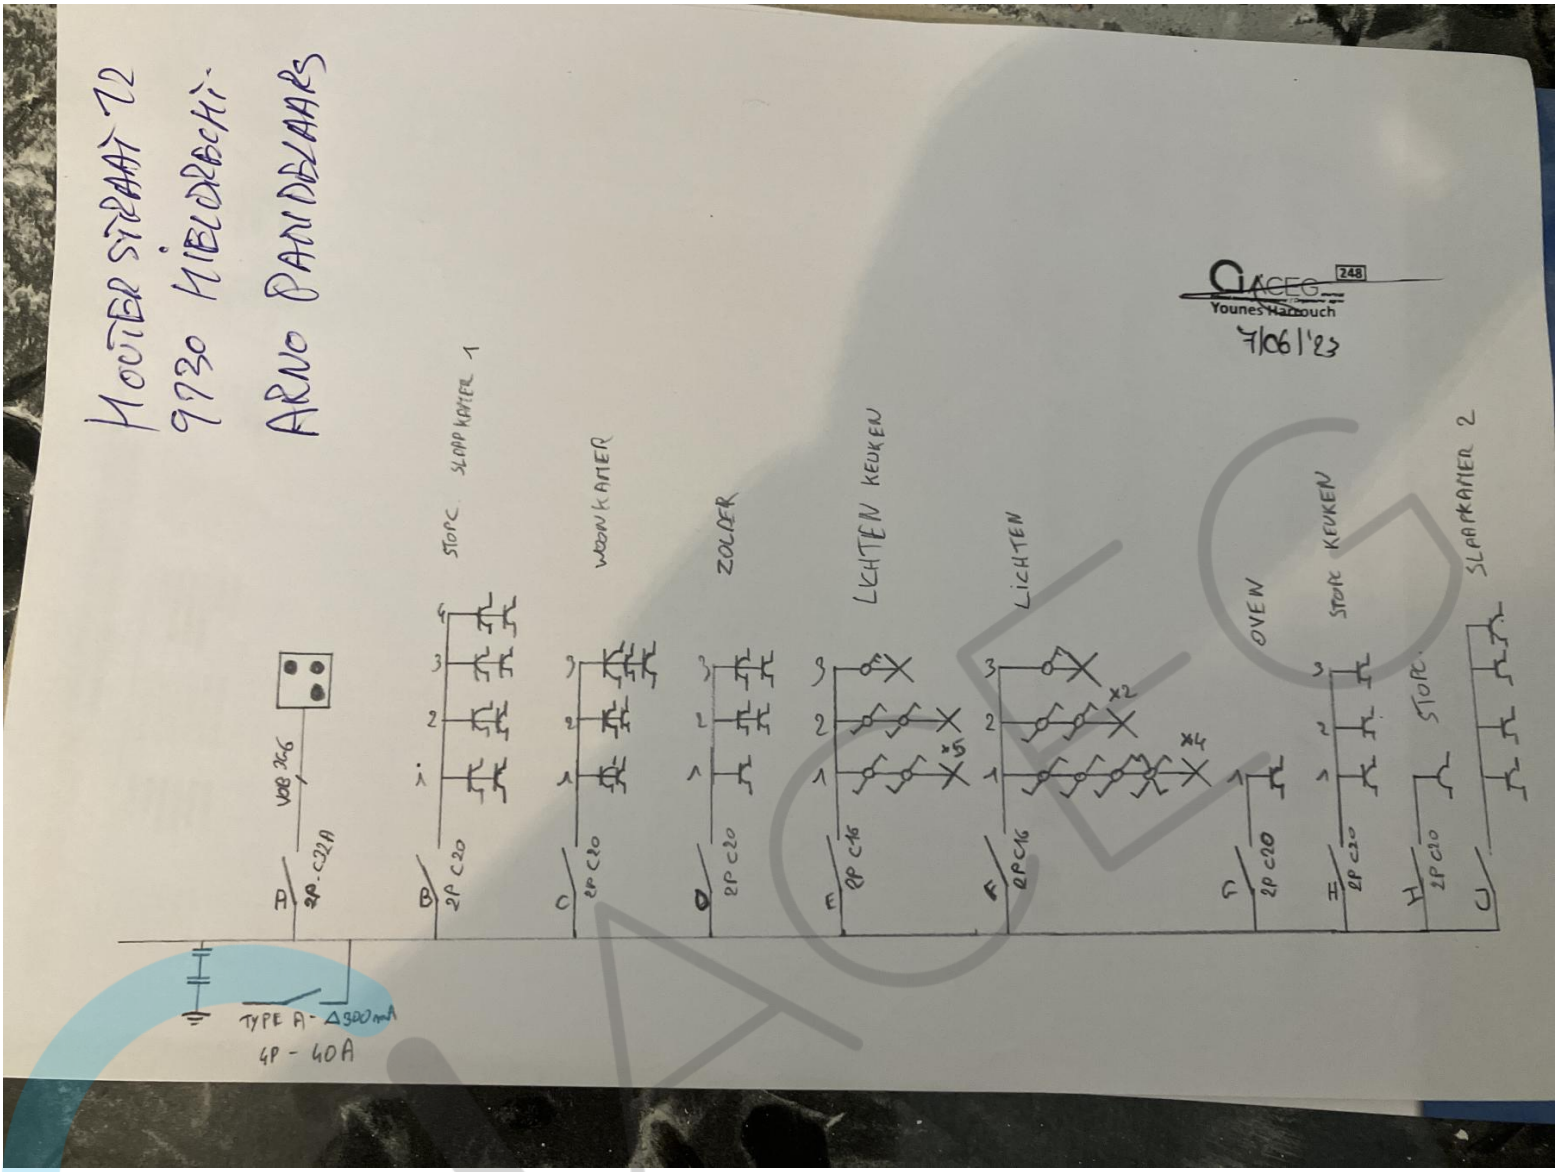


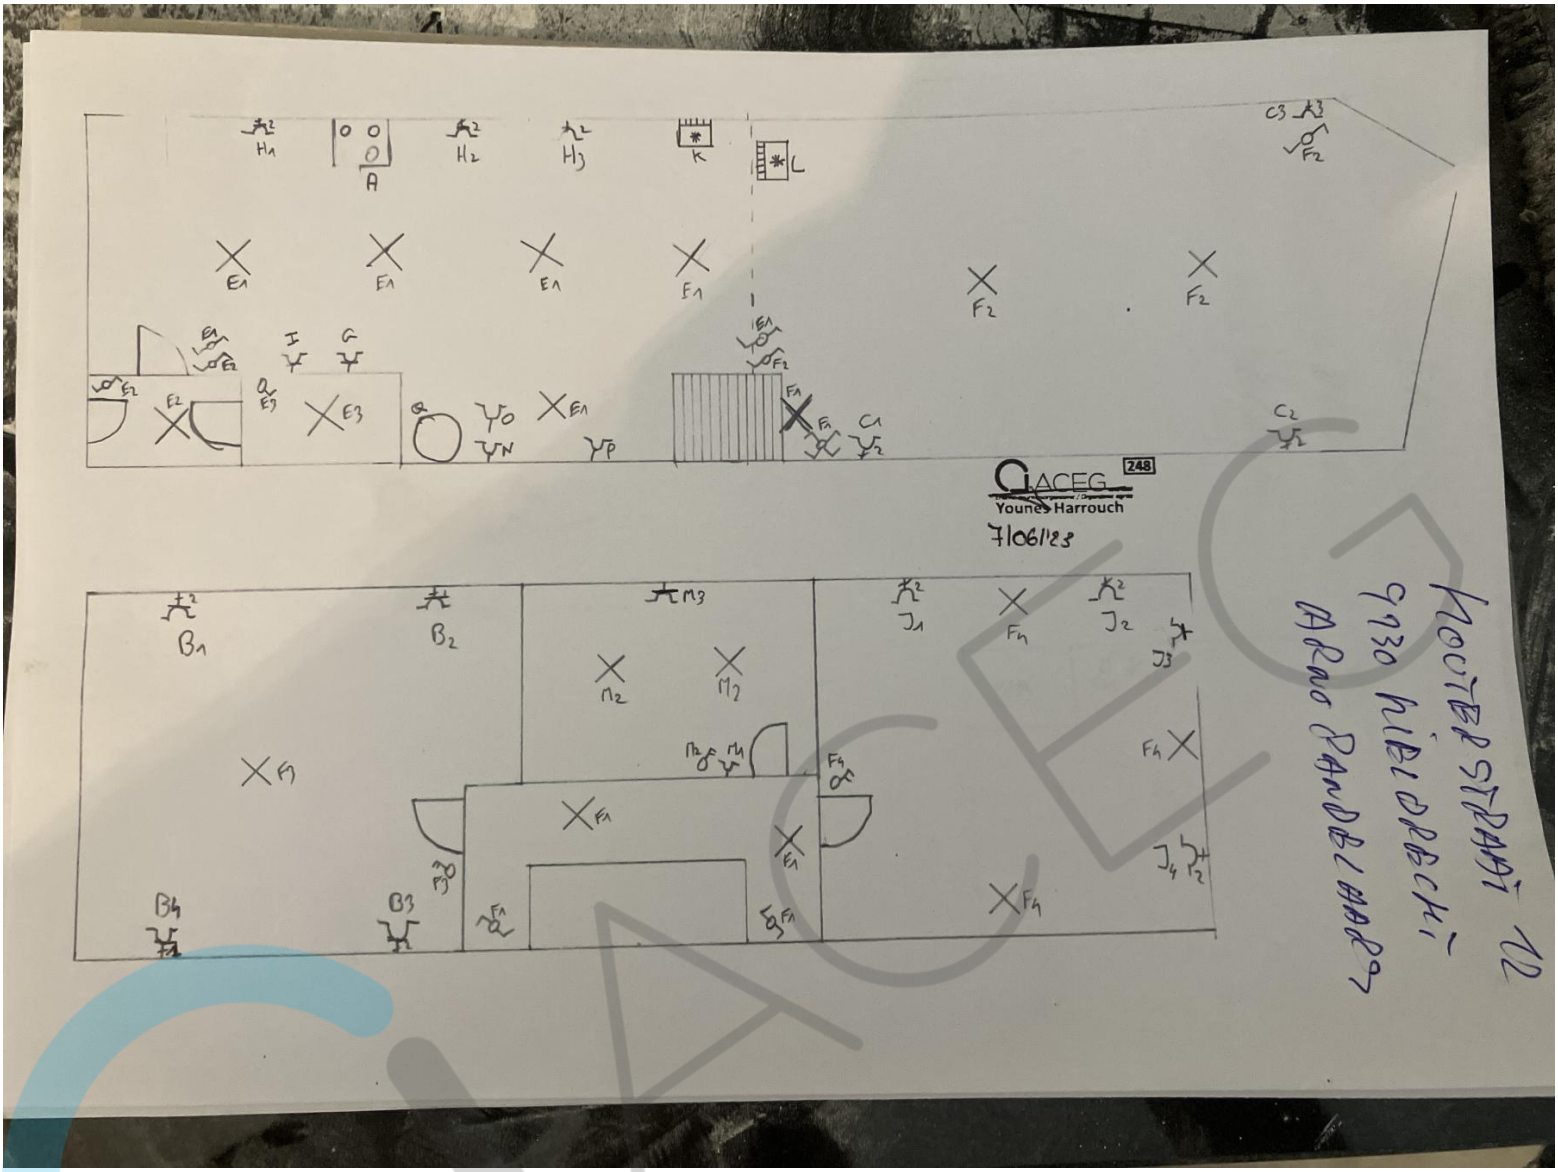

MWN 220A
C20
MWN 220A
C20
MWN 232A
C32
hager
40A/In0,3A
CFA 240E

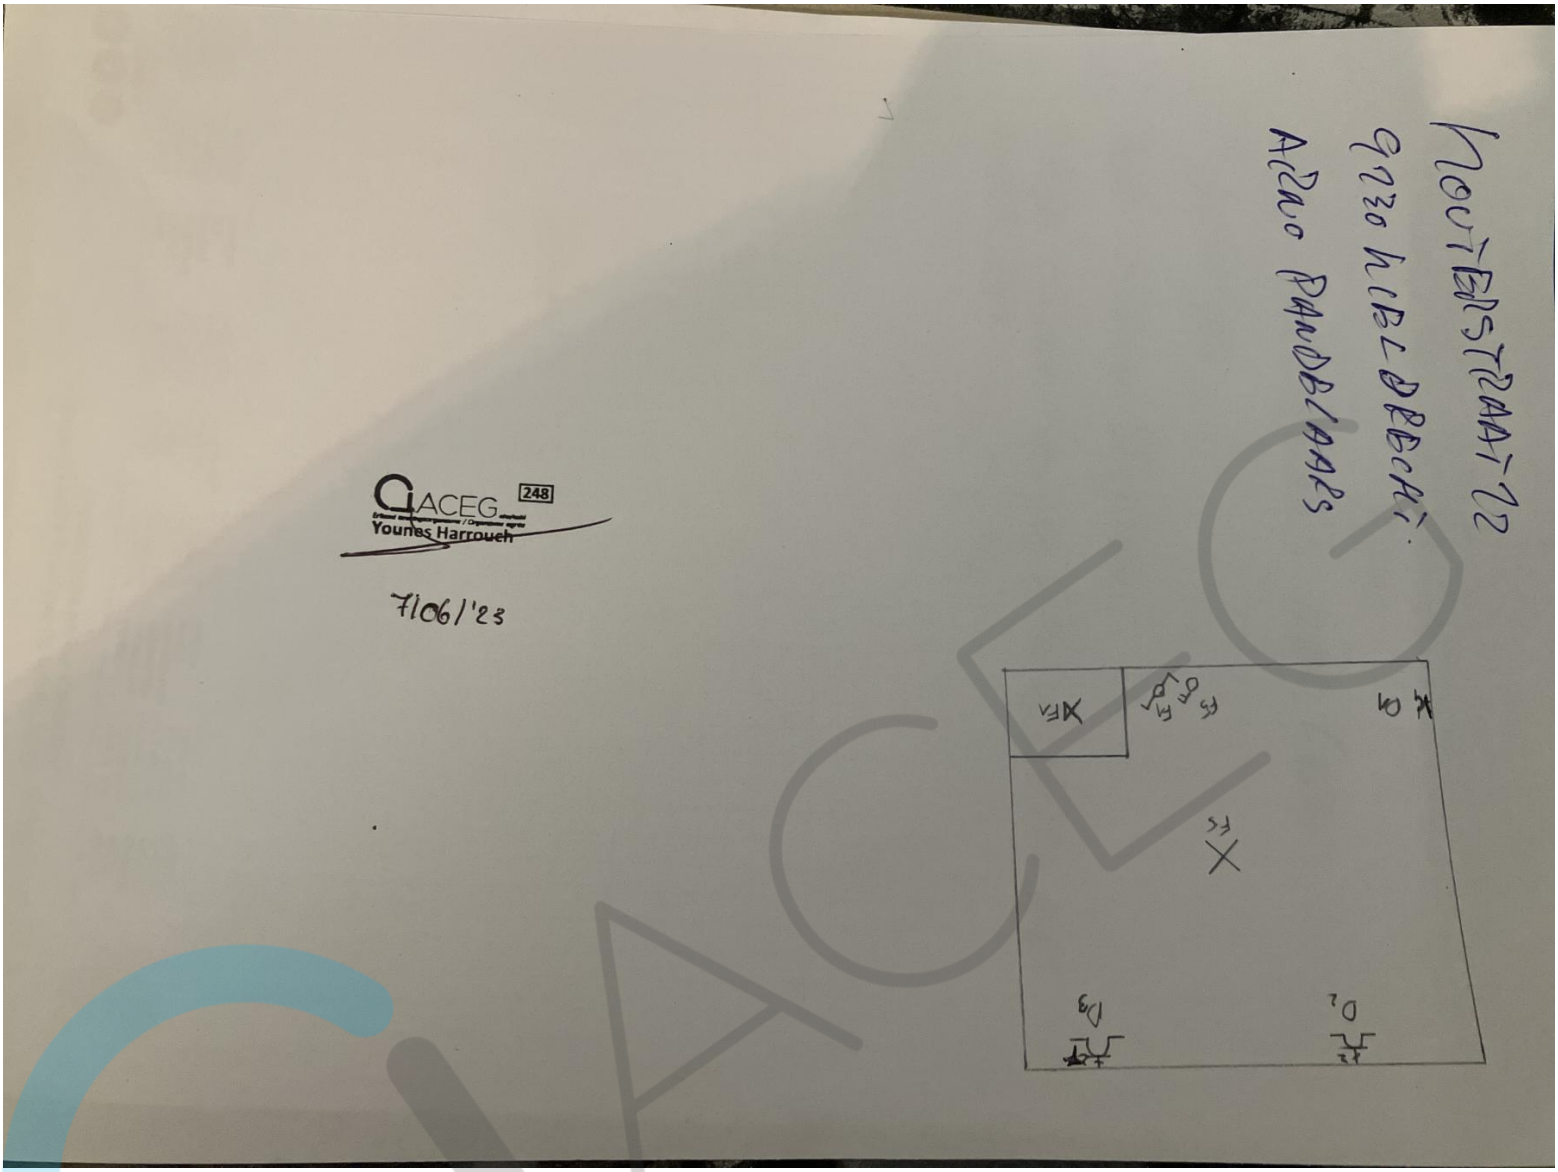

10968
kWh
C=150 t/kWh
AEG
Type C11G
220/380V
1280 — A — 67
20 A NIET
OVERSCHRIJDEN



Houterstraat 12
9720 Kluisbergen
Arno Pandsaars
AIRCO
AIRCO
BADKAMER
WASMACHINE
DROOGKAST
DIEPVRIES
BOILER
2PC20
TYPE A - Δ 30mA
ACEG
Youness Harrouch
7/06/23


HOUTER STRAAT 72
9720 KLEIT-BIGGE
ARNO PANDELAERS
VOB 3G6
A
2P C32A
TYPE A - Δ300mA
4P - 40A
B
2P C20
STOPC. SLAAPKAMER 1
C
2P C20
WOONKAMER
D
2P C20
ZOLDER
E
2P C16
LICHTEN KEUKEN
F
2P C16
LICHTEN
x5
x2
x4
G
2P C10
OVEN
H
2P C20
STOPC KEUKEN
H
2P C10
STOPC
J
SLAAPKAMER 2
CACEC 248
Younes Hazzouch
7/06/'23


ACEG
248
Younes Harrouch
7106128
Koetershuis 12
9130 Kieldrecht
Aldo Pandolfo


MOUTERSTRAAT 12
9730 KLEDRECHT
ARCO PANDELAARS
ACEG 248
Younes Harrouch
7/06/'23


METREL
Aarde
16:03
Ra 17.18 Ω
Rc 0.0 kΩ
Rp 0.0 kΩ
L PE N
EurotestXD
AUTO SEQUENCE
MI 3155


METREL
R iso
18:08
Riso 104.0 MΩ
Um 525 V
U iso 500 V
Type R iso L1/PE
EurotestXD
AUTO SEQUENCE
MI 3155
