ORGANISME DE CONTROLE
IBAN: BE47 7320 3883 2080
www.inspectbelgium.be

INSPECT BELGIUM ASBL
TVA BE 0647.601.296
Rue de l'enfer 2A, 1350 Orp-Jauche

TEL 010/280.577
info@inspectbelgium.be

Mission: 20180529001093
Client / Entreprise: Energreen Avenue Lavoisier 13 1300 WAVRE
ProKo.: CONPV-10
Num. rapport: **201800001341**

N° Client: 201800000597
Réf.PV précédent.:

Contact: t'Kint Frédéric
TVA: 0817 733 655
Date de visite.: 28/05/2018

EXAMEN DE CONFORMITE D'UNE INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE DOMESTIQUE BT =<10kVA-AC

GENERALITE

Type d'installation: Extension-Modification Installation PHOTO-VOLTAIQUE
Type d'inspection: examen de conformité
Suivant RGIE.: Art86/Art270/
Autres Réglements: Note71 /Note72 /Note72bis /
Lieu d'inspection : Clos Sainte Anne 35/3 1330-RIXENSART
Type de locaux: Maison
Date du contrôle: **28/05/2018** **Contrôle suivant dans - mois, ou avant 28/05/2043** **Contrôleur: SADIO, Albert**
Propriété de : t'Kint Frédéric **NRN:** **Délivré à:** **Date:**
Installateur: Energreen **T.V.A..:** **Pers.Cont.:** t'Kint Frédéric **tel.:** 010451373

DETAILS DU POINT DE FOURNITURE

EAN num.: **Compteur N/S:** 44793094 **Index I:** 055084,3 **Index II:** 049715,7
Marquage MID compteur de production ou calibrage du compteur d'energie: **Marque:** CONTIGEA
Tension de serv.: 3N400V **Protection Max.:** 63A **Protection principale:** aut. 4p 20A
Liaison comptage-coffre de repart.: **type de câble:** EXVB **nombre de cond.:** 4 **section :** 10 mm2

SPECIFICATIONS DES PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES

Marque-Modele-type Panneau: SUNPOWER E20 WHT 327NE **Repartition des strings:** **2x5**
Puissance d'un Panneau (Pmax): 327 W **nombre de panneau:** 10 **nombre de string:** 2 **Puissance tot.:** **3270 W**
I court-circuit (Isc) +25°c: 6,46 A **U circuit-ouvert (Voc)- 10°c:** 64,9 V

SPECIFICATIONS ONDULEUR

Nombre Marque-Modele-type Onduleur: SMA Sunny Boy 3.01AV-40 **Puissance max (Pac max):** **3000 W**
Numéros de série: 1992068000 **Déclaration CE:** présent **Fonctionnement débranché:** en ordre
Puissance max. (Pdc max): 5500 W **I max. (Idc max):** 15 A **U max. (Vdc max):** 600 V

CONTROLES VISUELS - MESURES - ESSAIS

Description Installation: ■ **voir les schémas en annexe** ■ **schéma unifilaire et schéma de position ont été signés pour approbation**
Installation exécutée conformément au schéma's : en ordre **Etat du matériel électrique:** en ordre
Interr. Diff.: Général: 4p 63A/300mA **de type A:** en ordre **est plombé par scellés:** p.a
Fonctionn. bouton d'essai: en ordre **Contrôle Boucle de défaut:** en ordre **Résist. d'isolement général:** >1 MOhm
Disj. de protection spécifique P.V.: aut. 2p 20A **identification circuit:** en ordre
Matériel et protection appropriés aux influences externes: en ordre
Protection contre les chocs électriques: **contact direct:** en ordre **contact indirect:** en ordre
Présence des panneaux d'avertissement des dangers: en ordre
Repérage des conducteurs DC et AC: en ordre
Electrode de terre: type: boucle **section:** 35 mm2 **Résistance de dispersion:** =<7 Ohm
Continuité PE et liaison équipotentielle: en ordre **Section correcte:** en ordre
Contrôle du systéme aut. de sectionnement par manque de tension: en ordre

DESCRIPTION COMPLEMENTAIRE

Notes aux organismes 71 - 72 - 72bis

N11- Sauf stipulation contraire, les appareils et machines raccordés à l'installation fixe, ne font pas partie de l'inspection..

N12- Le présent contrôle porte sur les parties aisément accessibles et visibles de l'installation et exclu les parties cachées tel que les cloisons, les faux-plafonds, etc.

N13- Sauf stipulation contraire, l'examen porte exclusivement sur l'état et le bon fonctionnement de l'installation. Sa conception sort du cadre de la mission.

CONSTATATIONS

Note (N) - Remarque (O) - Infraction (I) - les numéros réfèrent aux infractions standardisées

N11, N12, N13,

CONCLUSION


L'INSTALLATION EST CONFORME AU RGIE

L'installation peut être mise en service/ utilisée.
L'installation doit être contrôlée au plus tard à la date mentionnée ici dessus, telle que prévu par Art. 271 du RGIE,
ainsi qu'avant toute mise en service d'une modification importante ou d'une extension notable, exécutées avant cette date

Pour le Directeur Technique,

Le contrôleur,

SUNPOWER E20 WHT 327NE

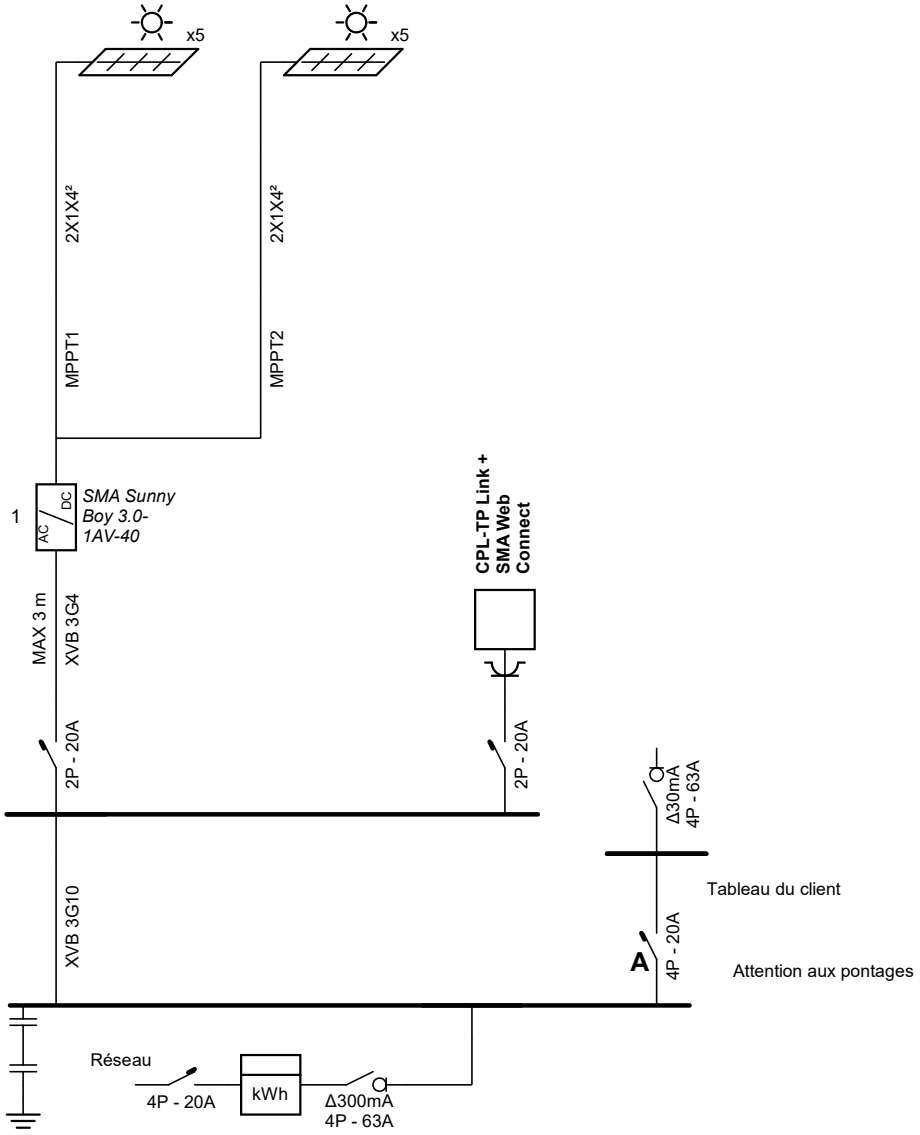

Installation est contrôlée par :
Installatie werd gecontroleerd door :
INSPECT BELGIUM
Rue Provinciale, 62 - 1300 Wavre - 010 / 280.577
Technische Directeur Technique : Ir. SADIO Albert
Date / Datum :
PV n° :
Signature / Handtekening :


Adresse de l'installation électrique
t'Kint Frédéric
Clos Sainte Anne 35/3
1332 Rixensart Wallonie
Tél.: 0477/23.53.75 GSM: -
Fax: -
e-mail: frederictkint@hotmail.com

Installateur
ENERGREEN SA
Avenue Lavoisier 13
1300 Wavre
Tél.: 010/ 45 13 73 GSM: -
Fax: 010/ 45 90 73
e-mail: info@energreen.be
BE0817733655

energreen
L'ÉNERGIE D'ALLER PLUS LOIN

Schéma dessiné par: MPU

Schéma unifilaire
2 x 230V ~ 50Hz

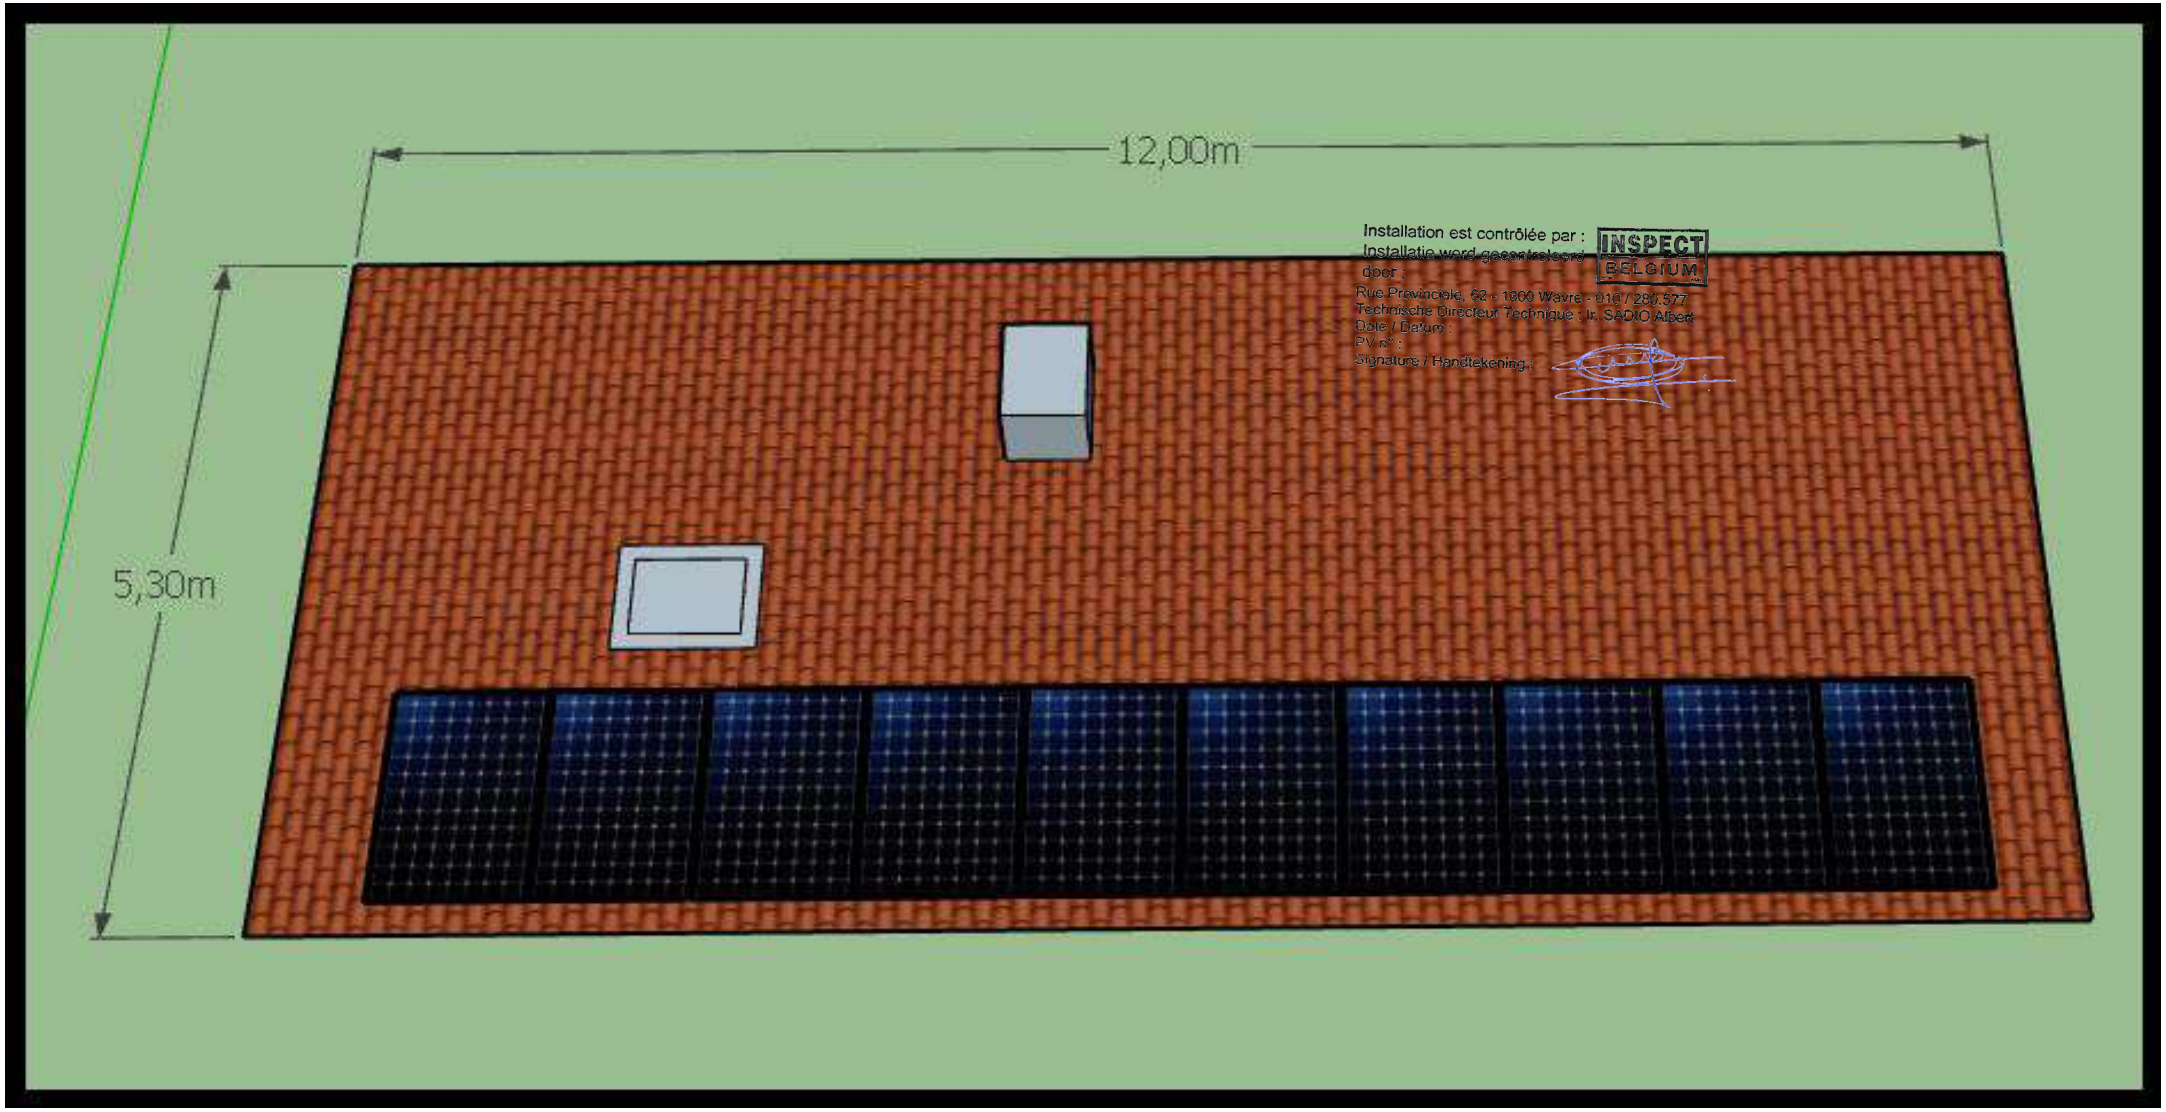

Adresse de l'installation électrique
t'Kint Frédéric
Clos Sainte Anne 35/3
1332 Rixensart Wallonie
Tél.: 0477/23.53.75 GSM: -
Fax: -
e-mail: frederictkint@hotmail.com

Installateur
ENERGREEN SA
Avenue Lavoisier 13
1300 Wavre
Tél.: 010/ 45 13 73 GSM: -
Fax: 010/ 45 90 73
e-mail: info@energreen.be
BE0817733655

energreen
L'ÉNERGIE D'ALLER PLUS LOIN

Schéma dessiné par: MPU

p. 2/2
Schéma de position

2 x 230V ~ 50Hz

Déclaration de conformité de l'installation PV[1]

Je soussigné(e) **Alexis VANDER PUTTEN**

atteste que l'installation photovoltaïque installée chez le Client : **t'Kint Frédéric**

à l'adresse : **Clos Sainte Anne 35/3 1332 Rixensart**

correspond en tous points à l'installation décrite dans le cahier des charges
du contrat-type[2] conclut avec le Client : **28/03/2018**

J'ai pris connaissances qu'une fausse déclaration peut donner lieu, conformément aux articles 52 et suivants du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, à des sanctions administratives ainsi qu'à des poursuites pénales.

LIEU : **à Wavre**

DATE : **le 31/05/2018**

L'INSTALLATEUR
(nom, prénom et signature[3])

Alexis Vander Putten
Co-fondateur



LE TITULAIRE DU CERTIFICAT DE COMPÉTENCES COMME INSTALLATEUR DE SYSTÈMES SOLAIRES PHOTOVOLTAÏQUES DÉLIVRÉ PAR **RESCERT**
(nom, prénom, n° certificat et signature)

Alexis Vander Putten
n° 00337



---

[1] Déclaration visée à l'article 19bis, §6, 2° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération

[2] En cas de sous-traitance, le contrat-type est conclu entre l'entrepreneur principal et le client

[3] Personne légalement habilitée à représenter l'entreprise
