ACEG vzw
Erkend keuringsorganisme

Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

BELAC 522-INSP
ISO/IEC 17020

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 24/10/2024
Inspecteur: Maxim Engels
Mentor:
Installateur: Elektriciteitswerken Vertommen BV

ID-label:
Klantreferentie:

B.T.W. nr.:BE 0784 239 159

Merk en type meettoestel: Metrel Eurotest ET61557
Serienummer: 19481263

Datum verslag: 25/10/2024

Plaats van het onderzoek

Straatnaam	Antwerpsestraat
Huisnummer	183
Busnummer	3de verdieping
Postcode	2640
Gemeente	Mortsel
Land	België

Eigenaar

Naam	Van Cauwenberg
Straatnaam	Antwerpsestraat
Huisnummer	183
Busnummer	3de verdieping
Postcode	2640
Gemeente	Mortsel
Land	België

Installateur

Naam	Elektriciteitswerken Vertommen BV
BTW nr.	BE 0784 239 159
Telefoonnummer	+32 470 86 76 13
E-mail	vertommen.matthias@gmail.com

Type : appartement
EAN : 541 448 860 003 552 531
Teller Nr.: : 1SAG1100866012

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek: Controlebezoek van een huishoudelijke installatie van voor 1981 die bij de gelijkvormigheidscontrole of het controlebezoek in overtreding was met de voorschriften van (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 9.1.3.2. en 8.2.1. en 4.2.3.


Netbeheerder: FLUVIUS | Spanning: 1N400V | Meter / bord verbinding: 10 mm² | Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 1 | Aantal kringen: 7

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders: woning van voor 1981

Ri algemeen: >1000 MΩ

OK

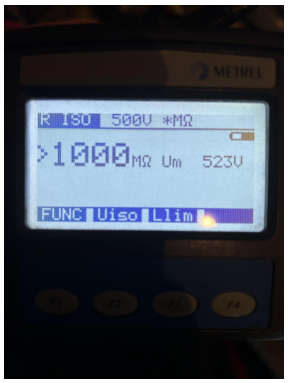

RE: 17,36 Ω

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I²t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	7	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	3	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen		Curve		Bescherming IN (A)		(andere)		P		Sectie (mm²)
Visueel nazicht (algemeen)	OK			**Directe aanraking**	OK			**Indirecte aanraking**	OK	
Aansluitingen	OK			**schema in bijlage door Aceg vzw**	NA					
Equipotentiale verbindingen	OK			**Doorsnede geleiders**	OK					
Continuiteit	OK			**Verlichting / toestellen**	NVT					

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

N51 Het opgegeven EAN-nummer is volgens de wiskundige controle niet correct.

nota/note 2 Geen inbreuken vastgesteld.

BESLUIT

☑ **De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1.** Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 24/10/2049

☑ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.

☑ Het (de) eendraadsschema('s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 11:45 tot 12:00

De inspecteur Maxim Engels



Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481


Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	**Stap 2**	**Stap 3**	**Stap 4**
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 24/10/2049	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.






*Ω
17.36Ω
Rc 0.0kΩ
Rp 0.0kΩ
FUNC
H1 im

[redacted]

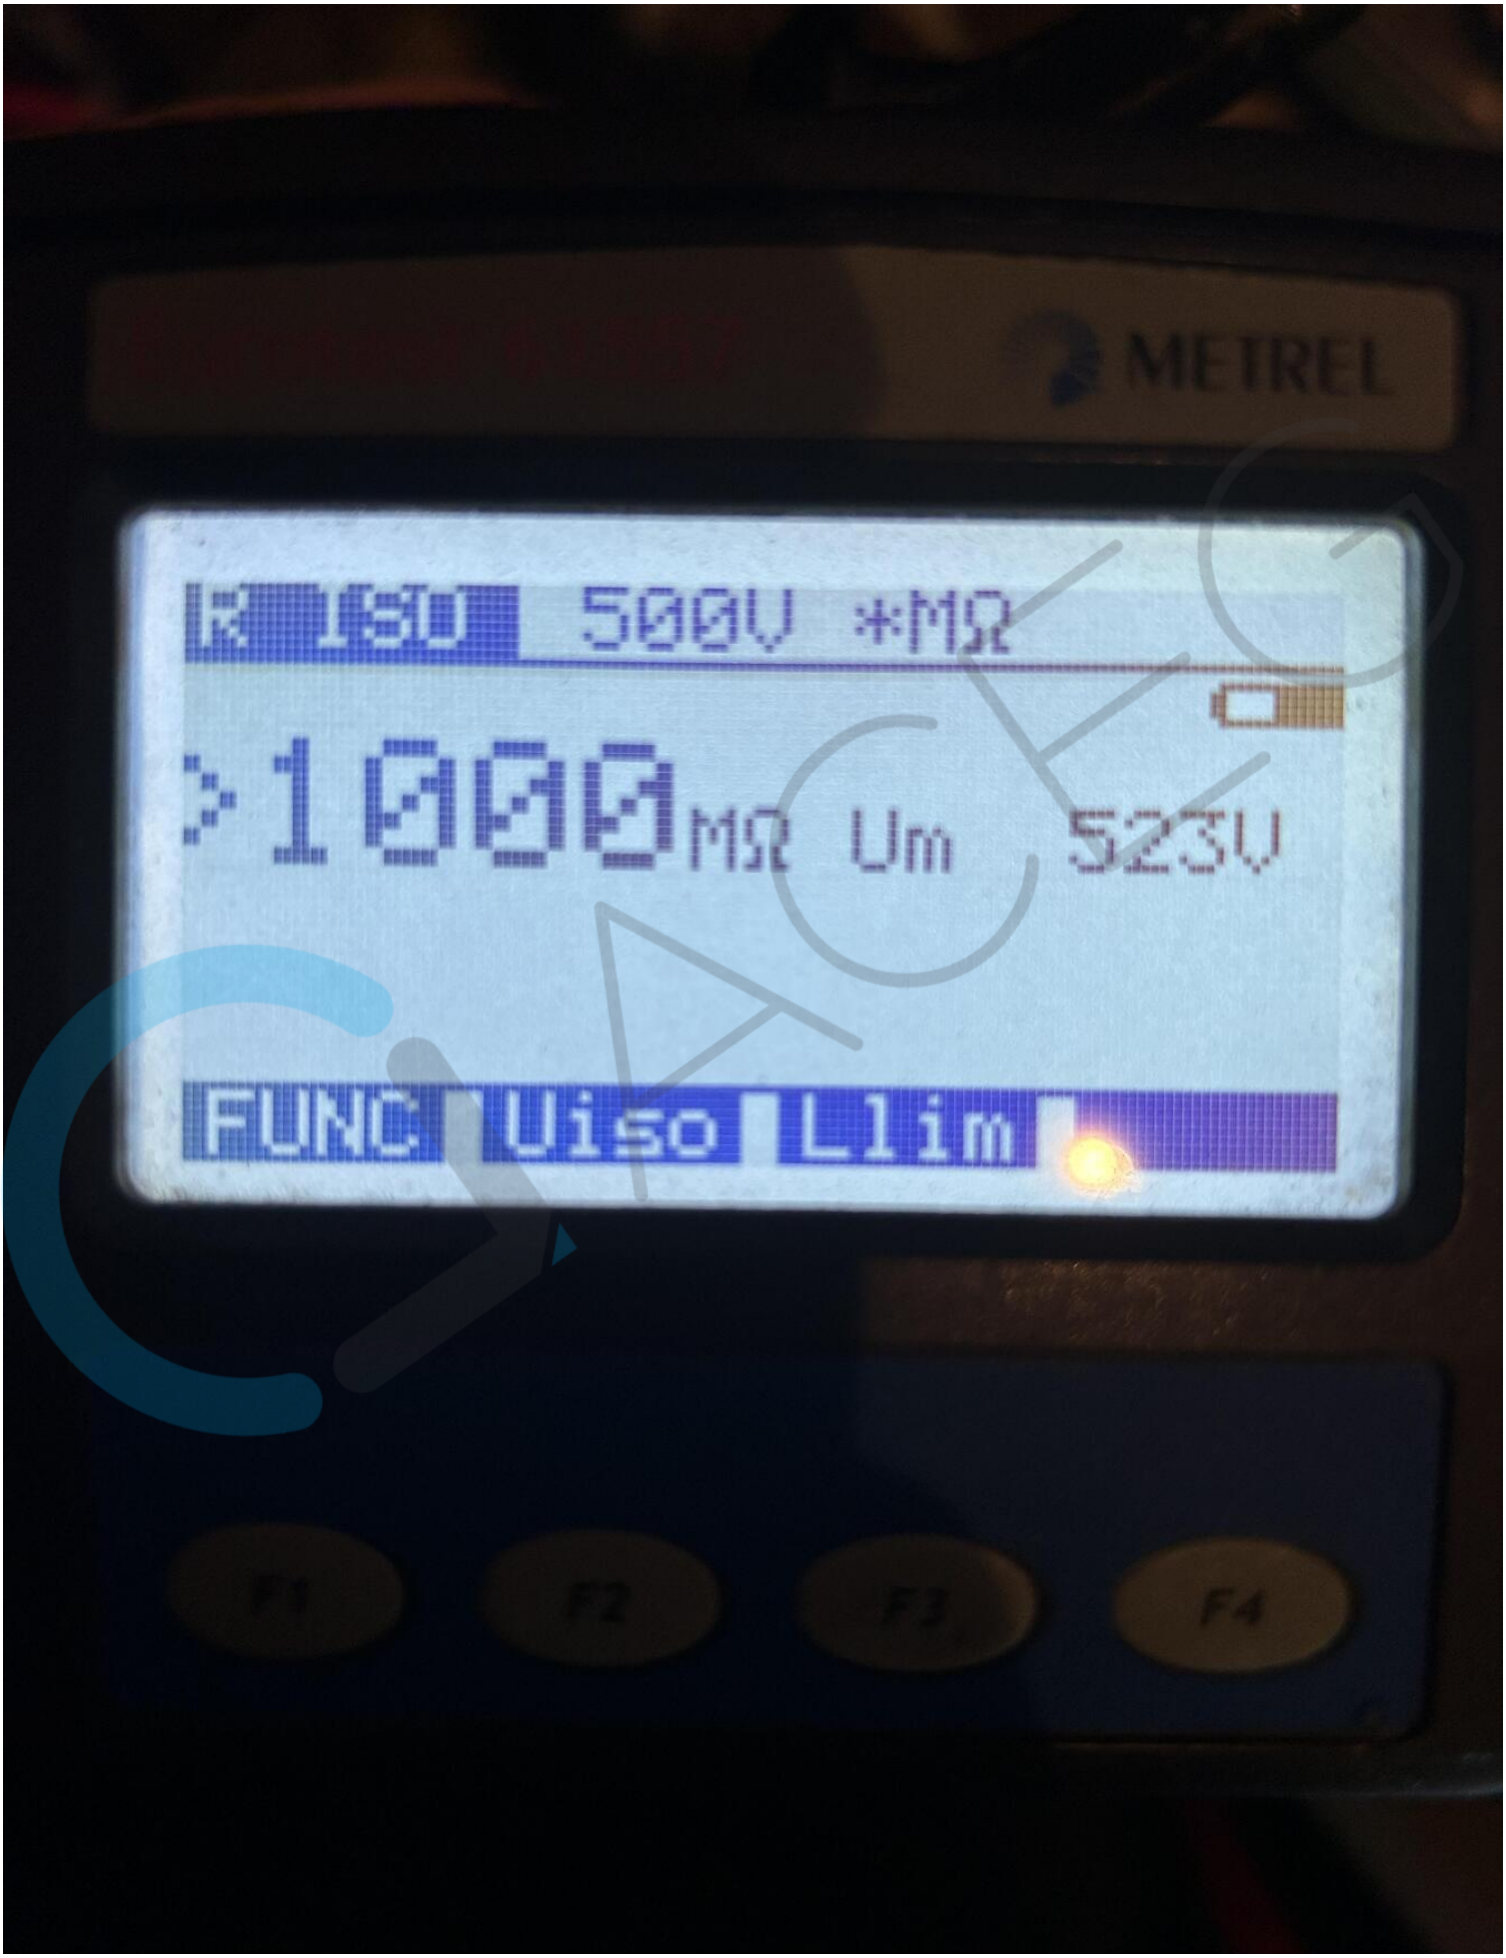
METREL
500V *MΩ
>1000MΩ Um 523V
FUNC Uiso Llim
F1
F2
F3
F4

