ACEG vzw
Erkend keuringsorganisme

Romeinsesteenweg 524
1853 Strombeek-Bever
tel. 02 880 8890
info@aceg.be
www.aceg.be

BELAC 522-INSP
ISO/IEC 17020

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

NIET CONFORM

Datum keuring: 08/02/2020 **Inspecteur:** Nigel Rodriguez Molina **Mentor:** - **Installateur:** Carl THYSSENS Carl

ID-label: Combi EPC + EK **Client reference:** -

B.T.W. nr.:- IK. nr.:-

Merk en type meettoestel: Fluke 1663 Serie Nr:: 3338015

Plaats van het onderzoek		**Eigenaar**	
Straatnaam	Boshovestraat	Naam	Carl Thyssens
Huisnummer	99	Straatnaam	Boshovestraat
Busnummer	1ste verdiep	Huisnummer	99
Postcode	2100	Busnummer	1ste verdiep
Gemeente	DEURNE	Postcode	2100
Land	België	Gemeente	DEURNE
		Land	België
		Installateur	
Naam contactpersoon	THYSSENS Carl	Naam	Carl THYSSENS Carl
Telefoon	0472.22.85.98	BTW nr.	-
Gsm nr. (SMS)	0472228598	Telefoonnummer	0472.22.85.98
		E-mail	na

Type : appartement **EAN** : 54144 **Teller Nr.:** : 8274025

Aard onderzoek: Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens AREI artikels 271, 271bis en 86.

Netbeheerder: FLUVIUS Spanning: 1~230V Meter / bord verbinding: 10 mm² Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 1 Aantal kringen: 3 Isolatie: 9,33 MΩ

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven baren, pennen of geleiders RE: 2000 Ω

DIFFERENTIEELSCHAKELAAR

IΔ(mA)	In (A)	In - andere (A)	I²t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	3	Ok	Ok

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
1	C	16		2	1,5
1	U	25		2	4
1	U	40		2	6

Visueel nazicht (algemeen) ○ OK ◉ NOK **Directe aanraking** ○ OK ◉ NOK **Indirecte aanraking** ○ OK ◉ NOK

Aansluitingen ○ OK ◉ NOK **Correcte schema's** ○ OK ◉ NOK **schema in bijlage door Aceg vzw** ☐

Equipotentiale verbindingen ◉ OK ○ NOK ○ niet van toepassing ○ in afwachting

Continuiteit ○ OK ◉ NOK **Verlichting / toestellen** ○ OK ◉ NOK ○ NVT

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

Opmerking

I1.01 Eéndraadschema van de installatie is te voorzien en/of te vervolledigen. (art16, 268, 269)

I1.02 Situatieschema van de installatie is te voorzien en/of te vervolledigen. (art269)

I2.02 De continuïteit van equipotentiaal en/of beschermingsgeleiders zijn niet gewaarborgd. (art70.05, 85.08)

I2.05 De spreidingsweerstand is groter dan 100 ohm. (art86.01, 86.07)

I5.02 De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz dient aangebracht of vervolledigd te worden. (art16, 252)

O18 De elektrische installatie is grondig na te zien en conform te maken volgens de voorschriften van het AREI.

O27 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tijdens onze rondgang.

O3 Het is niet uitgesloten dat bij een nacontrole bijkomende inbreuken worden vastgesteld bij voorleggen schema's.

O8 De elektrische installatie is niet volledig toegankelijk voor nazicht. Niet alle lokalen/plaatsen zijn bereikbaar.

Huurder niet aanwezig (appartement niet kunnen betreden en kunnen nazien op nog eventuele inbreuken)

BESLUIT

- [ ] **De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI.** De volgende periodieke keuring is te voorzien voor
- [ ] De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- [ ] Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.
- [x] **De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI.** Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Datum: 8/2/2021
- [ ] **De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI.** Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het AREI, moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen. Datum:

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 5

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Nigel Rodriguez Molina



Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de FOD economie, KMO, middenstand en Energie – algemene directie energie, afdeling gas – elektriciteit

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Stappenplan voor een installatie die niet conform is:			
Stap 1	**Stap 2**	**Stap 3**	**Stap 4**
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig zorg ervoor dat alle inbreuken worden opgelost en besteed voldoende aandacht aan de eventuele nota's.	Als alle inbreuken zijn verholpen neem terug contact op met ACEG of met uw keurder van ACEG en maak een nieuwe afspraak.	De herkeuring moet uitgevoerd worden voor 8/2/2021	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen en staat u bij als er iets niet duidelijk is.

SIEMENS
SIEMENS
SIEMENS
SIEMENS

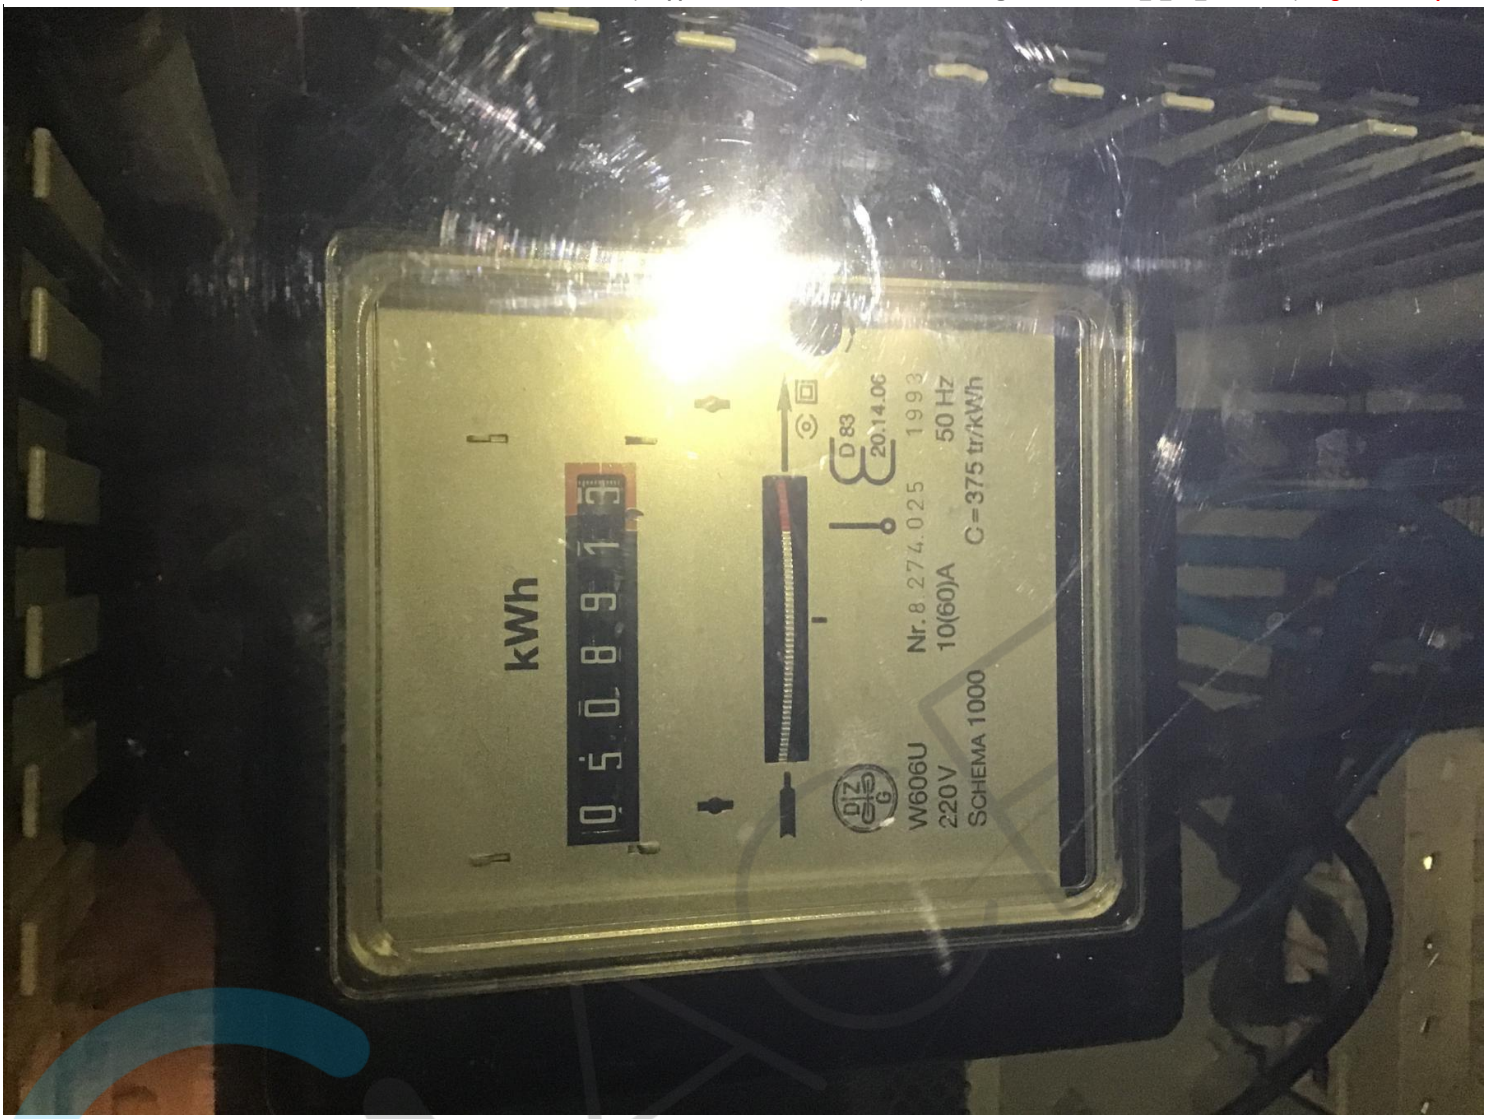
kWh
0 5 0 8 9 1 3
W606U
220V
SCHEMA 1000
Nr. 8.274.025 1993
10(60)A
50 Hz
C=375 tr/kWh
D 83
20.14.06

SIEMENS
NFI-VERLIESSTROOM-SCHAKELAAR
DISJONCTEUR DIFFERENTIEL
5SZ6 247-1A
MADE IN GERMANY
SIEMENS
5SQ12
No 42-U
(40A)
SIEMENS
5SQ12
No 28-U
(25A)
SERIES E
C16
1
1ste verdiep
ACHTER
VOOR
KELDER

FLUKE
9.33

FLUKE
1653B MULTIFUNCTION TESTER
MEMORY
2000
V.
